

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 99	<b>Fecha Informe:</b> 23-05-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	<b>Personal Encargado:</b> BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	--	---

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**      **Foto Bitacora 6:**

**Asunto:**

Visita de verificación por parte de representantes de PROVIAS NACIONAL - LIMA donde se verifica las actividades ejecutadas y en ejecución del contrato principal y de los adicionales . Visita de seguimiento en campo de las actividades en ejecución del contrato principal y adicionales como : Mejoramiento de suelos, Construcción de muros , excavaciones, colocación de alcantarillas, etc y labores de mantenimiento vial.

**Conclusiones:**

los representantes de PROVIAS NACIONAL - LIMA efectuaron labores de verificación y solicitaron información donde se le presto todo el Apoyo para el logro de sus objetivos. El Consorcio Integración Vial mantiene un buen rendimiento de trabajo, porque el clima de esta semana es despejado. La supervisión cuenta con tres camionetas y una Van para el transporte de su personal , la misma esta trabajando con equipos de Campo y laboratorio de las empresas Contratistas. las mediciones lo realizan en conjunto.

**Recomendaciones:**

Se recomienda a la Supervisión el uso de equipos propios, segun lo que indica los terminos de referencia,  
Se recomienda a la Supervisión la participación escrita a PROVIAS NACIONAL de cualquier desmovilizacion de vehiculos o equipos para estar en conocimiento.

### PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

23-05-2019

**Actividades:**

Visita de seguimiento en campo: Verificación con viga benkelman

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva 24+000 los ingenieros Cristiam Rodriguez y Carlos Guzman, representantes de PROVIAS NACIONAL - LIMA verifican con la viga benkelman

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

23-05-2019



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

23-05-2019

**Actividades:**

Visita de verificación de Recursos: laboratorio de Supervisión y Johesa

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la Progresiva Km. 24+000 dentro de la planta de asfalto de Johesa ( ACTUALMENTE SIN FUNCIONAMIENTO ) se ubica el laboratorio de la Supervisión donde se solicito su apertura y solo se encontro dentro del contenedor un solo equipo: UN medidor de rugosidad y luego se visitó el laboratorio de asfalto de Johesa y Supervisión. En presencia de los Ingenieros : Carlos Guzman, Cristiam Rodriguez y Lic. Carlos Ramirez de PROVIAS NACIONAL - LIMA.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

23-05-2019

2



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

23-05-2019

**Actividades:**

Visita al campamento de Johesa: Reunión de trabajo sobre adicionales 6

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva Km. 37+000 se han reunido Los ingenieros especialistas para revisar y complementar el expediente de los adicionales No. 6 , El Ingeniero Cesar Lujan en representación de la Supervisión, el Ingeniero Felipe Romero representante del Consorcio Integración Vial y el Ingeniero Willy Allccarima representante de PROVIAS NACIONAL -LIMA

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

23-05-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras


**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 23-05-2019

**Actividades:**  
Visita de verificación de Recursos : Visita a oficinas de Johesa

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
En la progresiva KM 37+ 000 se realizó visita de verificación de recursos humanos donde junto con el Lic. Carlos Ramirez se solicitó la asistencia del personal del Consorcio Integración Vial.

4

**Foto1:**

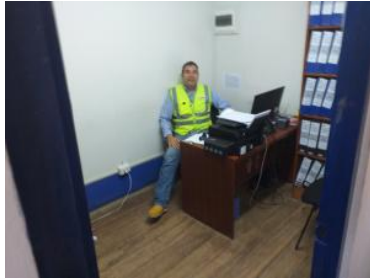

**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
23-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 23-05-2019

**Actividades:**  
Visita de verificación de Recursos: Visita a las instalaciones de la empresa Constructora San Martin

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
En la progresiva KM. 36+900 se ubica las oficinas de la empresa San Martín, donde se solicito la asistencia del personal presente y los recursos de Maquinarias y equipos en la obra.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
23-05-2019



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

23-05-2019

**Actividades:**

Visita de seguimiento en campo: trabajos de verificación por PROVIAS NACIONAL - LIMA en progresiva Km.42+800

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva 42+800 los representantes de PROVIAS NACIONAL - LIMA , el Tec. Asist Cairo Ventura, el Tec. Oscar Melendez en su trabajo de verificación de muros construidos y por construir en toda la extensión del tramo.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

24-05-2019

6



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografía:** 23-05-2019

**Actividades:**  
Visita de seguimiento en campo: Trabajos de imprimación asfáltica

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva Km. 73+740 se han vuelto a realizar trabajos de imprimación asfáltica, ya que las lluvias de la semana pasada daño la imprimación realizada.

7

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
24-05-2019

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografía:** 23-05-2019

**Actividades:**  
Visita de seguimiento en campo: Vaciado de bases de muro de concreto

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva Km. 65+175 a 65+250 se esta vaciando la zapata de muro de concreto armado con concreto de 210 Kg/ cm2 a los 28 dias.

8

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
24-05-2019





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

23-05-2019

**Actividades:**

Visita de seguimiento en campo: Vaciado de muro de concreto armado.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva Km. 40+197 a la 40+ 208 se esta realizando el vaciado de un muro de concreto armado, con concreto de Rcc= 210 kg/cm2 a los 28 días.

9

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

24-05-2019



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

23-05-2019

**Actividades:**

Visita de seguimiento en campo: Replanteo y verificación de puntos donde se ubican los muros

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva Km. 70+724 Los tecnicos Oscar Manuel Melendez y Cairo ventura, representantes de PROVIAS NACIONAL- LIMA verifican los diferentes puntos donde se ubican o ubicarán los muros, junto con representantes de la Supervisión y Empresa.

10

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

24-05-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

23-05-2019

**Actividades:**

Visita de seguimiento en campo: Sitio de aprovechamiento de material de Cerro

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva Km. 81+000 con el uso de un Tractor el la terraza del cerro se esta empujando el material para relleno hacia abajo. Este material se acopia en un DME y se zarandea en una zaranda fija y con un cargador frontal.

11

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

24-05-2019



**Fotos:**
