

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 111	<b>Fecha Informe:</b> 31-05-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave-Mazocruz	<b>Personal Encargado:</b> CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**      **Foto Bitacora 6:**

**Asunto:**

REPORTE DEL 31 DE MAYO DEL 2019

**Conclusiones:**

SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, REALIZANDO EL RIEGO DE LA VÍA, EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA Y ACCESOS, COLOCANDO LAS SEÑALES PREVENTIVAS TEMPORALES EN LUGARES ADECUADOS. ADEMAS SE REALIZA TRABAJOS EN VARIOS FRENTES COMO: MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES, SUB BASE Y BASE GRANULAR.

**Recomendaciones:**

ACELERAR LOS TRABAJOS YA QUE SE TIENE RETRASO DEL MAS DEL 20% DE LO PROGRAMADO

### PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

31-05-2019

**Actividades:**

PUENTE UNTAVE ( L = 90.00 m)

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

MANTENIMIENTO DE GRÚA Y PILOTERA.

EN EL MOMENTO DE VACEADO DE PILOTES SE QUEDARON TRES CAMISetas DE 6 METROS CADA UNA EN LA POSICIÓN TRES, CUATRO Y CINCO, MOTIVO POR EL CUAL NO SE DISPONE DE CAMISetas O CUERPOS PARA LA PERFORACIÓN

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

01-06-2019

1



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 31-05-2019

**Actividades:**  
 PUENTE UNTAVE (L=90.00 m)

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 ACERO DE REFUERZO PARA PILOTES COMO INDICA LOS PLANOS

2


**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

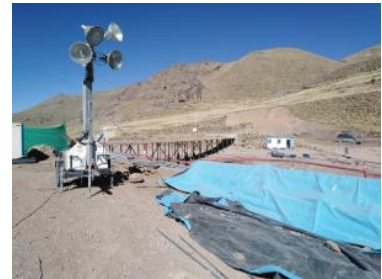

**Fecha Toma De Datos:**  
 01-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 31-05-2019

**Actividades:**  
 PUENTE UNTAVE ( L=90.00 M)

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 40+050, ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA PILOTES SEGÚN PLANOS

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 01-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 31-05-2019

**Actividades:**  
 MEJORAMIENTO

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 MEJ. DE TERRENO DE FUNDACIÓN PARA BASE DE TERRAPLÉN.

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 01-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 31-05-2019

**Actividades:**  
 PLANTA DE PRODUCCIÓN DE CONCRETO

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 VERIFICACIÓN DE HOJA DE DISEÑO DE MEZCLA DEBIDAMENTE FIRMADO POR LOS ESPECIALISTAS Y RESPONSABLES

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 01-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 31-05-2019

**Actividades:**  
 PEDRAPLEN

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 ACOMODO DE PIEDRAS SOBRE EL GEOTEXTIL ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 36+620 HASTA KM 36+685

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 01-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 31-05-2019

**Actividades:**  
 BASE GRANULAR

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 CONFORMACIÓN DE MATERIAL PARA LA BASE UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 9+192

7

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 01-06-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

31-05-2019

**Actividades:**

DRENAJE

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

ALCANTARILLA TIPO TMC DE 0.90 M DE DIÁMETRO UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 01+914, COMPACTACIÓN DE RELLENO ESTRUCTURAL

8

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

01-06-2019
