



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si  
 Nro Informe: 007-PVN - MJQY - 2019  
 Fecha Informe: 10-06-2019  
 Nombre De La Obra: HUANUCO - HUALLANCA (T1)  
 Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

**Asunto:**

"MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: HUANUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA - DV. ANTAMINA Y EMP. PE-3N (TINGO CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA - ANTAMINA"  
 - EL DÍA DE HOY SI HUBO REGISTROS DE PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA Y DEL JEFE DE SUPERVISIÓN.  
 - SE ADJUNTA FOTOS DEL CUADERNO DE OBRA A LA FECHA 10.06.2019

**Conclusiones:**

- EL RESIDENTE DEL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN OBRA
- EL GERENTE VIAL DEL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN OBRA
- EL JEFE DE SUPERVISIÓN SE ENCUENTRA EN OBRA (FALTA SUSTENTO DE SU OPERACIÓN)
- EL GERENTA VIAL DE LA SUPERVISIÓN SE ENCUENTRA EN OBRA
- LOS TRABAJOS SE VIENEN DESARROLLANDO CON NORMALIDAD EL CLIMA ES FAVORABLE TODO EL DÍA
- SOBRE EL CUADERNO DE OBRA, SE INFORMA LO SIGUIENTE EL ÚLTIMO REGISTRO REALIZADO POR EL JEFE DE SUPERVISIÓN, TIENE COMO ASIENTO N° 481 DE LA PAGINA N° 078 Y CON FECHA DE REGISTRO DEL SUPERVISOR EL 06.06.2019 Y FUE VERIFICADA POR EL SUSCRITO EL DÍA 10.06.2019.
- LA SUB CONTRATA CIALSA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C. QUE TRABAJA PARA CR20 EL DÍA DE HOY 10.06.19, PARALIZO SUS ACTIVIDADES POR COMPLETO INDICANDO QUE EL CONTRATISTA ESTÁ DEBIENDO 2 MESES DE PAGOS GENERANDO MAS RETRASO A LA OBRA.
- LA OBRA A LA FECHA ESTA EN EJECUCIÓN
- LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA

**Recomendaciones:**

- SE LE INDICO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA REITERAR AL CONTRATISTA CON EL RIEGO DE LA VÍA CON AGUA, MEDIANTE CISTERNA PARA CONTROLAR LA EMISIÓN DEL POLVO, EN EL SECTOR DEL KM. 30+000 AL KM. 52+720.
- SE LE INDICO AL JEFE DE SUPERVISIÓN TOMAR LAS MEDIDAS DEL CASO Y REUNIRSE CON EL CONTRATISTA CR20 PARA EVALUAR SOLUCIONES DE LA OBRA.



**PANEL FOTOGRAFICO**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 10-06-2019

**Actividades:**  
PROGRESIVA KM 47 + 300

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
MAQUINAS PESADAS EN MANTENIMIENTO

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
10-06-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

10-06-2019

**Actividades:**

PROGRESIVA KM 47 + 150

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME's

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

10-06-2019

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 10-06-2019

**Actividades:**  
PROGRESIVA KM 52 + 730 - DME C

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE (DME-C), TRABAJOS DE TENDIDO DEL MATERIAL CON MAQUINARIA TRACTOR ORUGA

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
10-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 10-06-2019

**Actividades:**  
PROGRESIVA KM 51 + 000

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE (DME-A) (DME-B), TRABAJOS DE TENDIDO DEL MATERIAL CON MAQUINARIA TRACTOR ORUGA

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
10-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

**MICHAEL JESUS QUISPE YAURI**

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

10-06-2019

**Actividades:**

KM 49 + 980

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

ROCK DRILL

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

10-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

**MICHAEL JESUS QUISPE YAURI**

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

10-06-2019

**Actividades:**

PROGRESIVA KM 50 + 049

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME'S

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

10-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 10-06-2019

**Actividades:**  
 PROGRESIVA KM 47 + 375

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME's

7

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 10-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 10-06-2019

**Actividades:**  
 PROGRESIVA KM 46 + 900

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME's

8

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 10-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 10-06-2019

**Actividades:**  
 PROGRESIVA KM 46 + 450

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME's

9

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 10-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 10-06-2019

**Actividades:**  
 PROGRESIVA KM 44 + 180

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME's

10

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 10-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

**Personal Encargado:**  
MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
10-06-2019

**Actividades:**  
PROGRESIVA KM 43 + 120

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
SE VIENE REALIZANDO LA PERFORACIÓN DE TALUD DE LAS ROCAS CON EQUIPO ROCK DRILL

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
10-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

**Personal Encargado:**  
MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
10-06-2019

**Actividades:**  
PROGRESIVA KM 43 + 100

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME's

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
10-06-2019





Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

**Personal Encargado:**  
MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
10-06-2019

**Actividades:**  
PROGRESIVA KM 42 + 350

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME'S

Foto1:



Foto2:

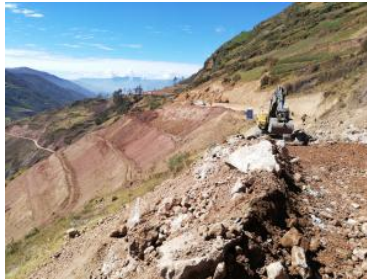


Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
10-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

**Personal Encargado:**  
MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
10-06-2019

**Actividades:**  
PROGRESIVA KM 38 + 990

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
SE ESTA REALIZANDO LA EXCAVACIÓN CON EQUIPO EXCAVADORA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SUELO DE UN ESPESOR = 0.80 M

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
10-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

15

**Personal Encargado:**  
MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
10-06-2019

**Actividades:**  
PROGRESIVA KM 36 + 000

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
EQUIPOS PARADOS DE LA SUB CONTRATA CIALSA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C. EN EL CAMPAMENTO DE CR20

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
10-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

16

**Personal Encargado:**  
MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
10-06-2019

**Actividades:**  
PROGRESIVA KM 33 + 600

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE LA CANTERA - TALUD N. 04

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
10-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

17

**Personal Encargado:**  
MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
10-06-2019

**Actividades:**  
PROGRESIVA KM 12 + 700

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME's

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
10-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

18

**Personal Encargado:**  
MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
10-06-2019

**Actividades:**  
PROGRESIVA KM 27 + 390

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE (DME) - LA MAQUINARIA EXCAVADORA ESTA PARADA SUB CONTRATA CIALSA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
10-06-2019
