



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si
Nro Informe: N° 007-PVN - MJQY - 2019
Fecha Informe: 10-06-2019
Nombre De La Obra: HUANUCO - HUALLANCA (T1)
Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

"MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: HUANUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA - DV. ANTAMINA Y EMP. PE-3N (TINGO CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA - ANTAMINA"
 - EL DÍA DE HOY SI HUBO REGISTROS DE PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA Y DEL JEFE DE SUPERVISIÓN.
 - SE ADJUNTA FOTOS DEL CUADERNO DE OBRA A LA FECHA 10.06.2019

Conclusiones:

- EL RESIDENTE DEL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN OBRA
- EL GERENTE VIAL DEL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN OBRA
- EL JEFE DE SUPERVISIÓN SE ENCUENTRA EN OBRA (FALTA SUSTENTO DE SU OPERACIÓN)
- EL GERENTE VIAL DE LA SUPERVISIÓN SE ENCUENTRA EN OBRA
- LOS TRABAJOS SE VIENEN DESARROLLANDO CON NORMALIDAD EL CLIMA ES FAVORABLE TODO EL DÍA
- SOBRE EL CUADERNO DE OBRA, SE INFORMA LO SIGUIENTE EL ÚLTIMO REGISTRO REALIZADO POR EL JEFE DE SUPERVISIÓN, TIENE COMO ASIENTO N° 481 DE LA PAGINA N° 078 Y CON FECHA DE REGISTRO DEL SUPERVISOR EL 06.06.2019 Y FUE VERIFICADA POR EL SUSCRITO EL DÍA 10.06.2019.
- LA SUB CONTRATISTA CIALSA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C. QUE TRABAJA PARA CR20 EL DÍA DE HOY 10.06.19, PARALIZO SUS ACTIVIDADES POR COMPLETO INDICANDO QUE EL CONTRATISTA ESTÁ DEBIENDO 2 MESES DE PAGOS GENERANDO MAS RETRASO A LA OBRA.
- LA OBRA A LA FECHA ESTA EN EJECUCIÓN
- LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA

Recomendaciones:

- SE LE INDICO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA REITERAR AL CONTRATISTA CON EL RIEGO DE LA VÍA CON AGUA, MEDIANTE CISTERNA PARA CONTROLAR LA EMISIÓN DEL POLVO, EN EL SECTOR DEL KM. 30+000 AL KM. 52+720.
- SE LE INDICO AL JEFE DE SUPERVISIÓN TOMAR LAS MEDIDAS DEL CASO Y REUNIRSE CON EL CONTRATISTA CR20 PARA EVALUAR SOLUCIONES DE LA OBRA.



PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-06-2019

Actividades:
PROGRESIVA KM 47 + 300

CDescripcion_____:
MAQUINAS PESADAS EN MANTENIMIENTO

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-06-2019

Actividades:
PROGRESIVA KM 47 + 150

CDescripcion_____:
SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME's

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-06-2019

Actividades:
 PROGRESIVA KM 52 + 730 - DME C

CDescripcion_____:
 DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE (DME-C), TRABAJOS DE TENDIDO DEL MATERIAL CON MAQUINARIA TRACTOR ORUGA

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-06-2019

Actividades:
 PROGRESIVA KM 51 + 000

CDescripcion_____:
 DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE (DME-A) (DME-B), TRABAJOS DE TENDIDO DEL MATERIAL CON MAQUINARIA TRACTOR ORUGA

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-06-2019

Actividades:

KM 49 + 980

CDescripcion_____:

ROCK DRILL

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

10-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-06-2019

Actividades:

PROGRESIVA KM 50 + 049

CDescripcion_____:

SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME'S

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

10-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-06-2019

Actividades:
 PROGRESIVA KM 47 + 375

CDescripcion_____:

SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME's

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-06-2019

Actividades:
 PROGRESIVA KM 46 + 900

CDescripcion_____:

SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME's

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-06-2019

Actividades:
 PROGRESIVA KM 46 + 450

CDescripcion_____:
 SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME's

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-06-2019

Actividades:
 PROGRESIVA KM 44 + 180

CDescripcion_____:
 SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME's

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado:
MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
10-06-2019

Actividades:
PROGRESIVA KM 43 + 120

CDescripcion_____:
SE VIENE REALIZANDO LA PERFORACIÓN DE TALUD DE LAS ROCAS CON EQUIPO ROCK DRILL

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado:
MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
10-06-2019

Actividades:
PROGRESIVA KM 43 + 100

CDescripcion_____:
SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME's

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado:
MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
10-06-2019

Actividades:
PROGRESIVA KM 42 + 350

CDescripcion_____:
SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME'S

Foto1:



Foto2:

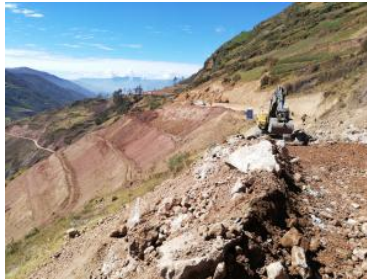


Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado:
MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
10-06-2019

Actividades:
PROGRESIVA KM 38 + 990

CDescripcion_____:
SE ESTA REALIZANDO LA EXCAVACIÓN CON EQUIPO EXCAVADORA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SUELO DE UN ESPESOR = 0.80 M

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

15

Personal Encargado:
MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
10-06-2019

Actividades:
PROGRESIVA KM 36 + 000

CDescripcion_____:
EQUIPOS PARADOS DE LA SUB CONTRATA CIALSA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C. EN EL CAMPAMENTO DE CR20

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

16

Personal Encargado:
MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
10-06-2019

Actividades:
PROGRESIVA KM 33 + 600

CDescripcion_____:
EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE LA CANTERA - TALUD N. 04

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

17

Personal Encargado:
MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
10-06-2019

Actividades:
PROGRESIVA KM 12 + 700

CDescripcion_____:
SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME's

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

18

Personal Encargado:
MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
10-06-2019

Actividades:
PROGRESIVA KM 27 + 390

CDescripcion_____:
DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE (DME) - LA MAQUINARIA EXCAVADORA ESTA PARADA SUB CONTRATA CIALSA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-06-2019
