



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: B 0 048	Fecha Informe: 21-06-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
--------------------------	----------------------------	------------------------------	--	---

Foto Bitacora:      Foto Bitacora 2:      Foto Bitacora 3:      Foto Bitacora 4:      Foto Bitacora 5:      Foto Bitacora 6:

**Asunto:**

Reporte de monitoreo 21-06-19

**Conclusiones:**

Continúan los trabajos de perforación de roca para voladura, usando martillos neumáticos y perforadora neumática rock drill en distintas progresivas.  
En distintos puntos se registran trabajos de eliminación de material excedentes a DMEs correspondientes y liberación de vías.  
En la progresiva 136+650 a la 136+700 aproximadamente continúan los trabajos de reubicación de tubería de la red de agua que abastece a Oyón, de tal forma ésta no interfiera con algunos frentes de trabajo y se vea afectada.  
Continúan realizándose los trabajos de voladura de roca en distintas progresivas diariamente para el ensanchamiento de vía.  
Continúan los trabajos de movimiento de tierras en distintas progresivas, para conformación y mejoramientos de plataformas, ensanchamiento de vías.  
En distintos puntos del tramo se realizan trabajos de nivelación y compactación de vía a cota de subrazante.  
Continúan trabajos de instalación de alcantarillas en distintas progresivas, se verifica el adecuado proceso constructivo de las mismas.  
El día de hoy se llevo a cabo en las oficinas de la supervisión una reunión con el Ing. Raul Lescano Avalos, especialista de la unidad gerencial de operaciones de provias nacional, para tratar sobre el tema de la ubicación del peaje dentro del tramo I, por parte de la supervisión participaron el Ing. jefe de supervisión Felix Ugarte y especialista del área de topografía el Ing. Leandro Canchari. Se firmo acta (adjunta) detallando las actividades realizadas, evaluación de propuestas por supervisión y expediente técnico, asimismo, formulando una nueva propuesta con el objetivo de cumplir con los criterios técnicos necesarios, la cual se evaluara con mayor detalle y se informara al equipo de supervisión junto con sustento técnico y tome las acciones correspondientes.

**Recomendaciones:**

Seguimiento a las indicaciones que se emitan por parte de la entidad con respecto al tema de la ubicación del peaje dentro del tramo I, e ir evaluando y analizando técnicamente las nuevas propuestas y consecuencias en el proyecto hasta su comunicación formal para implementación.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 21-06-2019

**Actividades:**  
 Reunión sobre ubicación de peaje en tramo

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**


1

El día de hoy se llevo a cabo en las oficinas de la supervisión una reunión con el Ing. Raul Lescano Avalos, especialista de la unidad gerencial de operaciones de provias nacional, para tratar sobre el tema de la ubicación del peaje dentro del tramo I, por parte de la supervisión participaron el Ing. jefe de supervisión Felix Ugarte y especialista del área de topografía el Ing. Leandro Canchari.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 21-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 21-06-2019

**Actividades:**  
 Instalación de TMC 36"

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

2

En la progresiva 136+665 se realiza la excavación y colocación de cama de arena para la instalación de alcantarilla TMC 36"

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 21-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 21-06-2019

**Actividades:**  
 Corte de talud y banqueta

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 3 En la progresiva 136+950 a la 137+050 continúan los trabajos de corte de talud, banqueta y eliminación de material excedente

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 21-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 21-06-2019

**Actividades:**  
 Voladura de roca fija

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 4 Se programa voladura de roca fija para el día de hoy en la progresiva 167+470

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 21-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 21-06-2019

**Actividades:**  
 Corte de terreno y eliminación de material excedente

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

5 En la progresiva 139+400 a la 139 520 continúan los trabajos de corte de terreno y eliminación de material excedente

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 21-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 21-06-2019

**Actividades:**  
 Corte de talud y banquetta

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

6 En la progresiva 138+430 a la 138+500 se realizan trabajos de corte de talud, banquetta y eliminación de material excedente

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 21-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 21-06-2019

**Actividades:**  
 Reunión sobre ubicación de peaje en tramo

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:

El día de hoy se llevo a cabo en las oficinas de la supervisión una reunión con el Ing. Raul Lescano Avalos, especialista de la unidad gerencial de operaciones de provias nacional, para tratar sobre el tema de la ubicación del peaje dentro del tramo I, por parte de la supervisión participaron el Ing. jefe de supervisión Felix Ugarte y especialista del área de topografía el Ing. Leandro Canchari. Se firmo acta (adjunta) detallando las actividades realizadas, evaluación de propuestas por supervisión y expediente técnico, asimismo, formulando una nueva propuesta con el objetivo de cumplir con los criterios técnicos necesarios, la cual se evaluara con mayor detalle y se informara al equipo de supervisión junto con sustento técnico y tome las acciones correspondientes.

7


**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

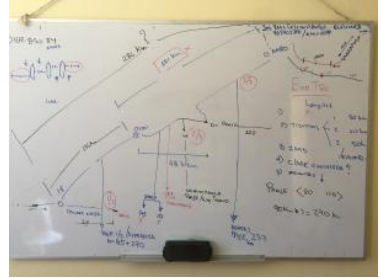

**Fecha Toma De Datos:**  
 21-06-2019



**Fotos:**

