

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe: 02	Fecha Informe: 25-06-2019	Nombre De La Obra: Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	Personal Encargado: J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS
--------------------	--------------------	------------------------------	--	--

Foto Bitacora:      Foto Bitacora 2:      Foto Bitacora 3:      Foto Bitacora 4:      Foto Bitacora 5:      Foto Bitacora 6:

**Asunto:**

Se ha observado el día de hoy la empresa Neptuno tiene una organización de varios frentes, tales como: adelante se va conformando las obras de arte como son alcantarillas, muros de contención, Sub drenes seguida de los frentes de conformación de de la Sub Rasante , Sub Base, y base, y al final la Imprimación finalizando con la conformación de la carpeta asfáltica en sus diferentes capas, según expediente técnico, mientras en el otro frente, la empresa Reyna, cuenta con pocos frentes tales como se vienen conformando las obras de arte, alcantarillas, Sub Drenes, construcción de los puentes, re-conformación de la base e imprimado, y a la fecha no se esta asfaltando ningún tramo.

así mismo se pone en constancia que a la fecha no se tiene acceso a la documentación referente al cuaderno de obra y a la asistencia del personal profesional propuesto por el consorcio, del mismo modo por parte de la supervision

**Conclusiones:**

En el presente dias se observa un regular avance de obra en el primer frente con la empresa Neptuno, y un bajo avance de obra en el frente de la empresa Reyna, con la probabilidad de atraso por los problemas sociales que se tiene en este segundo tramo.

**Recomendaciones:**

Reforzar en solucionar los problemas sociales y dar libre accesibilidad para que se pueda mejorar el avance de obra en el segundo tramo, que ejecuta la empresa Reyna.

### PANEL FOTOGRAFICO



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 25-06-2019

**Actividades:**  
Construcción puente San Genaro, sobre el río Salado

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Construcción de pilares

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
25-06-2019

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 25-06-2019

**Actividades:**  
Mov. de tierras Alc.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
km 79+480

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
25-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**  
JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
25-06-2019

**Actividades:**  
Mov. de tierras en Alc.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
km 79+880

3

Foto1:



Foto2:

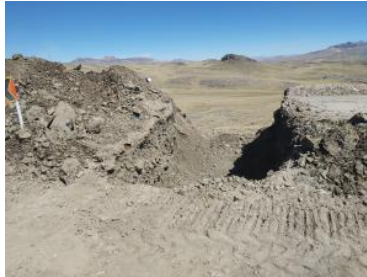


Foto3:

**Fecha Toma De Datos:**  
25-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**  
JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
25-06-2019

**Actividades:**  
Mov de tierras Alc.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Km 80+280

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
25-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 25-06-2019

**Actividades:**  
 Compac de Relleno en Alcantarilla

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Km 80+430

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
 25-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 25-06-2019

**Actividades:**  
 Mov. de tierras en Alcantarilla

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Km 80+69.06

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
 25-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

25-06-2019

**Actividades:**

Encofrado de Alcantarilla

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

km 81+137.79

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

25-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

25-06-2019

**Actividades:**

Encofrado de Alcantarilla

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

km 81+323

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

25-06-2019

7

8



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

25-06-2019

**Actividades:**

Desencofrado de Alcantarilla

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

km 82+708.15

9

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

25-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

25-06-2019

**Actividades:**

Planta de asfalto

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En producción, vista de los equipos

10

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

25-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 25-06-2019

**Actividades:**  
 Cantera TURPO

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Km 83

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 25-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 25-06-2019

**Actividades:**  
 Muro de contencion

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo km 95+816 al km 95+834 L=18.00, h=7.29

**Foto1:**

**Foto2:**

**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 26-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

13

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 25-06-2019

**Actividades:**  
 Conformacion de la Sub Rasante

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo km 99+560 al km 99+700

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 25-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

14

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 25-06-2019

**Actividades:**  
 Botadero

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 km 100+250

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 26-06-2019





**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

15

**Personal Encargado:**

JORGE BENJAMIN  
CISNEROS CADENAS

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

25-06-2019

**Actividades:**

Sub Dren lado Izquierdo

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Tramo km 100+395 al km 100+320

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

26-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

16

**Personal Encargado:**

JORGE BENJAMIN  
CISNEROS CADENAS

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

25-06-2019

**Actividades:**

Eliminacion de materil exedente

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

km

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

26-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

17

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 25-06-2019

**Actividades:**  
Limpieza de Base para Imprimir

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
del km 122+141 al km

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
26-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

18

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 25-06-2019

**Actividades:**  
Asfaltado de una primera capa

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
del km 103+800 al km 121+00, inicio del tramo de Neptuno

**Foto1:**

**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
25-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

19

**Personal Encargado:**

JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

25-06-2019

**Actividades:**

Asfalto segunda capa

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

km 108+890 al km 109+600

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

26-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

20

**Personal Encargado:**

JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

25-06-2019

**Actividades:**

Puente progr. a ejecutarce

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

km 109+311.30

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

26-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

21

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 25-06-2019

**Actividades:**  
Armado de acero Alcantarilla

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
km 136+065.85

**Foto1:**

**Foto2:**

**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
26-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

22

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 25-06-2019

**Actividades:**  
Contruccion cunetas laterales

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Tramo km 102+920 al km 103+170

**Foto1:**

**Foto2:**

**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
26-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

23

**Personal Encargado:**

JORGE BENJAMIN  
CISNEROS CADENAS

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

25-06-2019

**Actividades:**

Cantera TURpo

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Km 83

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

26-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

24

**Personal Encargado:**

JORGE BENJAMIN  
CISNEROS CADENAS

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

25-06-2019

**Actividades:**

Conformacion de Sub Base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Tramo

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

26-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

25

**Personal Encargado:**

JORGE BENJAMIN  
CISNEROS CADENAS

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

25-06-2019

**Actividades:**

Conformacion de la Sub Rasante

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

km 85+540 al 85+740

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

26-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

26

**Personal Encargado:**

JORGE BENJAMIN  
CISNEROS CADENAS

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

25-06-2019

**Actividades:**

Sub base primera capa

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

km 121+000 al 122+000

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

25-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

27

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 25-06-2019

**Actividades:**  
conformación de la Sub Base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
km 122+700 al km 123+120

**Foto1:**

**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
25-06-2019
