

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e: 02	Fecha Informe: 25-06-2019	Nombre De La Obra: Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo- Yauri-San Genaro	Personal Encargado: J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS
-------------------------------	---------------------------	------------------------------	---	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Se ha observado el día de hoy la empresa Neptuno tiene una organización de varios frentes, tales como: adelante se va conformando las obras de arte como son alcantarillas, muros de contención, Sub drenes seguida de los frentes de conformación de de la Sub Rasante , Sub Base, y base, y al final la Imprimación finalizando con la conformación de la carpeta asfáltica en sus diferentes capas, según expediente técnico, mientras en el otro frente, la empresa Reyna, cuenta con pocos frentes tales como se vienen conformando las obras de arte, alcantarillas, Sub Drenes, construcción de los puentes, re-conformación de la base e imprimado, y a la fecha no se esta asfaltando ningún tramo.

así mismo se pone en constancia que a la fecha no se tiene acceso a la documentación referente al cuaderno de obra y a la asistencia del personal profesional propuesto por el consorcio, del mismo modo por parte de la supervision

Conclusiones:

En el presente dias se observa un regular avance de obra en el primer frente con la empresa Neptuno, y un bajo avance de obra en el frente de la empresa Reyna, con la probabilidad de atraso por los problemas sociales que se tiene en este segundo tramo.

Recomendaciones:

Reforzar en solucionar los problemas sociales y dar libre accesibilidad para que se pueda mejorar el avance de obra en el segundo tramo, que ejecuta la empresa Reyna.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-06-2019

Actividades:
 Construcción puente San Genaro, sobre el río Salado

CDescripcion_____:
 Construcción de pilares

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 25-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-06-2019

Actividades:
 Mov. de tierras Alc.

CDescripcion_____:
 km 79+480

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 25-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-06-2019

Actividades:

Mov. de tierras en Alc.

CDescripcion_____:

km 79+880

3

Foto1:



Foto2:

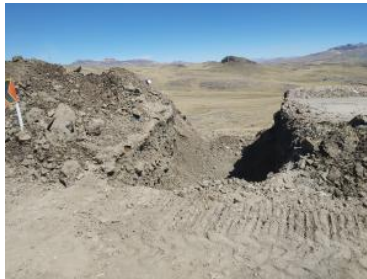


Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-06-2019

Actividades:

Mov de tierras Alc.

CDescripcion_____:

Km 80+280

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

25-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-06-2019

Actividades:
 Compac de Relleno en Alcantarilla

CDescripcion_____:
 Km 80+430

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 25-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-06-2019

Actividades:
 Mov. de tierras en Alcantarilla

CDescripcion_____:
 Km 80+69.06

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 25-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-06-2019

Actividades:

Encofrado de Alcantarilla

CDescripcion_____:

km 81+137.79

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

25-06-2019

7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-06-2019

Actividades:

Encofrado de Alcantarilla

CDescripcion_____:

km 81+323

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

25-06-2019

8



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-06-2019

Actividades:

Desencofrado de Alcantarilla

CDescripcion_____:

km 82+708.15

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-06-2019

Actividades:

Planta de asfalto

CDescripcion_____:

En producción, vista de los equipos

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

25-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-06-2019

Actividades:
 Cantera TURPO

CDescripcion_____:
 Km 83

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 25-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-06-2019

Actividades:
 Muro de contencion

CDescripcion_____:
 Tramo km 95+816 al km 95+834 L=18.00, h=7.29

Foto1:

Foto2:

Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 26-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-06-2019

Actividades:
 Conformacion de la Sub Rasante

CDescripcion_____:
 Tramo km 99+560 al km 99+700

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 25-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-06-2019

Actividades:
 Botadero

CDescripcion_____:
 km 100+250

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 26-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

15

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-06-2019

Actividades:
 Sub Dren lado Izquierdo

CDescripcion_____:
 Tramo km 100+395 al km 100+320

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 26-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

16

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-06-2019

Actividades:
 Eliminacion de materil exedente

CDescripcion_____:
 km

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 26-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

17

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-06-2019

Actividades:
Limpieza de Base para Imprimir

CDescripcion_____:
del km 122+141 al km

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
26-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

18

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-06-2019

Actividades:
Asfaltado de una primera capa

CDescripcion_____:
del km 103+800 al km 121+00, inicio del tramo de Neptuno

Foto1:

Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
25-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

19

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-06-2019

Actividades:

Asfalto segunda capa

CDescripcion_____:

km 108+890 al km 109+600

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

26-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

20

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-06-2019

Actividades:

Puente progr. a ejecutarce

CDescripcion_____:

km 109+311.30

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

21

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-06-2019

Actividades:
 Armado de acero Alcantarilla

CDescripcion_____:
 km 136+065.85

Foto1:

Foto2:

Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 26-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

22

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-06-2019

Actividades:
 Contruccion cunetas laterales

CDescripcion_____:
 Tramo km 102+920 al km 103+170

Foto1:

Foto2:

Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 26-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

23

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-06-2019

Actividades:

Cantera TURpo

CDescripcion_____:

Km 83

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

26-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

24

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-06-2019

Actividades:

Conformacion de Sub Base

CDescripcion_____:

Tramo

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

26-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

25

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN
CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-06-2019

Actividades:

Conformacion de la Sub Rasante

CDescripcion_____:

km 85+540 al 85+740

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

26-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

26

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN
CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-06-2019

Actividades:

Sub base primera capa

CDescripcion_____:

km 121+000 al 122+000

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

27

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-06-2019

Actividades:
conformación de la Sub Base

CDescripcion_____:
km 122+700 al km 123+120

Foto1:

Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
25-06-2019
