



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> N° 018-PVN - MJQY - 2019	<b>Fecha Informe:</b> 26-06-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> HUANUCO - HUALLANCA (T1)	<b>Personal Encargado:</b> MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
---------------------------------	---	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:





Foto Bitacora 6:



**Asunto:**

"MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: HUANUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA - DV. ANAMINA Y EMP. PE-3N (TINGO CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA - ANAMINA"  
 - EL DÍA DE HOY SI HUBO REGISTROS DE PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA Y DEL JEFE DE SUPERVISIÓN.  
 - SE ADJUNTA FOTOS DEL CUADERNO DE OBRA A LA FECHA 26.06.2019

**Conclusiones:**

- EL RESIDENTE DEL CONTRATISTA CR20 SE ENCUENTRA EN OBRA
- EL JEFE DE SUPERVISIÓN SE ENCUENTRA EN OBRA (FALTA SUSTENTO DE SU OPERACIÓN)
- LOS TRABAJOS SE VIENEN DESARROLLANDO CON NORMALIDAD EL CLIMA ES FAVORABLE TODO EL DÍA
- SOBRE EL CUADERNO DE OBRA, SE INFORMA LO SIGUIENTE EL ÚLTIMO REGISTRO REALIZADO POR EL CONTRATISTA, TIENE COMO ASIENTO N° 558 DE LA PAGINA N° 034 Y CON FECHA DE REGISTRO EL 22.06.2019 Y FUE VERIFICADA POR EL SUSCRITO EL DÍA 26.06.2019.
- NO SE ENCUENTRA EN OBRA DE LA SUPERVISIÓN EL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA ING. JORGE ARTURO VALDIVIA CHOCANO
- LA EMPRESA AWR INGENIEROS S.R.L. ENCARGADO DE LOS TRABAJOS DE RE UBICACIÓN DE POSTES DE LUZ DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN QUE ESTÁN DENTRO DEL DERECHO DE VÍA, EL DÍA DE HOY SE ENCUENTRA EN EL PROYECTO INSTALANDO SU CAMPAMENTO.
- EL CONTRATISTA CR20 SE COMPROMETIÓ EN ENTREGAR LA CONSTRUCCIÓN DE 20 PLATAFORMAS EJECUTADAS AL 100%, QUE INICIAN DEL 24.06.19 AL 01.07.19
- EL CONTRATISTA CR20 PRESENTO A SENACE - (EL SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES), ITS - (INFORME TÉCNICO SUSTENTA TORIO) DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADOS QUE FUE OBSERVADO POR LA TITULARIDAD DEL PROPIETARIO SIENDO EL TITULAR PROVIAS NACIONAL.
- LA OBRA A LA FECHA ESTA EN EJECUCIÓN
- LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA



**Recomendaciones:**

- SE LE INDICO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA REITERAR AL CONTRATISTA CON EL RIEGO DE LA VÍA CON AGUA, MEDIANTE CISTERNA PARA CONTROLAR LA EMISIÓN DEL POLVO, EN EL SECTOR DEL KM 12 + 000 AL KM 45 + 000.
- SE INDICO A LA SUPERVISIÓN COORDINAR CON EL CONTRATISTA CR20 SOBRE LOS TIEMPOS DE LIBERACIÓN DE LA VÍA PARA EVITAR EL TRAFICO DE LOS VEHÍCULOS A LA HORA DEL PASE, NO SE ESTA LLEVANDO UN BUEN CONTROL CON LOS TIEMPOS LIBERADOS.

**PANEL FOTOGRAFICO**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

<b>Personal Encargado:</b> MICHAEL JESUS QUISPE YAURI	<b>Nivel:</b> No Aplica	<b>Fecha De Fotografia:</b> 26-06-2019
--	----------------------------	---

**Actividades:**  
PROGRESIVA KM 37 + 620

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :  
SE CONTINUA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, PERFILADO, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE A LOS DME's

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
26-06-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 26-06-2019

**Actividades:**  
PROGRESIVA KM 51 + 000 (A, B, C)

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE (DME-A), ACOPIO Y EXTENDIDO DE MATERIAL EXCEDENTE SOBRE LA PLATAFORMA CON APOYO DE EQUIPO MAQUINA TRACTOR ORUGA

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
26-06-2019

2



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MICHAEL JESUS QUISPE  
YAURI

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

26-06-2019

**Actividades:**

PROGRESIVA KM 49 + 030

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

SE CONTINUA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, PERFILADO, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE A LOS DME's

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

26-06-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 26-06-2019

**Actividades:**  
PROGRESIVA KM 48 + 900

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

SE CONTINUA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, PERFILADO, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE A LOS DME's

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
26-06-2019



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MICHAEL JESUS QUISPE  
YAURI

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

26-06-2019

**Actividades:**

PROGRESIVA KM 46 + 900

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

SE CONTINUA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, PERFILADO, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE A LOS DME's

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

26-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 26-06-2019

**Actividades:**  
PROGRESIVA KM 24 + 400

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
SE CONTINUA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, PERFILADO, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE A LOS DME's

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
26-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 26-06-2019

**Actividades:**  
PROGRESIVA KM 32 + 800

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
SE CONTINUA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, PERFILADO, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE A LOS DME's

7

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
26-06-2019





**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 26-06-2019

**Actividades:**  
PROGRESIVA KM 32 + 800

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
SE CONTINUA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, PERFILADO, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE A LOS DME's

8

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
26-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 26-06-2019

**Actividades:**  
PROGRESIVA KM 33 + 600

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
SE CONTINUA CON LA ACUMULACIÓN Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE LA CANTERA - TALUD N. 04

9

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
26-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 26-06-2019

**Actividades:**  
PROGRESIVA KM 52 + 400

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE (DME-A), ACOPIO Y EXTENDIDO DE MATERIAL EXCEDENTE SOBRE LA PLATAFORMA CON APOYO DE EQUIPO MAQUINA TRACTOR ORUGA

10


**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

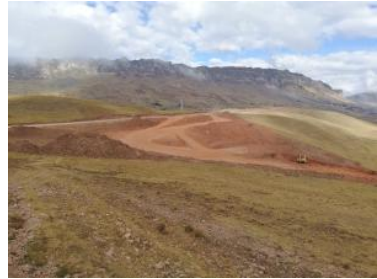

**Fecha Toma De Datos:**  
26-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 26-06-2019

**Actividades:**  
PROGRESIVA KM 43 + 800

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
SE CONTINUA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, PERFILADO, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE A LOS DME's

11

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
26-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 26-06-2019

**Actividades:**  
PROGRESIVA KM 43 + 000

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

SE CONTINUA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, PERFILADO, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE A LOS DME's

12

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
26-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 26-06-2019

**Actividades:**  
PROGRESIVA KM 39 + 530

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
SE CONTINUA CON EL MEJORAMIENTO DE LA SUB BASE CON MATERIAL EXTRAÍDO DE LA CANTERA KM 33 + 600 Y COMPACTADO POR CAPAS CON EQUIPO MAQUINARIA EXCAVADORA

13

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
26-06-2019



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MICHAEL JESUS QUISPE  
YAURI

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

26-06-2019

**Actividades:**

PROGRESIVA KM 27 + 360

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE (DME-A), ACOPIO Y EXTENDIDO DE MATERIAL EXCEDENTE SOBRE LA PLATAFORMA CON APOYO DE EQUIPO MAQUINA TRACTOR ORUGA

14

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

26-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

15

**Personal Encargado:**  
MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
26-06-2019

**Actividades:**  
PROGRESIVA KM 12 + 700

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
SE CONTINUA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, PERFILADO, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE A LOS DME's

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
26-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

16

**Personal Encargado:**  
MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
26-06-2019

**Actividades:**  
PROGRESIVA KM 12 + 000

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
SE VIENE REALIZANDO EL CORTE DE MATERIAL DE LA BASE DEL SUELO, CON APOYO DE EQUIPO MAQUINARIA EXCAVADORA

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
26-06-2019
