

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe: Informe N° 32	Fecha Informe: 03-07-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
--------------------	-------------------------------	------------------------------	--	--

Foto Bitacora:      Foto Bitacora 2:      Foto Bitacora 3:      Foto Bitacora 4:      Foto Bitacora 5:      Foto Bitacora 6:

**Asunto:**

Calicatas cada 50 metros - Voladura - Eliminación de Material de Corte - Trabajos en Perforación - Planta Chancadora

**Conclusiones:**

Se continua con los trabajos en perforación.  
Se continua con los trabajos de eliminación de material excedente.  
Se realiza las calicatas cada 50 metros.  
Se continua con la habilitación de la plataforma para la chancadora.  
Cuaderno de obra no esta al día

**Recomendaciones:**

Se recomienda aprobar el uso de los nuevos DMEs  
Se recomienda tener el cuaderno de obra al día

### PANEL FOTOGRAFICO



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

OMAR LENIN CUESTAS  
HUALLPA

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

03-07-2019

**Actividades:**

Calicatas cada 50 metros

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

(Km 188+850) Vistas fotográficas en la que se aprecia que el contratista y la supervisión sacan muestras. las calicatas es cada 50 metros desde la progresiva 188+00, calicatas para el estudio y posterior trabas de mejoramiento.

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

04-07-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

OMAR LENIN CUESTAS  
HUALLPA

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

03-07-2019

**Actividades:**

Voladura

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

(Km 188+750) Se realizó voladura en la cantera Juanita, para lo cual se ha tomado las medida de seguridad y evacuación a una distancia mínima de 500 metros a la redonda, la voladura se di a las 1:00 pm.

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

04-07-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 03-07-2019

**Actividades:**  
 Eliminación de Material de Corte

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

(Km 182+190) Se continúa con los trabajos de eliminación del material de voladura (Rocas), material transportados y almacenados en el DME N° 10 ubicado en el km 169+580, trabajo realizado con una excavadora.

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 04-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 03-07-2019


**Actividades:**  
 Trabajos en Perforación

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

(Km 182+230) Se continúa con los trabajos en perforación, para este trabajo se usa la máquina Trackdrill Gersoll Rand.

4

**Foto1:**

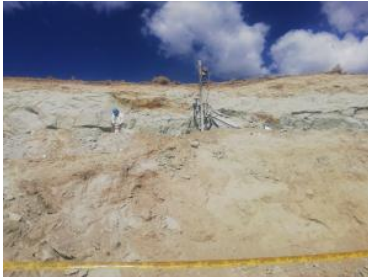

**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 04-07-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 03-07-2019

**Actividades:**  
 Trabajos de Mejoramiento

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 (Km 183+340) Vistas fotográficas de los trabajos de mejoramiento, trabajo realizado con un tractor oruga.

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 04-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 03-07-2019

**Actividades:**  
 Eliminación de Material de Deslizamiento

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 (Km 183+450) Vistas fotográficas en la que se puede apreciar los trabajos de recuperación del material colapsado y trasladado al DME N° 10.

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 04-07-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

OMAR LENIN CUESTAS  
HUALLPA

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

03-07-2019

**Actividades:**

Planta Chancadora

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

(Km 188+00) Vistas fotograficas en la que se aprecia los trabajos realizados en compactado de la plataforma donde sera instalado la Planta Chancadora.

7

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

04-07-2019
