

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Infor me: Infor me N ^o 32	Fecha Informe: 03-07-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
-------------------------------	--	------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

PRUEBA DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA NO TOMAR EN CUENTA

Calicatas cada 50 metros - Voladura - Eliminación de Material de Corte - Trabajos en Perforación
- Planta Chancadora

Conclusiones:

Se continua con los trabajos en perforación.
Se continua con los trabajos de eliminación de material excedente.
Se realiza las calicatas cada 50 metros.
Se continua con la habilitación de la plataforma para la chancadora.
Cuaderno de obra no esta al día

Recomendaciones:

Se recomienda aprobar el uso de los nuevos DMEs
Se recomienda tener el cuaderno de obra al día

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

OMAR LENIN CUESTAS
HUALLPA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-07-2019

Actividades:

Calicatas cada 50 metros

CDescripcion_____:

(Km 188+850) Vistas fotográficas en la que se aprecia que el contratista y la supervisión sacan muestras. las calicatas es cada 50 metros desde la progresiva 188+00, calicatas para el estudio y posterior trabas de mejoramiento.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

04-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-07-2019

Actividades:
Voladura

CDescripcion_____:

(Km 188+750) Se realizó voladura en la cantera Juanita, para lo cual se ha tomado las medida de seguridad y evacuación a una distancia mínima de 500 metros a la redonda, la voladura se di a las 1:00 pm.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
04-07-2019

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-07-2019

Actividades:
 Eliminación de Material de Corte

CDescripcion_____:

(Km 182+190) Se continúa con los trabajos de eliminación del material de voladura (Rocas), material transportados y almacenados en el DME N° 10 ubicado en el km 169+580, trabajo realizado con una excavadora.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 04-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-07-2019

Actividades:
 Trabajos en Perforación

CDescripcion_____:

(Km 182+230) Se continúa con los trabajos en perforación, para este trabajo se usa la máquina Trackdrill Gersoll Rand.

4

Foto1:

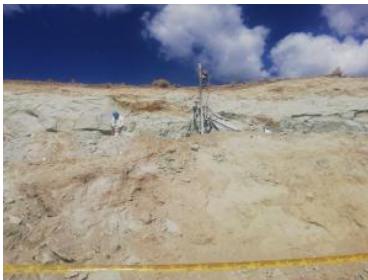


Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 04-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-07-2019

Actividades:
 Trabajos de Mejoramiento

CDescripcion_____:
 (Km 183+340) Vistas fotográficas de los trabajos de mejoramiento, trabajo realizado con un tractor oruga.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 04-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-07-2019

Actividades:
 Eliminación de Material de Deslizamiento

CDescripcion_____:
 (Km 183+450) Vistas fotográficas en la que se puede apreciar los trabajos de recuperación del material colapsado y trasladado al DME N° 10.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 04-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-07-2019

Actividades:
Planta Chancadora

CDescripcion_____:
(Km 188+00) Vistas fotograficas en la que se aprecia los trabajos realizados en compactado de la plataforma donde sera instalado la Planta Chancadora.

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
04-07-2019
