



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: N° 020-PVN - MJQY - 2019	Fecha Informe: 01-07-2019	Nombre De La Obra: HUANUCO - HUALLANCA (T1)	Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
---------------------------------	---	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:





Foto Bitacora 6:



Asunto:

HUANUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA - DV. ANAMINA Y EMP. PE-3N (TINGO CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA - ANAMINA"
 - EL DÍA DE HOY SI HUBO REGISTROS DE PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA Y DEL JEFE DE SUPERVISIÓN.
 - SE ADJUNTA FOTOS DEL CUADERNO DE OBRA A LA FECHA 01.07.2019

Conclusiones:

- EL RESIDENTE DEL CONTRATISTA CR20 SE ENCUENTRA EN OBRA
- EL JEFE DE SUPERVISIÓN SE ENCUENTRA EN OBRA
- LOS TRABAJOS SE VIENEN DESARROLLANDO CON NORMALIDAD TODO EL DÍA
- SOBRE EL CUADERNO DE OBRA, SE INFORMA LO SIGUIENTE EL ÚLTIMO REGISTRO REALIZADO POR EL SUPERVISOR DE OBRA, TIENE COMO ASIENTO N° 576 DE LA PAGINA N° 043 Y CON FECHA DE REGISTRO EL 25.06.2019 Y FUE VERIFICADA POR EL SUSCRITO EL DÍA 01.07.2019.
- NO SE ENCUENTRA EN OBRA DE LA SUPERVISIÓN EL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA ING. JORGE ARTURO VALDIVIA CHOCAÑO
- EN EL KM 52 + 000 LOCALIDAD DE PUNTO UNIÓN, HUBO CIERRE Y PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS LOS POBLADORES RECLAMAN A LA EMPRESA QUE LE DEN TRABAJO (CR20 Y SUPERVISIÓN DIALOGARON CON LA POBLACIÓN EN EL PUNTO PROCESO QUE ESTA EN EVALUACIÓN)
- EL CONTRATISTA CR20 VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE LAS PLATAFORMAS CON NORMALIDAD
- LA OBRA A LA FECHA ESTA EN EJECUCIÓN
- LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA

Recomendaciones:

- SE LE INDICO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA REITERAR AL CONTRATISTA CON EL RIEGO DE LA VÍA CON AGUA, MEDIANTE CISTERNA PARA CONTROLAR LA EMISIÓN DEL POLVO, EN EL SECTOR DEL KM 14 + 000 AL KM 52 + 920.
- SE INDICO A LA SUPERVISIÓN COORDINAR CON EL CONTRATISTA CR20 SOBRE LOS TIEMPOS DE LIBERACIÓN DE LA VÍA PARA EVITAR EL TRAFICO DE LOS VEHÍCULOS A LA HORA DEL PASE, NO SE ESTA LLEVANDO UN BUEN CONTROL CON LOS TIEMPOS LIBERADOS.



PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-07-2019

Actividades:

PROGRESIVA KM 39 + 425

CDescripcion_____:

SE CONTINUA CON EL MEJORAMIENTO DE LA SUB BASE CON MATERIAL EXTRAÍDO DE LA CANTERA KM 33 + 600 Y COMPACTADO POR CAPAS CADA 0.25 M CON EQUIPO RODILLO VIBRADOR

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

01-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-07-2019

Actividades:
PROGRESIVA KM 36 + 120

CDescripcion_____:
SE OBSERVA QUE LOS EQUIPOS MAQUINARIAS EXCAVADORAS ESTÁN DETENIDOS, LA SUB SUB CONTRATISTA EMPRESA CIALSA QUE PERTENECE A CR20, NO REALIZO TRABAJOS EN ESTE PUNTO

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
01-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-07-2019

Actividades:
PROGRESIVA KM 52 + 400

CDescripcion _____:
DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE (DME-A), ACOPIO Y EXTENDIDO DE MATERIAL EXCEDENTE SOBRE LA PLATAFORMA CON APOYO DE EQUIPO MAQUINA TRACTOR ORUGA

3

Foto1:

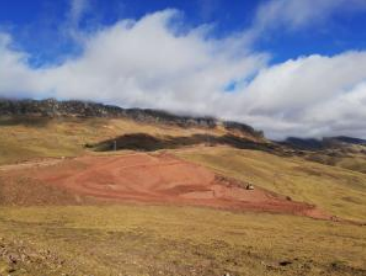


Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
01-07-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-07-2019

Actividades:

PROGRESIVA KM 51 + 850

CDescripcion_____:

PARO DE POBLADORES EN PUNTO UNIÓN, CERRARON LA VÍA EN EL
TRANCURSO DE LA MAÑANA SOLICITANDO QUE LES DEN TRABAJOS A LOS
POBLADORES DE LA ZONA

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

01-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-07-2019

Actividades:
PROGRESIVA KM 43 + 100

CDescripcion _____:

POR PARTE DE LA SUB CONTRATISTA EMPRESA CARRANZA QUE PERTENECE A CR20, LOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN DETENIDOS POR FALTA DE VOLQUETES QUE NO SE ENCUENTRAS EN OBRA DEBIDO A QUE VIENE REALIZANDO SU MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
01-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-07-2019

Actividades:
PROGRESIVA KM 34 + 200

CDescripcion_____:

POR PARTE DE LA SUB CONTRATISTA EMPRESA CIALSA QUE PERTENECE A CR20, LOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN DETENIDOS POR FALTA DE OPERADORES QUE NO SE ENCUENTRAN EN OBRA DEBIDO A QUE TIENEN PROBLEMAS DE PAGO, (SUB CONTRATISTA A SUS TRABAJADORES)

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
01-07-2019

6



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-07-2019

Actividades:
PROGRESIVA KM 33 + 600

CDescripcion_____:
SE CONTINUA CON EL ACOPIO Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE LA CANTERA QUE ES USADO PARA LOS MEJORAMIENTOS DE LA SUB BASE DE LA VÍA - TALUD N. 04

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
01-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-07-2019

Actividades:
PROGRESIVA KM 27 + 320

CDescripcion_____:
EQUIPO MAQUINARIA TRACTOR ORUGA, ESTA DETENIDO DEBIDO A QUE EL PERÍMETRO DEL ÁREA DE TRABAJO DEL DEL DME COLAPSO POR LA SOBRECARGA DEL MATERIAL EXCEDENTE.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
01-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-07-2019

Actividades:
PROGRESIVA KM 24 + 600

CDescripcion_____:

SE CONTINÚA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, PERFILADO DE TALUD, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA CON EQUIPO MAQUINARIA EXCAVADORA Y CAMIÓN VOLQUETE PARA LA ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE A LOS DME's

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
01-07-2019

9



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-07-2019

Actividades:

PROGRESIVA KM 24 + 500

CDescripcion_____:

SE CONTINÚA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, PERFILADO DE TALUD, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA CON EQUIPO MAQUINARIA EXCAVADORA Y CAMIÓN VOLQUETE PARA LA ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE A LOS DME's

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

01-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-07-2019

Actividades:
PROGRESIVA KM 19 + 200

CDescripcion_____:
DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE (DME-A), ACOPIO Y EXTENDIDO DE MATERIAL EXCEDENTE SOBRE LA PLATAFORMA CON APOYO DE TENDIDO DEL MATERIAL CON EQUIPO MAQUINA CARGADOR FRONTAL Y CONFORMACIÓN DE BERMAS DE SEGURIDAD CON APOYO DE MAQUINARIA EXCAVADORA



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
01-07-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-07-2019

Actividades:

PROGRESIVA KM 19 + 200

CDescripcion_____:

DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE (DME-A), ACOPIO Y EXTENDIDO DE MATERIAL EXCEDENTE SOBRE LA PLATAFORMA CON APOYO DE TENDIDO DEL MATERIAL CON EQUIPO MAQUINA CARGADOR FRONTAL Y CONFORMACIÓN DE BERMAS DE SEGURIDAD CON APOYO DE MAQUINARIA EXCAVADORA

12

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

02-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-07-2019

Actividades:

PROGRESIVA KM 19 + 200

CDescripcion_____:

DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE (DME-A), ACOPIO Y EXTENDIDO DE MATERIAL EXCEDENTE SOBRE LA PLATAFORMA CON APOYO DE TENDIDO DEL MATERIAL CON EQUIPO MAQUINA CARGADOR FRONTAL Y CONFORMACIÓN DE BERMAS DE SEGURIDAD CON APOYO DE MAQUINARIA EXCAVADORA

13

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

02-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado:
MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
01-07-2019

Actividades:
PROGRESIVA KM 15 + 400

CDescripcion_____:

SE CONTINÚA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, PERFILADO DE TALUD, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA CON EQUIPO MAQUINARIA EXCAVADORA Y CAMIÓN VOLQUETE PARA LA ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE A LOS DME's

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

15

Personal Encargado:
MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
01-07-2019

Actividades:
KM 12 + 000

CDescripcion_____:

CAMPAMENTO

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-07-2019



Fotos:
