

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe: Informe N° 33	Fecha Informe: 04-07-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
--------------------	-------------------------------	------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Perfilado de Talud - Voladura - Eliminación de Material d Recuperación

Conclusiones:

Se continua con los trabajos en voladura, perfilado de talud.
Se elimina el material de recuperación del material colapsado en el DME N° 15.
Los volquetes están siendo sobrecargados.
No se tiene cuaderno de obra al día.

Recomendaciones:

Se recomienda a la entidad aprobar los nuevos DMEs.
se recomienda al contratista y supervisión tener el cuaderno de obra.
Se recomienda al contratista usar las mallas para evitar caídas del material trasladado.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-07-2019

Actividades:
 Perfilado de Talud

CDescripcion_____:

1

(Km 191+040) Vista fotográfica en la que se aprecia los trabajos realizados en perfilado de talud, trabajo realizado con una excavadora.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 04-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-07-2019

Actividades:
 Voladura

CDescripcion_____:

2

(Km 190+300 al 190+335) Se continúa con los trabajos en voladura, para lo cual se ha tomado las medida de seguridad y evacuación a una distancia mínima de 500 metros a la redonda, la voladura se di a las 1:00pm.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 04-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-07-2019

Actividades:
Voladura

CDescripcion_____:

(Km 182+180 al 182+290) Se continúa con los trabajos en voladura, para lo cual se ha tomado las medida de seguridad y evacuación a una distancia mínima de 500 metros a la redonda, la voladura se dio a las 3:00pm.

3

Foto1:

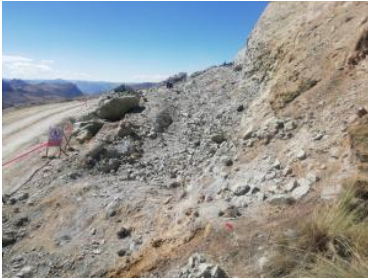


Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
04-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-07-2019

Actividades:
Eliminación de Material d Recuperación

CDescripcion_____:

Km 183+450) Vistas fotográficas en la que se puede apreciar los trabajos de recuperación del material colapsado y trasladado al DME N° 10

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
04-07-2019
