

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 148	Fecha Informe: 15-07-2019	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave- Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
-------------------------------------	----------------------------	------------------------------	---	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

REPORTE DEL 15 DE JULIO DEL 2019

Conclusiones:

EL AVANCE ES NORMAL, CON EL CONTRATIEMPO DE LA VARIANTE PASPA EL RETRASO QUE GENERA LA FAMILIA CRUZ CARRILLO AL Oponerse NO DEJAR INTERVENIR EN MAS DE 700 M QUE SON TERRENOS DE SU PROPIEDAD, SOLO QUEDA EXPROPIAR. EL CONTRATISTA TIENE IMPEDIMENTO DE TRABAJAR LIBREMENTE DESDE EL KM 0+000 HASTA EL KM 4+600 POR LAS INTERFERENCIAS ELÉCTRICAS, SE TIENE EXPEDIENTE APROBADO POR ELECTRO PUNO Y QUE ESTÁN EN MANOS DE LA OFICINA DE DERECHO DE VÍA PARA SU TRAMITE Y FINANCIAMIENTO DE RE UBICACIÓN DE POSTES. EL OTRO INCONVENIENTE QUE SE TIENE ES EL DEL PUENTE CONDURIRI QUE DEBIÓ INICIARSE EL 27 DE JUNIO SEGÚN EL CAO, PERO POR RAZONES DE ERROR DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CON LA TOPOGRAFÍA, DEBERÁ REALIZARSE UN ADICIONAL PARA SU EJECUCIÓN, POR LO QUE DEMANDARA MAS TIEMPO PARA INICIAR LOS TRABAJOS.

Recomendaciones:

ACELERAR LOS TRABAJOS YA QUE SE TIENE RETRASOS POR MOTIVOS DIVERSOS.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-07-2019

Actividades:
 Corona

CDescripcion_____:
 Primera capa de corona de terraplén acarreo para la progresiva km 24+400

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 15-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-07-2019

Actividades:
 Sub drenes cono de arena

CDescripcion_____:
 Densidad de campo a la compactación de zanjas de sub drenes ubicado en la progresiva km 37+350

2


Foto1:



Foto2:



Foto3:

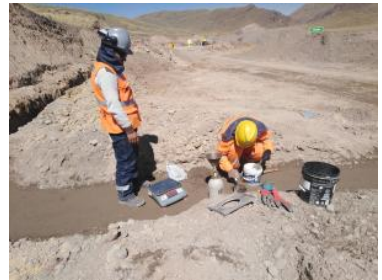

Fecha Toma De Datos:
 15-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 15-07-2019

Actividades:
Cuneta Tipo I

CDescripcion_____:
Encofrado y vaceado de cunetas tipo I ubicado en la progresiva km 8+470

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-07-2019
