

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 156	Fecha Informe: 24-07-2019	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
-----------------------	------------------	---------------------------	---	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

REPORTE DEL 24 DE JULIO DEL 2019

Conclusiones:

SE LLEVO LA REUNIÓN CONVOCADA POR EL COMITÉ MULTISECTORIAL DE VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA CHECCA MAZOCRUZ DEL DISTRITO DE ILAVE. SE DESARROLLO LOS PUNTOS DE LA AGENDA PARA EL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN.

SE TUVO LA PARTICIPACIÓN DEL ALCALDE DE LA PROVINCIA EL COLLAO MARIO HUANCA FLORES, LOS DOS CONSEJEROS POR EL COLLAO DEL GOBIERNO REGIONAL, ALCALDES MENORES Y OTRAS AUTORIDADES, ADEMÁS DE LOS ING. Y REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN Y FINALMENTE EL REPRESENTANTE DE PACRI DE PROVIAS NACIONAL EL ABOGADO RUSSEL MAMANI.

Recomendaciones:

DE TODO LO ACORDADO EN LA REUNIÓN SE RESUME QUE RESALTO LOS PUNTOS MAS NEURALGICOS DE CARÁCTER SOCIAL Y ECONÓMICO COMO SON: LA ROTACIÓN DE PERSONAL DE OBRA ENTRE PEONES, VIGÍAS, OFICIALES Y OPERARIOS ASÍ COMO LOS AUXILIARES DE LA SUPERVISIÓN, ADEMÁS DEMANDAN QUE EN MAQUINARIA PESADA Y CAMIONETAS O UNIDADES MENORES SE EVALUÉ DE QUIENES SON ESTOS EQUIPOS PARA LUEGO MEDIANTE EL COMITÉ INGRESEN OTRAS MAQUINARIAS (PARA ESTO SE TENDRÁ REUNIONES PROGRAMADAS EN LO POSTERIOR CON EL CONTRATISTA Y LOS DIRIGENTES).

FINALMENTE INDICARON QUE EL COMITÉ INFORMARA A TODO EL PLENO DE LOS AVANCES DEL ACUERDO EL DÍA 19 DE AGOSTO Y POSIBLEMENTE SE LLEVARA OTRA REUNIÓN CON EL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN EL DÍA 21 DE AGOSTO.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-07-2019

Actividades:
Puente Ilinqui (L=36.30 M KM 33+760)

CDescripcion_____:
Desmontaje de la plataforma o camión trailer de falso puente
Verificación de parte del Ing. Luis Cabrera del Campo Esp en Puentes de la Supervisión HOB Consultores

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-07-2019

Actividades:
Planta de asfalto

CDescripcion_____:
Llegada de parte de la planta de asfalto

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-07-2019

Actividades:
 Sub base granular

CDescripcion_____:
 Extendido y compactado de material para sub base ubicado en la progresiva km 24+830

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-07-2019

Actividades:
 Sub base

CDescripcion_____:
 Extendido, riego y compactado de material para sub base granular ubicado en la progresiva km 23+590

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-07-2019

Actividades:
 Sub base

CDescripcion_____:

Conformación de material seleccionado para sub base ubicado en la progresiva km 20+700

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-07-2019

Actividades:
 Base granular y viga benkelman

CDescripcion_____:

Control de calidad entre el tramo km 19+460 hasta el km 20+210 cumple con los parámetros de la viga para base

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-07-2019

Actividades:
Base subsanacion

CDescripcion_____:
perfilado de zona sub sanada para su conformación ubicado en la progresiva km 16+400

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-07-2019

Actividades:
Cuneta tipo I

CDescripcion_____:
Encofrado de cerchas para vaceado de paños de cunetas ubicado en la progresiva km 8+820

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-07-2019

Actividades:
 Vaceado de cunetas

CDescripcion_____:

Tramo de vaceado aprobado por la supervisión entre las progresivas km 7+600 hasta el km 7+805 LI, rendimiento 12 paños por tanda de camión mixer de 08 m3 de concreto

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-07-2019

Actividades:
 Drenaje

CDescripcion_____:

Limpieza y desencofrado en alcantarilla ubicada en la progresiva km 3+169

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-07-2019

Actividades:
Conformación de terraplén

CDescripcion_____:
ubicado en la progresiva km 2+920

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-07-2019

Actividades:

Movimiento de tierras

CDescripcion_____:

Corte en material suelto ubicado en la progresiva km 1+200 lado izquierdo
En la fotografía se aprecia una señora sentada en oposición a los trabajos por afectación a su terreno
a su vez se aprecia las interferencias eléctricas muy cerca a la maquinaria en lo que respecta a los cables.

12

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-07-2019

Actividades:
Reunión convocada entre el Comité Multi Sectorial de Vigilancia y Fiscalización de la Carretera entre el Contratista y la Supervisión
Llevada en la Municipalidad de Checca Mazocruz desde 10:30 am hasta 5:00 pm

13

CDescripcion _____:
Se trataron los puntos de la agenda, que para el Contratista y la Supervisión fueron diferentes.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 24-07-2019

Actividades:
 Reunión con el Comité Multisectorial de seguimiento y vigilancia de la carretera

CDescripcion:
 Asistieron el Alcalde de la Provincia el Collao Ilave, Alcaldes menores, los dos consejeros de la provincia el Collao, tenientes e ing. del COntratista y la Supervisión Se adjunta en las fotografías los puntos a tratar de la agenda que son diferentes para la Supervisión y el Contratista

14

Foto1:



Foto2:


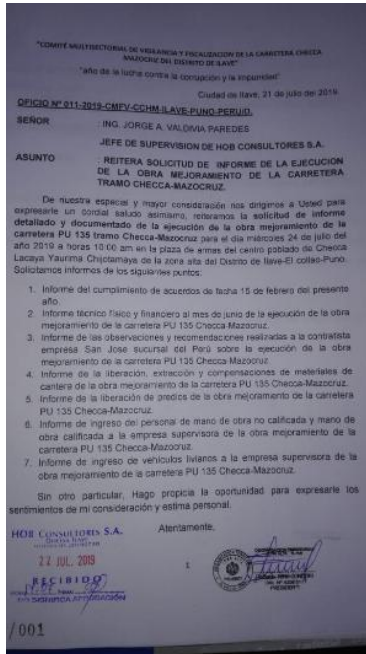


Foto3:

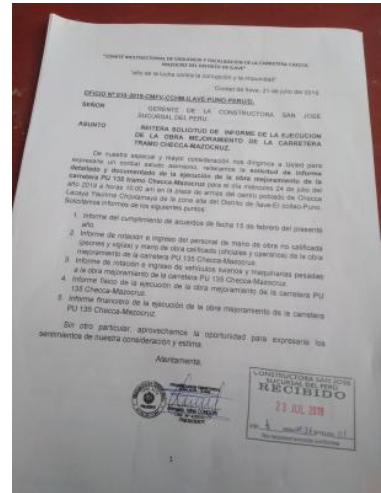

Fecha Toma De Datos:
 24-07-2019
