

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	38	06-08-2019	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Reporte del día, correspondiente al día martes 06 de agosto del 2019

Conclusiones:

El recorrido el día de hoy, se inicio en el km 68+000 hacia el km 153+570, las partidas mas importantes en el primer frente son: el asfaltado de una capa, construcción de alcantarillas, la construcción de las cunetas laterales y la conformación de las estructura del pavimento en tres frentes, así mismo Prosigue El Segundo frente en ritmo muy lento, las actividades mas resaltantes son la construcción del puente San Genaro, conformación de la estructura del pavimento capas: sub base y base, conformada en dos frentes, son pocos frentes y el avance de obra se encuentra en un bajo rendimiento

Recomendaciones:

Con referencia al avance obra se sugiere que los dos frentes de las dos empresas retomen sus actividades e incrementen mas frentes de trabajo

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-08-2019

Actividades:
Actividad, Armado de TMC Ø 36", Alcantarilla

CDescripcion_____:
Ubicación de la alcantarilla km 75+000

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
06-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-08-2019

Actividades:
Partida compactado de relleno en la alcantarilla

CDescripcion_____:
Ubicación de la alcantarilla km 76+500

2

Foto1:



Foto2:

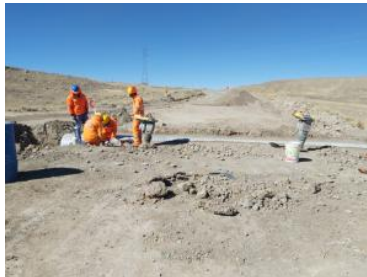


Foto3:

Fecha Toma De Datos:
06-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-08-2019

Actividades:
Partida compactado de relleno en la alcantarilla

CDescripcion_____:
Ubicación de la alcantarilla km 76+770.60

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
06-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-08-2019

Actividades:
Partida, encofrado de cabezal en la alcantarilla, muro de contención

CDescripcion_____:
Ubicación de la alcantarilla km 81+705

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
06-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-08-2019

Actividades:
Partida, mejoramiento de la sub rasante

CDescripcion_____:
Tramo del km 83+440 al km 83+630

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
06-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-08-2019

Actividades:
Partida construcción de cuentas laterales

CDescripcion_____:
En el tramo del km 84+840 al km 85+160

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
06-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-08-2019

Actividades:
Partida, conformación de la base

CDescripcion_____:
En el tramo del km 86+220 al km 86+620

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
06-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-08-2019

Actividades:
Partidas, conformación de la sub base y base

CDescripcion_____:
En el tramo del km 87+280 al km 87+ 800

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
06-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-08-2019

Actividades:
 Partida, mejoramiento de la sub rasante

CDescripcion_____:
 En el tramo del km 87+800 al km 88+200

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-08-2019

Actividades:
 Partida, imprimado de la base

CDescripcion_____:
 En el tramo del km 99+600 al km 100+000

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 06-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-08-2019

Actividades:
 Partida, construcción de cunetas laterales

CDescripcion_____:
 En el tramo del km 100+580 al km 100+700

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 06-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-08-2019

Actividades:
 Partida, asfaltado, se retomaron las actividades de esta partida

CDescripcion_____:
 En el tramo del km 103+500 al km 104+060

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 06-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-08-2019

Actividades:
 Partida, construcción de cunetas laterales

CDescripcion_____:
 En el tramo del km 121+000 al km 121+280

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 06-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-08-2019

Actividades:
 Partida, conformación de la sub base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 122+470 al km 122+700

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 06-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

15

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-08-2019

Actividades:
 Partida, conformación de la sub base

CDescripcion_____:
 En el tramo del km 123+800 al km 125+150

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 06-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

16

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-08-2019

Actividades:
 Partida, conformación de la sub base

CDescripcion_____:
 En el tramo del km 134+690 al km 135+140

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

17

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN
CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-08-2019

Actividades:

Tramo, ubicación de la construcción del puente San Genaro

CDescripcion_____:

Ubicada en el tramo del km 145+050 al km 145+270

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

06-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

18

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN
CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-08-2019

Actividades:

Partida, construcción de la alcantarilla tipo MCA de 1x1

CDescripcion_____:

Ubicación de la alcantarilla en el km 136+065.85

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

06-08-2019
