




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 187	Fecha Informe: 09-09-2019	Nombre De La Obra: Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

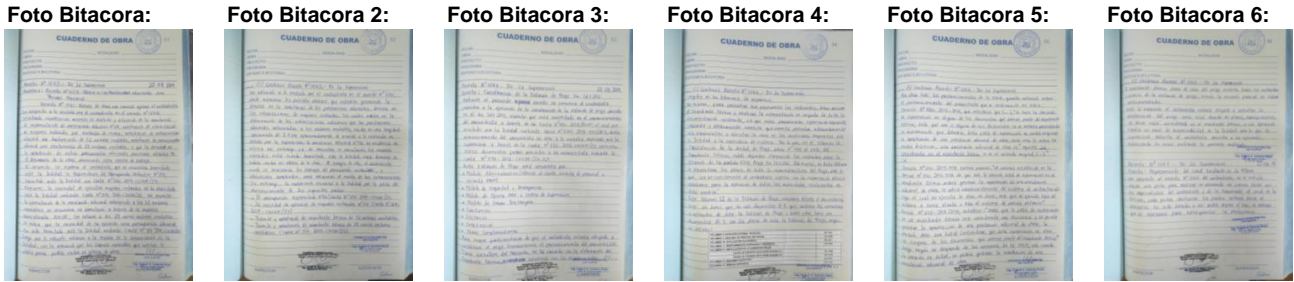

Asunto:

Visita al campamento de la Empresa Johesa, para la toma de fotografías del cuaderno de obra, Visita de seguimiento en campo de las actividades en ejecución del contrato principal y los adicionales aprobados como: mejoramientos de suelos, conformación del terraplén, construcción de bases y sub-bases, imprimación asfáltica, pavimentos de asfalto, construcción de muros de contención ,veredas,cunetas rectangulares, trapezoidales, excavación, rellenos, encofrados, transportes de material.desencofrados, transporte de material granular

Conclusiones:

La empresa Consorcio Integración Vial continua ejecutando actividades del contrato principal y los adicionales aprobados 1,2,4 y 5 donde se esta realizando la colocación de la segunda capa de asfaltado en caliente en los tramos II Y III, en las progresivas 36+000 a la 36+180 en el margen derecho de la vía del tramo II y también esta asfaltando en la progresiva 61+355 a la 61+720 en el margen izquierdo de la vía del tramo III , Tienen en actividad dos plantas de asfalto: La primera esta funcionando en la progresiva 24+000 y la segunda en la progresiva 83+250 (Punta Arenas) Además esta realizando la construcción de mandiles de concreto emboquillados de piedra, construcción de muros de contención , alcantarillas, cunetas rectangulares, cunetas trapezoidales de concreto, badén y construcción de veredas. El tiempo es soleado, con la presencia de precipitaciones ocasionales de corta duración.

Recomendaciones:

Se recomienda al Consorcio Integración vial la inclusión de mas frentes en de trabajo a fin de incrementar los rendimientos de trabajo.
Se recomienda a la Supervisión la integración de todos sus especialistas para el control de calidad y cantidad de las actividades en ejecución.
Se recomienda la pronta incorporación de una camioneta de transporte para el especialista en seguimiento en campo de PROVIAS NACIONAL, el cual se requiere para poder realizar el recorrido en todo el tramo vial , plantas de concreto y asfalto, laboratorios y en todas las zonas auxiliares.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-09-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Encofrado y excavación para construcción de veredas

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 37+560 a la 37+590 se realiza el encofrado y excavación para la construcción de veredas de concreto.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 09-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-09-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Construcción de veredas

CDescripcion_____:
 En la progresiva 37+640 a 37+700 se realiza la excavación y encofrado para la construcción de veredas de concreto en el Poblado de Nuevo San Martín.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 09-09-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-09-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Asfaltado (Preparación de liga de adherencia)

CDescripcion_____:

En la progresiva KM. 36+000 a la 36+180 se inicia la preparación de liga de adherencia para la colocación de la segunda capa de asfalto en caliente .

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

09-09-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-09-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: pavimento de asfalto (segunda capa)

CDescripcion_____:

En la progresiva 61+355 a la 61+720 se realiza la colocación de la segunda capa de pavimento de asfalto en caliente en la entrada del Poblado de Nuevo Jaén . (La empresa Málaga hermanos a puesto en funcionamiento nuevamente la Planta de Asfalto ubicado en Punta Arenas progresiva 83+250)

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

09-09-2019

4



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-09-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Construcción de muros de contención.

CDescripcion_____:
 En la progresiva 51+635 se esta construyendo muros de concreto armado y muros de concreto ciclópeo

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 09-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-09-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Compactación de asfaltado en caliente

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 61+355 a 61+730 se realiza la compactación de la segunda capa del pavimento asfáltico colocado (margen izquierdo de la vía) , en la entrada del Poblado de Nueva Jaén.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 09-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-09-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Veredas para el Colegio 0214 del Poblado de Perlamayo

CDescripcion_____:

7

En la progresiva KM. 68+260, la supervisión realiza visita de verificación donde se construirá veredas de concreto a solicitud del Colegio 0214 del Poblado de Perlamayo.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
09-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-09-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Compactación de pavimento de asfalto en caliente

CDescripcion_____:

8

En la progresiva KM. 36+000 a la 36+180 en el margen derecho de la vía se realiza la compactación de la segunda capa de asfalto colocado.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
09-09-2019
