



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	68	10-09-2019	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Reporte diario de las actividades en la obra, correspondiente a la fecha martes 10 de setiembre del 2019

Conclusiones:

En ambos tramos se prosigue con el mismo ritmo de trabajo, en el primer frente se asfalto, en el segundo frente no tubo asfaltado de la vía

Recomendaciones:

En el primer frente mejorar y ampliar frentes de trabajo, en el segundo frente ampliar los frentes de trabajo en los tramos del 130+000 al 131+330, que ya se inicio.

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:	Nivel:	Fecha De Fotografia:
J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS	No Aplica	10-09-2019

Actividades:

Conformación de la sub base

CDescripcion _____:

Tramo del km 138+120 al km 137+740

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

10-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-09-2019

Actividades:
 huelga minera ANTAPAI

CDescripcion_____:

Ubicación del movimiento evitando el movimiento de los carros hacia la carretera km 125+150

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 10-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-09-2019

Actividades:
 Construcción de cunetas laterales

CDescripcion_____:

Tramo del km 122+750 al km 122+200

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 10-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-09-2019

Actividades:
 Construcción de cunetas laterales

CDescripcion_____:
 Tramo del km 121+430 al km 121+260

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-09-2019

Actividades:
 Re-conformación de la base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 153+560 al km 152+980

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-09-2019

Actividades:
 Tramo, ubicado la construcción del puente San Genaro

CDescripcion_____:
 Del km 145+050 al km 145+270

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-09-2019

Actividades:
 Partida, conformación de la sub rasante

CDescripcion_____:
 Tramo del km 137+600 al km 137 +480

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-09-2019

Actividades:

Ampliación de vía, mejoramiento de la sub rasante, trasporte de materia de relleno para sub rasante

CDescripcion_____:

8 Tramo del km 135+930 al km 136+040

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
10-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-09-2019

Actividades:

Partida, asfaltado segunda capa

CDescripcion_____:

9 Tramo del km 101+310 al km 101+740

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

10

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-09-2019

Actividades:
 Construcción de cunetas laterales

CDescripcion_____:
 Tramo del km 99+960 al km 99+680

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-09-2019

Actividades:
 Partida, conformación de la base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 99+300 al km 99+040

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-09-2019

Actividades:
 Partida, compactado de la base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 99+040 al km 98+800

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-09-2019

Actividades:
 Partida, relleno y compactado de la alcantarilla tipo Marco de 1 x 1

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 98+288

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-09-2019

Actividades:
 Partida, excavación de sanja para sub drenes

CDescripcion_____:
 Tramo del km 92+100 al km 92+050

Foto1:

Foto2:

Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

15

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-09-2019

Actividades:
 Partida, excavación de sanja para los sub drenes

CDescripcion_____:
 Tramo del km 92+500 al km 92+001

Foto1:

Foto2:

Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

16

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-09-2019


Actividades:
 Partida, armado de acero de la alcantarilla tipo MCA de 1.50 x 1.00

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 82+320

Foto1:

Foto2:

Foto3:

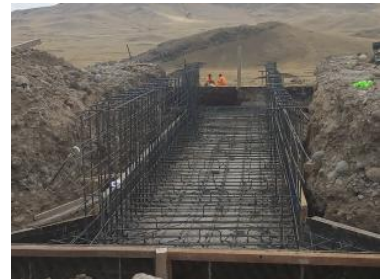

Fecha Toma De Datos:
 10-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

17

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-09-2019

Actividades:
 Partida, compactado del solado de alcantarilla tipo MCA de 1x1

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 81+945

Foto1:

Foto2:

Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

18

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-09-2019

Actividades:
 Partida, mejoramiento de la sub rasante y construcción de banquetta

CDescripcion_____:
 Tramo del km 81+350 al km 81+150

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

19

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-09-2019

Actividades:
 Cantera, extracción de material para relleno

CDescripcion_____:
 Ubicación de la cantera km 79+820

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-09-2019
