



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 04	<b>Fecha Informe:</b> 19-09-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 19/09/019

**Conclusiones:**

SE CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 05 FRENTE: KM. 75+360, 88+900, 101+120. 103+570 y 134+800.  
UTILIZANDO LOS DME KM 80+900, 84+100, 90+700 y 125+200.

**Recomendaciones:**

AGILIZAR LA REUBICACION DE POSTES DE ALUMBRADO ELÉCTRICO, PAGOS A LOS AFECTADOS DE SUS PREDIOS y NUEVAS FUENTES DE AGUA.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

1

**Personal Encargado:**  
Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**  
Moderado

**Fecha De Fotografia:**  
19-09-2019

**Actividades:**  
PERFORACIÓN KM 75+000

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
EQUIPOS:  
01 COMPRESORA

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
19-09-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

2

**Personal Encargado:**  
Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**  
Moderado

**Fecha De Fotografia:**  
19-09-2019

**Actividades:**  
MOVIMIENTO DE TIERRAS km. 75+360

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
EQUIPOS  
01 EXCAVADORA  
05 VOLQUETES

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
19-09-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 19-09-2019

**Actividades:**  
DME km 80+900

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**


**EQUIPOS:**  
01 TRACTOR

3

**Foto1:**



**Foto2:**

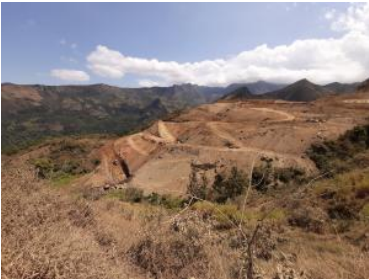

**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
19-09-2019



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy  
Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

19-09-2019

**Actividades:**

DME Km. 84+100  
CONSTRUCCIÓN DE CONTRAFUERTE

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

**EQUIPOS:**  
01 EXCAVADORA  
01 TRACTOR

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

19-09-2019
