



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 61	<b>Fecha Informe:</b> 06-12-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---

**Foto Bitacora:**



**Foto Bitacora 2:**

**Foto Bitacora 3:**

**Foto Bitacora 4:**

**Foto Bitacora 5:**

**Foto Bitacora 6:**

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 06/12/19

**Conclusiones:**

SE CONTINÚAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACIÓN EN LOS KM. 112+660, 109+700, 101+300, 95+280, 83+800, 81+950 y 72+500.  
UTILIZANDO LOS DME DE LOS KM. 111+100, 93+850, 90+700, 84+100, 80+900 y 75+200.  
PERFORACIÓN EN LOS KM. 104+060, 98+680 y 95+200.

**Recomendaciones:**

AGILIZAR LOS TRAMITES DE LOS NUEVOS DME, INTERFERENCIAS SANITARIAS Y LAS NUEVAS AFECTACIONES.

### PANEL FOTOGRAFICO




**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Crítico  
**Fecha De Fotografia:** 06-12-2019

**Actividades:**  
DME km 80+900

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Equipos  
01 Tractor  
01 Excavadora

1

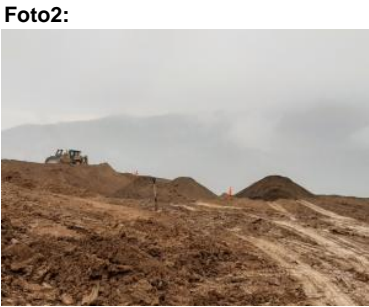

**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
06-12-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 06-12-2019

**Actividades:**  
Movimiento de Tierras  
km 72+500

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Equipos  
02 Excavadoras  
14 Volquetes

2



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
06-12-2019
