

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	07	10-12-2019	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	ROMMEL CHANCA RAMIREZ

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Informe N° 07

Conclusiones:

Se observo que realizaron diferentes actividades como: mejoramiento, perfilado y compactado de subrasante en diferentes tramos, conformación de subbase en diferentes tramos, encofrado y armado de acero de la losa de puente San Genaro.
No se lleno el cuaderno de obra del día.

Recomendaciones:

El personal obrero siguen obstaculizando los trabajos en el tramo Negromayo - Tintaya.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-12-2019

Actividades:
Encofrado y armado de acero en puente San Genaro

CDescripcion_____:
Se observo el encofrado y armado de acero puente San Genaro, progresiva 145+075 hasta 145+194 en el tramo Yauri - San Genaro.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-12-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-12-2019

Actividades:

Encofrado y vaciado de cuneta.

CDescripcion_____:

Se observo el encofrado y vaciado de concreto de la cuneta, progresiva 132+600 hasta 132+900 en el tramo Tintaya - Yauri.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

10-12-2019

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-12-2019

Actividades:
Excavación, colocado de Geotextil y relleno material de filtro en el subdren.

CDescripcion_____:
Se observo la excavación, la colocación de geotextil y el relleno con material de filtro en el subdren lado izquierdo, progresiva 131+700 hasta 131+900 en el tramo Tintaya - Yauri.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-12-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-12-2019

Actividades:
Perfilado y compactado de subrasante, colocación de subbase primera capa

CDescripcion_____:
Se observo el perfilado y compactado de subrasante, colocación de subbase primera capa, progresiva 130+710 hasta 130+860 en el tramo Tintaya - Yauri.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-12-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-12-2019

Actividades:

Conformación de subbase primera capa

CDescripcion_____:

Se observa conformación de subbase primera capa, progresiva 129+840 hasta 129+980 en el tramo Tintaya - Yauri.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-12-2019

5



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-12-2019

Actividades:

Perfilado y compactado de subsante.

CDescripcion_____:

Se observo el perfilado y compactado de subrasante, progresiva 128+920 - 129+020 en el tramo Tintaya - Yauri.


Foto1:



Foto2:



Foto3:

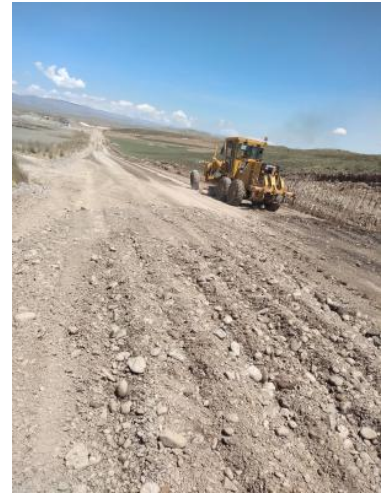

Fecha Toma De Datos:

10-12-2019

6



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-12-2019

Actividades:
Mejoramiento de subrasante.

CDescripcion_____:
Se observa mejoramiento de subrasante de calzada izquierda, progresiva 128+170 hasta 128+252 en el tramo Tintaya - Yauri

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-12-2019

7



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-12-2019

Actividades:
No se realizan actividades en el tramo Negromayo - Tintaya

CDescripcion_____:
Se observo en el recorrido que el personal obrero no deja realizar ninguna actividad en el tramo Negromayo - Tintaya.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-12-2019
