




# BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

## REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

**Confirma Bitacora:** **Nro Informe:** **Fecha Informe:** **Nombre De La Obra:** **Personal Encargado:**  
22 11-12-2019 Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco LUCIO ISAIAS ANAMARIA RUIZ

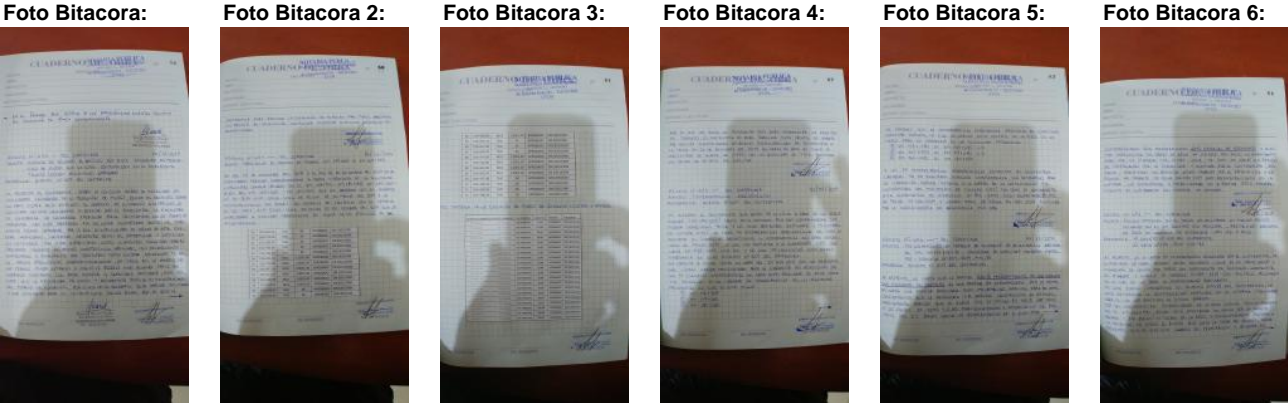

**Asunto:**  
Anotaciones en el cuaderno de obra

**Conclusiones:**  
Respuestas de la supervisión a consultas del contratista respecto a afectación de dos postes de alta tensión, participación del personal de PVN y el INC respecto a las zonas arqueológicas, consulta respecto a construcción de una calzada en muro de contención, entre las mas importantes.

**Recomendaciones:**  
Para conocimiento del Administrador de Contrato y los funcionarios de la entidad.

## PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** LUCIO ISAIAS ANAMARIA RUIZ  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 11-12-2019

**Actividades:**  
Corte y perfilado del talud para ampliación de la plataforma

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Excavadora realiza trabajos de Corte y perfilado del talud km. 174+980 para ampliar la plataforma

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
11-12-2019

1



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

LUCIO ISAIAS ANAMARIA RUIZ

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

11-12-2019

**Actividades:**

Trabajos de encofrado de una alcantarilla tipo marco

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Personal realiza trabajos de encofrado de alcantarilla en el km.160+642, el vaciado esta programado para el día siguiente.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

11-12-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** LUCIO ISAIAS ANAMARIA RUIZ  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 11-12-2019

**Actividades:**  
Estado de losa de concreto construido, actualmente en proceso de curado

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Una nueva losa de concreto construido en el km. 158+230 se encuentra en proceso de curado y cubierto con mantas, la longitud aproximada es de 180 m. (2 sectores)

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
11-12-2019
