

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e: 09	Fecha Informe: 12-12-2019	Nombre De La Obra: Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo- Yauri-San Genaro	Personal Encargado: R O M M E L C H A N C A RAMIREZ
-------------------------------	---------------------------	------------------------------	---	--

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Asunto:

Informe N° 09

Conclusiones:

Se observo durante el recorrido los diferentes actividades como: armado de acero en puente San Genaro, encofrado y vaciado de concreto en la cuneta, mejoramiento de subrasante, conformación de subbase, excavación de subdren y encofrado de muro en el tramo Tintaya - Yauri - San Genaro.

En el tramo Negromayo - Tintaya, el personal obrero no dejo laborar.
No se llenó el cuaderno de obra del día.

Recomendaciones:

La empresa contratista debe solucionar los pagos al personal obrero para continuar con los trabajos en el tramo Negromayo - Tintaya.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-12-2019

Actividades:

Encofrado y vaciado de concreto en la cuneta.

CDescripcion_____:

Se observó encofrado y vaciado de concreto en la cuneta lado derecho, progresiva 132+600 hasta 132+900 en el tramo Tintaya - Yauri.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-12-2019

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-12-2019

Actividades:
Colocación y armado de acero en la losa del puente San Genaro.

CDescripcion_____:
Se observó la colocación y armado de acero en la losa del puente San Genaro, progresiva 145+075 hasta 145+194 en el tramo Yauri - San Genaro.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-12-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-12-2019

Actividades:
Planta de concreto en puente Santa María.

CDescripcion_____:
Se observó la preparación de concreto para la cuneta en planta de concreto Puente Santa María.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-12-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-12-2019

Actividades:
Conformación y compactado de subbase.

CDescripcion_____:
Se observó conformación y compactado de subbase primera capa, progresiva 129+380 hasta 129+ 600 en el tramo Tintaya - Yauri.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-12-2019

4



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-12-2019

Actividades:
Colocado de material de subbase primera capa.

CDescripcion_____:
Se observó colocado de material de subbase primera capa, progresiva 128+810 hasta 129+250 en el tramo Tintaya - Yauri.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-12-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-12-2019

Actividades:
Colocación de carpeta asfáltica.

CDescripcion_____:
Se observó la colocación de carpeta asfáltica, progresiva 122+700 hasta 123+295 en el tramo Tintaya - Yauri.


Foto1:



Foto2:



Foto3:

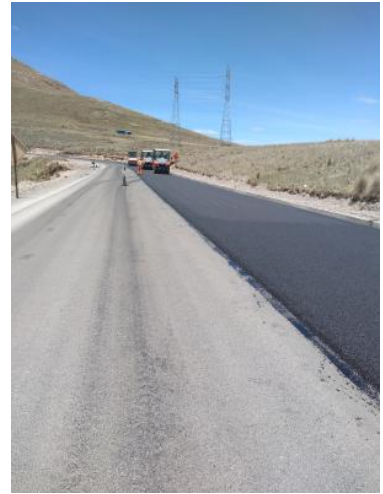

Fecha Toma De Datos:
12-12-2019

6



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-12-2019

Actividades:

Excavación y colocación de geotextil en el subdren

CDescripcion_____:

Se observó la excavación y colocación de geotextil en el subdren lado izquierdo, progresiva 131+480 hasta 131+680 en el tramo Tintaya - Yauri.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-12-2019

7



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-12-2019

Actividades:

Encofrado de muro .

CDescripcion_____:

Se observó el encofrado del muro, progresiva 128+248 en el tramo Tintaya - Yauri.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-12-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-12-2019

Actividades:

Mejoramiento de subrasante.

CDescripcion_____:

Se observó el mejoramiento del subrasante de calzada izquierda, progresiva 128+120 hasta 128+150 en el tramo Tintaya - Yauri.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-12-2019

9



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-12-2019

Actividades:
Excavación y mejoramiento de subrasante.

CDescripcion_____:
Se observó la excavación y mejoramiento de subrasante de calzada izquierda, progresiva 127+890 hasta 127+970 en el tramo Tintaya - Yauri.

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-12-2019
