

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b>	<b>Nro Informe:</b>	<b>Fecha Informe:</b>	<b>Nombre De La Obra:</b>	<b>Personal Encargado:</b>
	11	14-12-2019	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	R O M M E L C H A N C A RAMIREZ

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**      **Foto Bitacora 6:**

**Asunto:**

Informe N° 11

**Conclusiones:**

En el tramo I Negromayo - Tintaya se observo la actividad de limpieza y reimprimado.  
En el tramo II Tintaya - Yauri - San Genaro se observo las actividades como: Vaciado de concreto en la losa del puente San Genaro, excavación y encofrado de la cuneta, perfilado de talud, conformación de subbase segundo nivel y colocación de carpeta asfáltica.  
No se tubo acceso al cuaderno de obra el día de hoy.

**Recomendaciones:**

En el tramo I Negromayo - Tintaya, la empresa contratista de debe reprogramar varios frentes de trabajo para evitar caer en atrasos.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** ROMMEL CHANCA RAMIREZ  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 14-12-2019

**Actividades:**  
Colocación de carpeta asfáltica.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Se observó la colocación de carpeta asfáltica, progresiva 123+685 hasta 123+ 985 en el tramo Tintaya - Yauri.

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
14-12-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

ROMMEL CHANCA RAMIREZ

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

14-12-2019

**Actividades:**

Excavación y perfilado de talud lado derecho

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Se observó la excavación y perfilado de talud lado derecho, progresiva 127+870 hasta 127+970 en el tramo Tintaya - Yauri.


**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

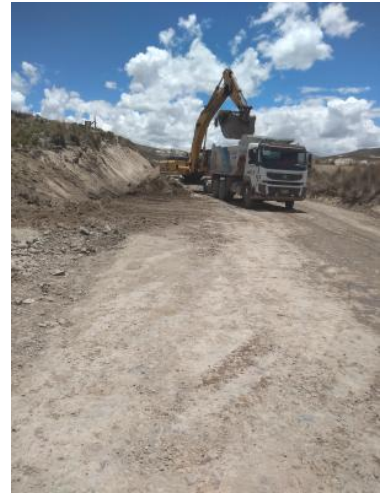

**Fecha Toma De Datos:**

14-12-2019

2



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

ROMMEL CHANCA RAMIREZ

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

14-12-2019

**Actividades:**

Excavación y encofrado de cunetas lado derecho.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Se observó la excavación lado derecho de la cuneta, progresiva 132+170 hasta 132+240. Encofrado de la cuneta lado derecho, programa 132+ 240 hasta 132+390 en el tramo Tintaya - Yauri.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

14-12-2019

3



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

ROMMEL CHANCA  
RAMIREZ

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

14-12-2019

**Actividades:**

Limpieza y reimprimación de calzada izquierda de la vía.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Se observó la limpieza y reimprimación de calzada izquierda de la vía, progresiva 89+960 hasta 90+320 del tramo I Negromayo - Tintaya.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

14-12-2019

4



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** ROMMEL CHANCA RAMIREZ  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 14-12-2019

**Actividades:**  
Conformación de subbase segunda capa

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Se observó la conformación de subbase segunda capa, progresiva 128+500 hasta 128+600 en el tramo Tintaya - Yauri.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
14-12-2019

5



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** ROMMEL CHANCA RAMIREZ  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 14-12-2019

**Actividades:**  
Excavación y colocado de geotextil para subdren.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Se observó la excavación y colocado de geotextil para subdren lado izquierdo, progresiva 132+400 hasta 131+480 en el tramo Tintaya - Yauri.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
14-12-2019

6



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

ROMMEL CHANCA RAMIREZ

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

14-12-2019

**Actividades:**

Vaciado de concreto de la losa del puente San Genaro.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Se observó el vaciado de concreto de la losa del puente San Genaro, progresiva 145+105.49 hasta 145+134.69 en el tramo Yauri - San Genaro.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

14-12-2019

7
