

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 248	Fecha Informe: 11-12-2019	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

REPORTE DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2019

Conclusiones:

CONTINUA LA PARALIZACIÓN DE LA OBRA POR LA MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA EMITIDA POR EL QUINTO JUZGADO CIVIL DE LIMA A FAVOR DEL CONSORCIO MAYO SAC.

Recomendaciones:

LAS ACTIVIDADES QUE ESTA DESARROLLANDO EL CONTRATISTA SON MEDIDAS PARA DEJAR LA VIA TRANSITABLE Y LOS PUENTES FUERA DE PELIGRO POR LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, QUE SE AVECINAN. SED RECOMIENDA QUE LA SUPERVISIÓN VERIFIQUE Y EVALÚE ESTOS TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES SI REALMENTE CUMPLIRÁN SU OBJETIVO,

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-12-2019

Actividades:
INICIO DEL TRAMO CHECCA MAZOCRUZ

CDescripcion _____ :
KM 00+000 EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA CONTINUA PARALIZADO POR UNA MEDIDA CAUTELAR EMITIDO POR UN JUZGADO DE LIMA

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
14-12-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-12-2019

Actividades:
INTERFERENCIAS ELÉCTRICAS

CDescripcion _____ :
EN LA PROGRESIVA KM 0 +317 SE APRECIA QUE AUN NO SE HAN REUBICADO LOS POSTES POR EL CONTRATISTA ELECTRO CONSTRUCCIONES LEÓN SAC

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
14-12-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-12-2019

Actividades:
INTERFERENCIAS ELÉCTRICAS

CDescripcion_____:
PROGRESIVA KM 3+440 ESTÁN EXCAVANDO PARA EL COLOCADO DE POSTES DE CONCRETO, EL ENCARGADO NOS INDICA QUE SE TIENE EN ESTE SECTOR PARA REUBICAR TRES POSTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
14-12-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-12-2019

Actividades:

PUENTE LLINQUI
L=36.30M KM 33+760

CDescripcion_____:

RETIRO TOTAL DE LOS ELEMENTOS METÁLICOS DEL FALSO PUENTE Y
LIMPIEZA DE CAUCE

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

14-12-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-12-2019

Actividades:

SEÑALES DE TRANSITO

CDescripcion_____:

EN MEDIDAS DE SEGURIDAD EN ESTOS DÍAS DE PARALIZACIÓN DE OBRA SE HAN ESTÁ PERDIENDO A LO LARGO DE TODO EL TRAMO CHECCA MAZOCRUZ LAS SEÑALES DE TRANSITO.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

14-12-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-12-2019

Actividades:
 PUENTE UNTAVE
 L=90.00M KM 40+050

CDescripcion:
 ENCAUZAMIENTO DEL RÍO CON LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE MATERIAL DEL CAUCE

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 14-12-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-12-2019

Actividades:
 CUNETAS

CDescripcion:
 TRAMO QUE NO SE EJECUTO POR ESTAR EN CONSULTA DE NECESIDAD DE UNA ALCANTARILLA UBICADA EN LA PROGRESIVA KM 41+580

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 14-12-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-12-2019

Actividades:
PUENTE CHILLIHUA
L=26.60 M KM 46+929

CDescripcion_____:
DESENCOFRADO DE VIGAS POSTENSADAS Y RETIRO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL FALSO PUEENTE

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
14-12-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-12-2019

Actividades:

PUENTE CHILLIHUA
L=26.60 M KM 46+929

CDescripcion_____:

EQUIPO TÉCNICO DELA SUPERVISIÓN VERIFICANDO LOS TRABAJOS EN EL PUENTE.

ING. HERNAN DEL ÁGUILA ALVIS ESPECIALISTA EN SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL DE LA SUPERVISIÓN HOB CONSULTORES

ING JOSE CUTTI ESPECIALISTA EN LIBERACIÓN DE PREDIOS DE LA SUPERVISIÓN

Foto1:

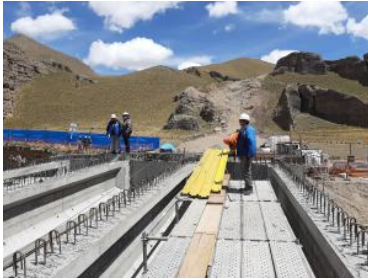


Foto2:

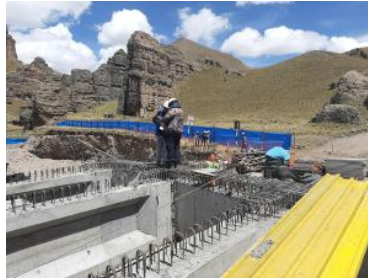


Foto3:



Fecha Toma De Datos:

14-12-2019

9



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-12-2019

Actividades:
ACTIVIDADES NO CONTROLADAS

CDescripcion_____:
UBICACIÓN EN EL KM 60+ 462 SE REALIZAN LABORES DE RELLENO CON MATERIAL DE DME PARA DEJAR TRANSITABLE LA VIA EN EL PERIODO DE LLUVIAS

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
14-12-2019
