

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 252	Fecha Informe: 19-12-2019	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:

Asunto:

REPORTE DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2019

Conclusiones:

EN LA PRESENTE JORNADA SE RE INICIO LA OBRA EN DOS FRENTES DE TRABAJO RECURSOS OFERTADOS

CONTRATISTA

A.- PERSONAL

03 CAPATAZ

04 PEÓN VIGÍA

05 PEÓN

02 OPERADOR DE CAMIÓN VOLQUETE

02 OPERADOR CISTERNA DE AGUA

01 CONDUCTOR DE CAMIONETA

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO

02 CAMIÓN CISTERNA AGUA

02 RODILLO

01 CAMIONETA 4X4

01 AMBULANCIA

SUPERVISIÓN

A.- PERSONAL

01 JEFE DE SUPERVISION

11 ING. ESPECIALISTAS

19 TECNICOS

24 AUXILIARES

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO

04 CAMIONETAS PICK UP 4X4

03 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI

LA SUPERVISIÓN CUMPLE CON LO OFERTADO

NO SE TIENE CUADERNO DE OBRA CON LA ANOTACIÓN DEL DÍA

Recomendaciones:

AL CONTRATISTA SE RECOMIENDA ACELERAR EL PROCESO DE RE INICIO DE LA OBRA, ASÍ COMO DE INTEGRAR A EL PERSONAL Y MAQUINARIA NECESARIO PARA CUMPLIR CON LO PROGRAMADO

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-12-2019

Actividades:

400 CAPAS ANTICONTAMINANTES SUB BASE Y BASE
402 A SUB BASE GRANULAR
26+170

EN LA PROGRESIVA KM

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO

01 CAPATAZ

01 OPERADOR DE CISTERNA DE AGUA

01 OPERADOR DE RODILLO

02 PEONES VIGIA

MAQUINARIA Y EQUIPO

01 CISTERNA DE AGUA

01 RODILLO

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

20-12-2019

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-12-2019

Actividades:
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
205 A TERRAPLENES
27+700 HASTAKM 27+800
SUB RASANTE PROGRESIVA KM

CDescripcion _____:
PERSONAL UTILIZADO
01 CAPATAZ
01 OPERADOR DE CISTERNA DE AGUA
01 OPERADOR DE RODILLO
02 PEONES VIGIA
01 PEON

MAQUINARIA Y EQUIPO
01 CISTERNA DE AGUA
01 RODILLO

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-12-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-12-2019

Actividades:

100 OBRAS PRELIMINARES
103A MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL
PROGRESIVA KM 37+800 (TODO EL TRAMO)

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO :

01 CAPATAZ
02 PEONES
01 CONDUCTOR DE CAMIONETA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

20-12-2019

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-12-2019

Actividades:
RE UBICACIÓN DE POSTES
LA EMPRESA LEON SAC ESTA REALIZANDO POZOS PARA EL IZAJE DE POSTES DE ALTA TENSION EN LA PROGRESIVA KM 33+050

4

CDescripcion_____:
EL CONTROL DE ESTOS TRABAJOS CORRESPONDE AL ÁREA DE PACRI DEL PVN

Foto1:



Foto2:

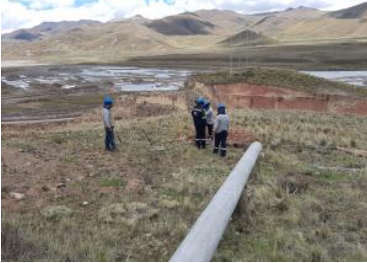


Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-12-2019
