



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 027	Fecha Informe: 04-01-2020	Nombre De La Obra: Saldo de Obra Carretera Rodriguez de Mendoza - Empalme Ruta N.PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada)	Personal Encargado: IVONNE NATIVIDAD CHUQUIPIONDO LA TORRE
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

REPORTE DEL 04 DE ENERO 2020

**Conclusiones:**

La Contratista de acuerdo a su programación semanal del 30.12.19 al 05.01.2020 solo está ejecutando algunos frentes de trabajo el día de hoy sábado 04 de enero, por no contar con insumos como emulsión y cemento.

Los frentes de trabajo son la partida de obras preliminares, con replanteo topográfico de estacas para corte y relleno en la vía dándose inicio desde la progresiva Km 12+180, así como también el repintado de estacas continuándose desde la progresiva Km 14+800 en lado derecho de la vía, con algunas en lado izquierdo.

Se continua con la partida de obras de arte, con sellado de juntas asfálticas, limpieza y colocación de tapas prefabricadas en cunetas rectangulares en la Av. Rodríguez de Mendoza desde la progresiva Km 22+580 a Km 22+605 Lado izquierdo y Km 22+495 a Km 22+560 Lado derecho.

La partida de obras de arte, encofrado de veredas continúa paralizada, hasta la progresiva Km 22+640 en la Av. Rodríguez de Mendoza.

El Contratista continúa con atraso en la ejecución de las partidas de obra.

Se verifica la presencia de los técnicos de la Supervisión en los trabajos que se vienen realizando en los frentes de trabajo.

Con respecto al Cuaderno de Obra, continua siendo la última anotación el Asiento del cuaderno de obra el N° 1436 de fecha 20/12/2019 realizada por el Contratista en la página 000028.

La Contratista continua reparando la maquina del Mixer que ya está varios días en refacción.

La Supervisión continua con los tramites para la renovación de autorización para extracción de material de las Canteras del Río Tónchima, Sector Belén-Buenos Aires de los sectores 1, 2 y 3, ante las Municipalidades distritales de Soritor y Yorongos; y también de renovación de autorización para el uso de las fuentes de agua.

La Supervisión LA CALZADA ha observado mediante Carta N° 293-2020/Consortio-La Calzada/Supervisión a la Contratista OBRAINSA dirigida al Residente de obra, la presentación de las Valorizaciones N° 05 del Adicional 05, N° 02 del Adicional 04, N° 22 del Adicional 02 y N° 29 del Contrato Principal, por los metrados que superan los parciales aprobados, la cual ha sido contestada mediante P0286-05-CCLC-CG-1427.

La Contratista no cuenta con todo el personal ofertado, faltando el Ingeniero de Producción y el Especialista en Calidad.

La Contratista no cuenta con la operatividad de su maquinaria y equipos, para continuar con los frentes de trabajo requeridos.

La Supervisión no cuenta con personal especializado en obra y tampoco cuenta con el personal ofertado, además que el Especialista de Metrados, Costos y Valorizaciones presento su renuncia el 20.12.19.

INCIDENTES: No ocurrió ningún acontecimiento dentro del ámbito de toda la obra.

AMPLIACIONES DE PLAZO: La obra cuenta con la vigencia del CAO aprobado en la ampliación de plazo N° 13 del 14.05.2019. La Contratista OBRAINSA ha solicitado las Ampliaciones de Plazo N° 23 y N° 24 por 259 y 138 días respectivamente, han sido declaradas Improcedentes. Se ejecuta las partidas de acuerdo a una programación semanal que presenta la Contratista a la Supervisión. **ADICIONALES DE OBRA:** La Contratista OBRAINSA ha realizado el replanteo topográfico para la ejecución de la Prestación Adicional 6 de obra, y dar inicio en el presente mes. La Supervisión LA CALZADA ha presentado el Informe Técnico para la Prestación Adicional N° 07 Se tiene ejecutado las Prestaciones Adicionales N° 01, N° 04 y N° 05. Las prestaciones adiciones N° 02 y N° 03 están condicionadas a la prestación adicional N° 06.

DEDUCTIVOS DE OBRA: No se han generado deductivos.

MAYORES METRADOS: La Contratista OBRAINSA ha realizado el levantamiento de información de partidas ejecutadas para determinar los Mayores Metrados y el presupuesto respectivo. El Primer Expediente por Emulsión Asfáltica de rotura rápida ha sido aprobado el 04.12.2019 El Segundo Expediente por Imprimación Asfáltica ha sido verificado por el equipo de topografía de la Supervisión para su conformidad y procederá a su presentación El Tercer Expediente por Replanteo de Cunetas Trapezoidales ha sido devuelto a la Contratista.

PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: La Supervisión LA CALZADA continua con el proceso de renovación de autorización para extracción de material de las Canteras del Río Tónchima, Sector Belén-Buenos Aires, ante las Municipalidades distritales de Soritor y Yorongos; así como también la renovación de las autorizaciones para el uso de las fuentes de agua.

ARQUEOLOGÍA: La obra cuenta con el CIRA del Expediente Técnico, con el que se ha venido laborando, teniendo en cuenta que no se han realizado remociones de los terrenos, actividades que se realizaran al ejecutarse el Adicional 6.

PACRI: Continua pendiente la elaboración de los expedientes de más afectados por derecho de vía, de acuerdo a lo que indico la Ingeniera encargada.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: El personal que participa de las actividades en los frentes de trabajo cuenta la charla diaria y con el uso de los Equipos de Protección Personal. **MANTENIMIENTO VIAL:** La Contratista OBRAINSA ha realizando el control de polvo en la vía desde la progresiva Km 20+000 a Km 13+000, dando el mantenimiento requerido.

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones**MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

Las remuneraciones del mes de diciembre aun no se han realizadas para el personal de la Contratista, así como tampoco de la Supervisión.

Recomendaciones:

Se recomienda a la Contratista agilizar la implementación del personal especializado en obra.

Se recomienda a la Supervisión implementar el personal especializado en obra.

La Supervisión y la Contratista debe coordinar las actividades para que su personal esté presente en los frentes de trabajo.

La Contratista debe seguir realizando el mantenimiento de la vía con el control de polvo para mantener su transitabilidad con seguridad.

La Contratista debe prevenir los materiales necesarios para continuar con los frentes de trabajo, así como la operatividad de su maquinaria de acuerdo al mantenimiento requerido por kilometraje, para los frentes de trabajo programados.

La Supervisión debe verificar la operatividad de la maquinaria y equipos de la Contratista para los trabajos programados y evitar mayores atrasos; así como verificar la existencia de los insumos y materiales en obra.

La Supervisión debe continuar con la verificación de la calidad y de los procesos constructivos para la conformidad de los trabajos ejecutados en los diferentes frentes de trabajo.

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

IVONNE NATIVIDAD
CHUQUIPIONDO LA
TORRE

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

04-01-2020

Actividades:

100.00 OBRAS PRELIMINARES 102.A TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACION
Replanteo de estadas y cotas de corte y relleno.

CDescripcion_____:

Con 01 Oficial + 04 Ayudantes + 01 estación total + 01 prisma + 02 radios + 01 machete,
Se inicio en la progresiva Km 12+180

Foto1:



Foto2:

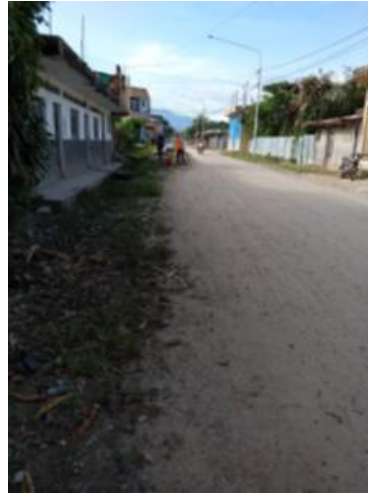


Foto3:



Fecha Toma De Datos:

04-01-2020

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

IVONNE NATIVIDAD
CHUQUIPIONDO LA
TORRE

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

04-01-2020

Actividades:

100.00 OBRAS PRELIMINARES
102.A TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACION
Medida y Repintado de Progresivas

CDescripcion _____:

2

Con 01 Oficial + 04 Ayudantes + wincha + 02 pinceles + 01 machete, Se continuo en la progresiva Km 14+800, con

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

04-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: IVONNE NATIVIDAD CHUQUIPIONDO LA TORRE
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 04-01-2020

Actividades:
300. SUB BASES Y BASES
302.B BASE PARA VEREDAS Y CUNETAS Para veredas en la progresiva Km 20+000 a Km 20+080 ambos lados; y para las cunetas desde la progresiva Km 20+025 a Km 20+090 lado izquierdo.

3

CDescripcion_____:
01 Rodillo liso + 01 Motoniveladora + 01 Cisterna de agua + 01 Camabaja + 01 Retroexcavadora + 01 Ayudante



Fecha Toma De Datos:
04-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

IVONNE NATIVIDAD
CHUQUIPIONDO LA
TORRE

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

04-01-2020

Actividades:

600. OBRAS DE ARTE DE DRENAJE

635.B CUNETAS RECTANGULARES Se continua con limpieza y sellado de juntas con asfalto para realizar la colocación de las tapa prefabricadas en las cunetas rectangulares en ambos lados

CDescripcion_____:

01 Oficial + 10 Obreros + 02 palas + 04 escobas + 02 carretillas + 01 compresora + 02 espátulas

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

04-01-2020

4



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

IVONNE NATIVIDAD
CHUQUIPIONDO LA
TORRE

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

04-01-2020

Actividades:

Planta chancadora

CDescripcion_____:

Se observa limpieza y mantenimiento en la chancadora con 01 oficial + 02 obreros + 01 excavadora

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

04-01-2020
