



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	24	08-01-2020	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	R O M M E L C H A N C A RAMIREZ

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Informe N° 24

Conclusiones:

1.- Ampliación de plazo: Ampliación de plazo N° 4 aprobada por 36 días el 12 de setiembre del 2018 aprobado con RD N° 1762-2018-MTC/20, Ampliación de Plazo N° 08 por 73 días el 20 marzo 2019 aprobado con RD N° 392-2019-MTC/20. En total son 109 días calendarios aprobados bajo resolución, finalizando el termino real de obra el 29 de marzo.

2.- Adicionales de obra: Adicional de Obra N° 01 con un monto de S/. 2'286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20; adicional de Obra N° 02 con un monto S/. 2'286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20.

3.- Mayores metrados: mayores metrados N° 01 con un monto de S/.158,582.04 incluido IGV, mayores metrados N° 02 con un monto de S/.1'436,887.59 incluido IGV, mayores metrados N° 03 con un monto de S/. 1'151,033.60 incluido IGV. También hubo menores Metrados N° 01 con un monto de -S/. 231,942.81 incluido IGV y menores metrados N° 02 con un monto de -S/. 7,494.77 incluido IGV. Al final de mayores y menores metrados que un saldo de S/. 2'507,065.65 incluido IGV.

4.- Deductivos: Deductivo Vinculante N° 01 con un monto S/. 41,028.20 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20; Deductivo Vinculante N° 02 con un monto S/. 85,644.78 incluido el IGV y aprobado con RD N° 124-2019-MTC/20. Después de los adicionales y deductivos llegando a un presupuesto actualizado S/. 270'553,154.88 incluido el IGV

5.- Plan de manejo socio ambiental. El plan de manejo ambiental del mes recién están elaborando.

6.- Mantenimiento vial: se realizó.

7.-Recursos ofertados.

Del contratista:

A) Personal: la contratista cumple con el personal ofertado

B) Equipos: La contratista cumple con el equipo ofertado.

De la supervisión:

A) Personal: la supervisión cumple con el personal ofertado.

B) Equipos: la supervisión cumple con los equipos ofertados.

No se llenó cuaderno de obra del día.

Recomendaciones:

La contratista se debe realizar la limpieza de las cunetas para evitar el deterioro de la estructura del pavimento cuando se empoza el agua.

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-01-2020

Actividades:

Se observó el replanteo topográfico y seccionamiento de la vía, progresiva Km 71+680 hasta Km 73+000 y Km 74+800 hasta 75+360 en el tramo I Negromayo - Tintaya.

CDescripcion_____:

Personal: 02 topógrafos y 06 ayudantes.
Equipos: 02 estación total, cada uno con sus accesorios.

Foto1:



Foto2:

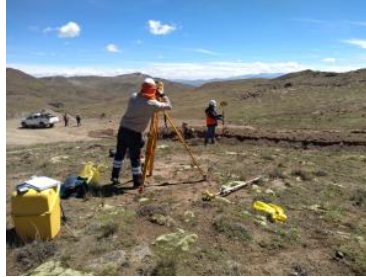


Foto3:



Fecha Toma De Datos:

08-01-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-01-2020

Actividades:

Se observó la conformación de base, progresiva Km 83+450 hasta Km 83+740 en el tramo I Negromayo - Tintaya.

CDescripcion_____:

Personal: 02 personal de piso, 03 operadores y 01 capataz.
Equipos: 02 motoniveladoras 01 rodillo

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

08-01-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-01-2020

Actividades:

Se observó el planta de asfalto y laboratorio de asfalto de la empresa Neptuno, progresiva 83+630 en el tramo I Negromayo - Tintaya.

CDescripcion_____:

Personal: 01 jefe de planta, 01 operador de planta, 06 personal de piso, 01 asistenta de planta, 01 operador, 01 jefe de laboratorio, 05 asistentes y 01 conductor.

Equipos: 01 planta, 01 cargador, 01 cisterna de agua y equipos de laboratorio.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

08-01-2020

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-01-2020

Actividades:

Se observo las pruebas de campo como la densidad y de vigas, progresiva Km 83+740 hasta Km 83+950 en el tramo I Negromayo - Tintaya.

CDescripcion_____:

Personal: Especialista de laboratorio de contrata y supervisión.
Equipos: Equipos de laboratorio.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
08-01-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-01-2020

Actividades:

Se observó la colocación de carpeta asfáltica de la primera capa $e=5$ Cm, progresiva Km 89+960 hasta Km 90+260 en el tramo I Negromayo - Tintaya.

CDescripcion_____:

Personal: 07 operadores, personal técnico de supervisión y contrata, 14 personal de piso y 06 conductores.

Equipos: 01 camión esparcidora, 02 rodillos neumáticos, 01 rodillo de tándem, 01 rodillo de verlas, 01 minicargador, 01 compresora y 06 volquetes.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

08-01-2020

5



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-01-2020

Actividades:

Se observó el encauzamiento del ingreso de alcantarilla con emboquillado y enrocado del extremo del muro de salida de la alcantarilla , progresiva Km 114+050 en el tramo I Negromayo - Tintaya.

CDescripcion_____:

6

Personal: 01 maestro, 02 operadores y 04 mano calificado y 07 obreros.
Equipos: 01 excavadora, 01 camión de concreto de 4 M3 y herramientas manuales.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

08-01-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-01-2020

Actividades:

Se observó la conformación de sub base primera capa, progresiva Km 130+600 hasta Km 131+000 en le tramo II Tintaya - Yauri.

CDescripcion_____:

Personal: 03 personal de piso, 03 operadores, 02 vigía y capataz.
Equipos: 02 rodillos, 01 motoniveladora y herramientas manuales.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

08-01-2020

7



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-01-2020

Actividades:
Se observó la excavación y colocado de material de filtro en el subdren lado derecho, progresiva 130+050 hasta 130+060 en el tramo II Tintaya - Yauri.

CDescripcion_____:
Personal: 03 personal de piso, 01 operador y 02 vigías.
Equipos: 01 retroexcavadora y herramientas manuales.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
08-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-01-2020

Actividades:

Se observó el descencofrado de la losa del puente San Genaro, Km 145+105.31 hasta 145+112.77 y Km 145+149.59 hasta 145+156.89 en el tramo Il Yauri - San Genaro.

CDescripcion_____:

Personal: 07 personal obrero y 01 maestro de obra.
Equipos: herramientas manuales.

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
08-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-01-2020

Actividades:

Se observó la reconfirmación de la sub base primera capa, progresiva Km 129+600 hasta Km 129+850 en el tramo II Tintaya - Yauri.

CDescripcion_____:

Personal: 01 operador y 01 personal de piso.
Equipos: 01 motoniveladora.

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

09-01-2020
