



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 006	Fecha Informe: 09-01-2020	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

REPORTE DEL JUEVES 09 DE ENERO DEL 2020



Conclusiones:

- 1) AMPLIACIÓN DE PLAZO: A LA FECHA NO SE HA APROBADO NINGUNA
- 2) ADICIONALES DE OBRA: SE TIENE DOS ADICIONALES EN PROCESO DE APROBACIÓN COMO ES EL DE LA PISCIGRANJA EN SECTOR DE LA VARIANTE PASPA Y EL OTRO ADICIONAL ES DE LAS TUBERÍAS DE RED DE AGUA EN EL SECTOR CHECCA
- 3) MAYORES METRADOS: EN PROCESO DE APROBACIÓN
- 4) DEDUCTIVOS: AUN NO SE TIENE
- 5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: AUN NO SE HA PROGRAMADO PARA ESTE MES
- 6) MANTENIMIENTO VIAL: NO ESTÁN REALIZANDO TRABAJOS EN EL TRAMO.
- 7) RECURSOS OFERTADOS:

CONTRATISTA

A.- PERSONAL:

- 01 ING. RESIDENTE
- 05 ING. ESPECIALISTAS CONTRACTUAL
- 01 MEDICO EN LA AMBULANCIA
- 02 CAPATAZ
- 04 PEÓN VIGÍA
- 04 PEÓN
- 03 OPERADORES DE VIGA BENKELMAN
- 01 OPERADOR CARGADOR FRONTAL
- 02 OPERADOR EXCAVADORA S/ORUGAS
- 02 OPERADOR MOTONIVELADORA
- 02 OPERADOR DE RODILLO
- 09 OPERADOR DE CAMIÓN VOLQUETE
- 01 OPERADOR CISTERNA DE AGUA
- 01 CONDUCTOR DE CAMIÓN VIGA
- 04 CONDUCTOR DE CAMIONETA
- 01 CONDUCTOR AMBULANCIA
- 01 CONDUCTOR MICRO BUS

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: A CONTINUACION SE INFORMA LA MAQUINARIA QUE TIENE OPERADORES, SE TIENE OTRA MAQUINARIA QUE ESTA INMOVILIZADA DESDE LA PARALIZACION DE OBRA DE LA MEDIDA CAUTELAR.

- 01 CAMIÓN VIGA
- 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA
- 01 CARGADOR FRONTAL
- 02 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS
- 02 MOTONIVELADORA
- 02 RODILLO
- 09 VOLQUETES
- 05 CAMIONETA 4X4
- 01 AMBULANCIA
- 01 MICRO BUS

CON LA MAQUINARIA QUE SE TIENE INMOVILIZADA POR FALTA DE OPERADORES EL CONTRATISTA CUMPLE CON LO OFERTADO. ESTOS OPERADORES FUERON LIQUIDADOS EN SUS PAGOS DESDE QUE SE PARALIZO LA OBRA POR LA MEDIDA CAUTELAR.

SUPERVISIÓN

A.- PERSONAL:

- 01 JEFE DE SUPERVISIÓN
- 09 ING. ESPECIALISTAS
- 18 TÉCNICOS
- 13 AUXILIARES



B.- MAQUINARIA Y EQUIPO:
04 CAMIONETA PICK UP 4X4
03 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI

EL CONTRATISTA CON ESTE PERSONAL EQUIPOS Y CAMIONETAS CUMPLE CON LO OFERTADO

8)INCIDENTES: NINGUNO

9)PACRI: EL CONTRATISTA ELECTROCONSTRUCIONES LEONSAC ESTA TRABAJANDO EN LA PROGRESIVA KM 48+000.

10)ARQUEOLOGÍA: SE TIENE LA PRESENCIA DEL ARQUEÓLOGO DE PVN, ESTA VERIFICANDO EL USO DE ÁREAS AUXILIARES.

11)OTROS: NO SE TIENE CUADERNO DE OBRA AL DÍA.

Recomendaciones:

EL CONTRATISTA DEBE INICIAR CON EL COLOCADO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE, SE TIENE CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS FAVORABLES.

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:	Nivel:	Fecha De Fotografia:
CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO	No Aplica	09-01-2020

Actividades:

CANTERA JALLAMILLA UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 11+000 A LA DERECHA ACCESO APROX. 1 KM

CDescripcion_____:

1 LAS AUTORIDADES Y POBLACIÓN LOCAL NO PERMITEN TRANSPORTAR EL MATERIAL QUE ESTA SELECCIONADO Y ACUMULADO PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL SECTOR CHECCA KM 0+000 HASTA KM 4+450 SE PROGRAMO UNA REUNIÓN PARA EL DÍA SÁBADO EN EL LUGAR PARA SOLUCIONAR ESTE PROBLEMA, ESTARÁN PRESENTE LA SUPERVISIÓN, EL CONTRATISTA Y LAS AUTORIDADES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

09-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-01-2020

Actividades:
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
205 A TERRAPLENES SUB RASANTE PROGRESIVA KM 30+520 HASTA EL KM 30+900

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO
01 MEDICO AMBULANCIA
01 CAPATAZ
01 OPERADOR DE RODILLO
01 OPERADOR MOTONIVELADORA
01 CONDUCTOR DE AMBULANCIA
02 PEONES VIGÍA
02 PEÓN
01 CONDUCTOR MICRO BUS (TRANSPORTE DE PERSONAL)

MAQUINARIA Y EQUIPO
01 RODILLO
01 MOTONIVELADORA
01 AMBULANCIA
01 MICRO BUS (TRASLADO DE PERSONAL)

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
09-01-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-01-2020

Actividades:

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE MAC

CDescripcion_____:

SE REALIZAN LOS PREPARATIVOS PARA REALIZAR LA CALIBRACIÓN DE LA PLANTA TICEL

ADEMAS EN LABORATORIO SE ESTÁN CONTROLANDO LAS HUMEDADES Y PRE SECADO ENTRE OTROS.


Foto1:



Foto2:



Foto3:

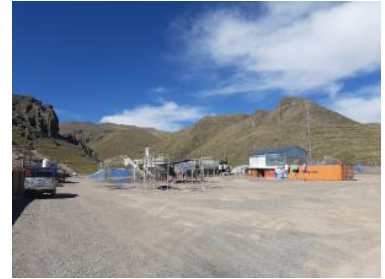

Fecha Toma De Datos:

09-01-2020

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 09-01-2020

Actividades:
100 OBRAS PRELIMINARES
102 A TRAZO Y REPLANTEO
EN LA PROGRESIVA KM 27+800 SE VERIFICA COTAS PARA LA LIBERACIÓN DE SUB BASE

CDescripcion _____:
PERSONAL UTILIZADO
01 TÉCNICO TOPOGRAFÍA
02 PEONES

MAQUINARIA Y EQUIPO
01 NIVEL DE INGENIERO
02 MIRAS

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
09-01-2020



Fotos:
