



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: **Nro Informe:** **Fecha Informe:** **Nombre De La Obra:** **Personal Encargado:**
Informe N 05 - 2020 21-01-2020 HUANUCO - HUALLANCA (T1) BLADIMIR PALOMINO LINARES

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:




Foto Bitacora 6:

Asunto:
Informe N 05-2020

**Conclusiones:**

Mediante el presente, me dirijo a Ud. Para Informarle, sobre las ocurrencias de los trabajos ocurridos el día de hoy en la obra de la referencia:

1).- AMPLIACIONES DE PLAZO:

A LA FECHA, NO HAY AMPLIACIONES DE PLAZO.

CON CARTA CITE: CR20 -GC-SP-2020/002 DEL 08.01.2020, EL CONTRATISTA PRESENTA A LA SUPERVISIÓN LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PLAZO N° 5, REFERIDO ESPECÍFICAMENTE AL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LAS OBRAS INICIALES TRAMO I (OI-T.1.). AL RESPECTO, REFIERE QUE DICHA SOLICITUD HA SIDO REQUERIDA MEDIANTE ASIENTO N° 1621 DE CUADERNO DE OBRA, DE FECHA 24.12.2019, POR LA CAUSAL DE FALTA DE DISPONIBILIDAD Y CAPACIDAD SUFICIENTE DE DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE (DME'S); LO QUE MANIFIESTA HA INCIDIDO DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEBIDAMENTE PROGRAMADOS, ORIGINANDO ATRASOS GENERADOS POR CAUSAS NO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA, TRAYENDO COMO CONSECUENCIA LA AFECTACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA RUTA CRÍTICA DEL CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA. ASIMISMO, ADJUNTA EL SUSTENTO DOCUMENTADO DE LA REFERIDA SOLICITUD DE PRÓRROGA. ESTE DOCUMENTO ESTÁ SIENDO REVISADO POR LA SUPERVISIÓN PARA SU TRÁMITE DE ACUERDO A SU RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL.

2).- ADICIONALES DE OBRA:

PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 01 MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 34932019-MTC/20 DEL 24.12.2019, LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROVÍAS NACIONAL RESOLVIÓ "APROBAR LA PRESTACIÓN ADICIONAL N° 01 (EVENTO COMPENSABLE N° 1) OBRA INICIAL – TRAMO 1 (OI-1; LO CUAL HA GENERADO EL PRESUPUESTO ADICIONAL N° 01 "POR LA INCLUSIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES AUXILIARES DME'S Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DME'S DEL PROYECTO". PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 02 CON CARTA N° 2510020-OI.1-CJS-19-682, EL 26.12.2019,

LA SUPERVISIÓN PRESENTÓ A PROVÍAS NACIONAL, EL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE AL "EVENTO COMPENSABLE N° 02 (ADICIONAL N° 02): POR DEMOLICIÓN DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES DEL KM. 32+000 AL KM. 52+920, INCLUYE PUENTES YURACYACU, MAMAYHUACHIN, SHIRAGRA Y VERA".

3).- MAYORES METRADOS:

EN LA FECHA, NO EXISTEN MAYORES METRADOS.

4).- DEDUCTIVOS:

EN LA FECHA, NO EXISTEN DEDUCTIVOS.

5).- PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:

SE VERIFICÓ EN OBRA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ASUNTOS SOCIOAMBIENTALES, DE ACUERDO A LAS NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS Y A LO INDICADO EN LOS MONITOREOS DEL BID, QUE SON DE APLICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

6).- MANTENIMIENTO VÍAL:

EL CONTRATISTA VIENE REALIZANDO EL MANTENIMIENTO DE VÍAS CON MOTONIVELADORA, REALIZANDO LA CONFORMACIÓN DE CUNETAS Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM. 16+000 AL KM. 21+000; ADEMÁS, REALIZÓ REMOCIÓN DE DERRUMBES, EN SECTOR DEL KM. 34+580 AL KM. 46+150.

7).- RECURSOS OFERTADOS:**7.1).- DEL CONTRATISTA:**

a).- PERSONAL: CUMPLE CON LO OFERTADO.

b).- MAQUINARIA Y EQUIPO: CUMPLE CON LO OFERTADO.

7.2).- DE LA SUPERVISIÓN:

a).- PERSONAL: CUMPLE CON LO OFERTADO.

b).- MAQUINARIA Y EQUIPO: CUMPLE CON LO OFERTADO.

8).- INCIDENTES:

NO HUBO REGISTROS DE INCIDENTES EN EL DÍA

9).- PACRI:

EL PERSONAL DEL ÁREA DE PACRI Y LIBERACIÓN DE PREDIOS DE LA SUPERVISIÓN, CONTINÚA CON SUS ACTIVIDADES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS EN LAS COMUNIDADES CON AFECTACIONES, A FIN DE OBTENER LA LIBERACIÓN DE LAS ÁREAS REQUERIDAS PARA LA OBRA.

10).- ARQUEOLOGÍA:

EL PERSONAL DE ARQUEOLOGÍA CONTINUA CON SUS ACTIVIDADES, DURANTE EL DÍA NO REPORTE HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS EN DICHO TRAMO

11).- OTROS:

POR EL MOMENTO NINGÚN COMENTARIO.



Recomendaciones:

- 1.0 A LA SUPERVISIÓN SE RECOMIENDA MAYOR CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA PARTIDAS PROGRAMADAS POR LA CONTRATISTA.
- 2.0 AL CONTRATISTA INCREMENTAR EL RITMO DE AVANCE DE OBRA.

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BLADIMIR PALOMINO LINARES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-01-2020

Actividades:
Eliminación de Material Excedente

CDescripcion_____:
se viene realizando la eliminación de material excedente con volquetes de 15m3.

1

Foto1:

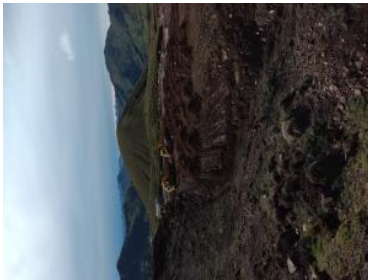


Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
21-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BLADIMIR PALOMINO LINARES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-01-2020

Actividades:
Construcción de Alcantarillado

CDescripcion_____:
Habilitación de acero y amarre la losa y parapeto en Alcantarillado progresiva 51+000, y encofrado en progresiva 51+180

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
21-01-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BLADIMIR PALOMINO LINARES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-01-2020

Actividades:
Construcción de Alcantarillado

CDescripcion_____:
Excavación de zanja con máquina excavadora en progresiva 41+050

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
21-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BLADIMIR PALOMINO LINARES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-01-2020

Actividades:
 Construcción de muro de contención

CDescripcion_____:
 Llenado de muro contención, concreto f'c=100kg/cm2 progresiva 43+000.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 21-01-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BLADIMIR PALOMINO LINARES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-01-2020

Actividades:
 Construcción de puente

CDescripcion_____:
 Armado de acero en puente lado derecho progresiva 34+612 y eliminación de material excedente, limpieza de derrumbe a nivel de plataforma en progresiva 34+580, traslado y acopio de material excedente a DMEs progresiva 36+280 con 5 volquetes y 1 retroexcavadora pequeña.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 21-01-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BLADIMIR PALOMINO
LINARES

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-01-2020

Actividades:

Eliminación de Material Excedente

CDescripcion_____:

se viene realizando el Acopio y depósito de material excedente en DME progresiva 13+400

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

21-01-2020

6
