



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe: Informe N 010-2020	Fecha Informe: 29-01-2020	Nombre De La Obra: HUANUCO - HUALLANCA (T1)	Personal Encargado: BLADIMIR PALOMINO LINARES
--------------------	------------------------------------	------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Informe N 010-2020

**Conclusiones:**

Mediante el presente, me dirijo a Ud. Para Informarle, sobre las ocurrencias de los trabajos ocurridos el día de hoy en la obra de la referencia:

1).- AMPLIACIONES DE PLAZO:

A LA FECHA, NO HAY AMPLIACIONES DE PLAZO.

CON CARTA CITE: CR20 -GC-SP-2020/002 DEL 08.01.2020, EL CONTRATISTA PRESENTA A LA SUPERVISIÓN LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PLAZO No 5, REFERIDO ESPECÍFICAMENTE AL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LAS OBRAS INICIALES TRAMO I (OI-T.1.). AL RESPECTO, REFIERE QUE DICHA SOLICITUD HA SIDO REQUERIDA MEDIANTE ASIENTO No 1621 DE CUADERNO DE OBRA, DE FECHA 24.12.2019, POR LA CAUSAL DE FALTA DE DISPONIBILIDAD Y CAPACIDAD SUFICIENTE DE DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE (DME ´S); LO QUE MANIFIESTA HA INCIDIDO DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEBIDAMENTE PROGRAMADOS, ORIGINANDO ATRASOS GENERADOS POR CAUSAS NO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA, TRAYENDO COMO CONSECUENCIA LA AFECTACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA RUTA CRÍTICA DEL CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA. ASIMISMO, ADJUNTA EL SUSTENTO DOCUMENTADO DE LA REFERIDA SOLICITUD DE PRÓRROGA. ESTE DOCUMENTO ESTÁ SIENDO REVISADO POR LA SUPERVISIÓN PARA SU TRÁMITE DE ACUERDO A SU RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL.

POR LO MISMO SE INFORMA QUE SEGÚN EL PANEL FOTOGRÁFICO EXISTE EL CAMBIO CLIMATOLÓGICO PERJUDICANDO EL AVANCE DE OBRA.

2).- ADICIONALES DE OBRA:

PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA No 01 MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL No 34932019-MTC/20 DEL 24.12.2019, LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROVÍAS NACIONAL RESOLVIÓ "APROBAR LA PRESTACIÓN ADICIONAL No 01 (EVENTO COMPENSABLE No 1) OBRA INICIAL – TRAMO 1 (OI-1; LO CUAL HA GENERADO EL PRESUPUESTO ADICIONAL No 01 "POR LA INCLUSIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES AUXILIARES DME ´S Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DME ´S DEL PROYECTO". PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA No 02 CON CARTA No 2510020- OI.1CJS19682, EL 26.12.2019, LA SUPERVISIÓN PRESENTÓ A PROVÍAS NACIONAL, EL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE AL "EVENTO COMPENSABLE No 02 (ADICIONAL No 02): POR DEMOLICIÓN DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES DEL KM. 32+000 AL KM. 52+920, INCLUYE PUENTES YURACYACU, MAMAYHUACHIN, SHIRAGRA Y VERA".

3).- MAYORES METRADOS:

A LA FECHA, NO EXISTEN MAYORES METRADOS.

4).- DEDUCTIVOS:

A LA FECHA, NO EXISTEN DEDUCTIVOS.

5).- PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:

SE VERIFICÓ EN OBRA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ASUNTOS SOCIOAMBIENTALES, DE ACUERDO A LAS NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS Y A LO INDICADO EN LOS MONITOREOS DEL BID, QUE SON DE APLICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

6).- MANTENIMIENTO VÍAL Y CORTE DE TALUD:

EL CONTRATISTA VIENE REALIZANDO EL MANTENIMIENTO DE VÍAS CON MOTONIVELADORA, REALIZANDO LA CONFORMACIÓN DE CUNETAS Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM. 20+900 AL KM. 22+300; ADEMÁS, REALIZÓ REMOCIÓN DE DERRUMBES, EN SECTOR DEL KM. 43+180 AL KM. 43+220; DEL KM. 43+300 AL KM. 43+380; DEL KM. 43+710 AL KM. 43+740; CORTE DE TALUD DEL KM. 10+560 AL KM. 10+600; DEL KM. 10+970 AL KM. 11+040; DEL KM. 12+380 AL KM. 12+410; DEL KM. 15+730 AL KM. 15+760; DEL KM. 15+850 AL KM. 15+920;

7).- RECURSOS OFERTADOS:**.1).- DEL CONTRATISTA:**

a).- PERSONAL: CUMPLE CON LO OFERTADO.

b).- MAQUINARIA Y EQUIPO: CUMPLE CON LO OFERTADO.

7.2).- DE LA SUPERVISIÓN:

a).- PERSONAL: CUMPLE CON LO OFERTADO.

b).- MAQUINARIA Y EQUIPO: CUMPLE CON LO OFERTADO.

8).- INCIDENTES:

NO HUBO REGISTROS DE INCIDENTES EN EL DÍA.

9).- PACRI:

EL PERSONAL DEL ÁREA DE PACRI Y LIBERACIÓN DE PREDIOS DE LA SUPERVISIÓN, CONTINÚA CON SUS ACTIVIDADES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS EN LAS COMUNIDADES CON AFECTACIONES, A FIN DE OBTENER LA LIBERACIÓN DE LAS ÁREAS REQUERIDAS PARA LA OBRA.

10).- ARQUEOLOGÍA:



EL PERSONAL DE ARQUEOLOGÍA CONTINUA CON SUS ACTIVIDADES, DURANTE EL DÍA NO REPORTE HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS EN DICHO TRAMO.

11).- OTROS:

NO SE TOMO EL ANOTE EL CUADERNO DE OBRA.

Recomendaciones:

1.0 A LA SUPERVISIÓN SE RECOMIENDA MAYOR CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA PARTIDAS PROGRAMADAS POR LA CONTRATISTA.

2.0 AL CONTRATISTA INCREMENTAR EL RITMO DE AVANCE DE OBRA.

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BLADIMIR PALOMINO LINARES

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

29-01-2020

Actividades:

construcción de muro de contención

CDescripcion_____:

Desencofrado y encofrado de muro de contención en progresiva 43+000

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

29-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BLADIMIR PALOMINO LINARES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-01-2020

Actividades:
 Eliminación de material excedente

CDescripcion_____:
 Limpieza de derrumbe a nivel de plataforma en progresiva 43+180 @ 43+210

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 29-01-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BLADIMIR PALOMINO LINARES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-01-2020

Actividades:
 Eliminación de material excedente

CDescripcion_____:
 Acopio y depósito de material excedente en progresiva 52+730. C

3

Foto1:

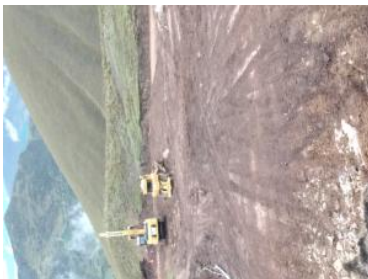


Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 29-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BLADIMIR PALOMINO LINARES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-01-2020

Actividades:
 construcción de Alcantarillado

CDescripcion_____:
 excavación de zapata para enboquillado perfil entrada en progresiva 51+590.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 29-01-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BLADIMIR PALOMINO LINARES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-01-2020

Actividades:
 construcción de Alcantarillado

CDescripcion_____:
 Habilitación de maderas para encofrado de losa Alcantarillado en progresiva 51+190

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 29-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BLADIMIR PALOMINO LINARES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-01-2020

Actividades:
 Construcción de Alcantarillado

CDescripcion_____:
 Encofrado para solado en progresiva 47+050.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 29-01-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BLADIMIR PALOMINO LINARES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-01-2020

Actividades:
 Eliminación de material excedente

CDescripcion_____:
 Limpieza y eliminación de material excedente a nivel de plataforma en progresiva 43+710 @ 43+740.

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 29-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BLADIMIR PALOMINO LINARES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-01-2020

Actividades:
construcción de puente shiragra

CDescripcion_____:
encofrado de muro en puente shiragra perfil derecho.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
29-01-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BLADIMIR PALOMINO LINARES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-01-2020

Actividades:
construcción de puente chinchan

CDescripcion_____:
Habilitación de acero y amarre en horizontal y vertical perfil izquierdo puente Chinchan.

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
29-01-2020
