



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 14	Fecha Informe: 30-01-2020	Nombre De La Obra: Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
---	------------------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

INFORME DIARIO N° 14



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

1) Cuaderno de obra:

• El contratista está relleno el cuaderno de obra.

2) Ampliaciones de Plazo: A la fecha no existe ampliación de plazo.

3) Mayores Metrados: se presentó a Provias Nacional un expediente de mayores metrados por mejoramiento de subrasante.

4) Deductivos: - A la fecha no existe deductivos.

5) Plan de Manejo Socio ambiental: Se está respetando los botaderos, DME del expediente.

6) Mantenimiento Vial: Se está ejecutando.

7) Adicionales de Obras: A la fecha no existe adicionales.

8) Recursos Ofertados:

Del Contratista

a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; pero es necesario mencionar que el consorcio debe incrementar más frentes de trabajo; además el ingeniero residente suspendió sus vacaciones, el ingeniero en metrados y valorizaciones se encuentra en vacaciones (desde el 03 de enero del 2020), el ingeniero de suelos y pavimentos no se encuentra en obra ni oficina (el contratista solicitó su cambio) además el administrador de contrato de obra se encuentra de bajada.

b. Maquinaria y Equipo: Cumple con las maquinarias y equipos, asimismo el consorcio puso en conocimiento que algunas maquinarias están siendo de baja por otras de mejor calidad.

Del Supervisor

a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; pero es necesario mencionar que, la Especialista en Relaciones Comunitarias no se encuentran ya que su sistema de trabajo es parcial.

b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados; pero es necesario mencionar que no cuenta con Plotter.

9) Incidentes: Ninguno

10) PACRI: los especialistas siguen haciendo coordinaciones para liberar las interferencias con las propiedades de la minera Buenaventura.

Por otra parte, se apreció pocos frentes en la realización de actividades para la reubicación de tubería de agua potable en la Vía ramal (Km 136+780 – Km 139+698) por la empresa CONSORCIO GEOCLASS.

11) Arqueología:

12) Otros:

Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:

• Trabajos preliminares.

• Obras de arte y drenaje.

• Movimiento de tierras.

• Voladura en el Km 167+

• Se apreció disminución de frentes de trabajo.

• Por otra parte, con CARTA N° 0081-2020-CVA-RO de fecha 30 de enero del 2020 el Consorcio Vial Ambo, presenta a la Supervisión la Suspensión de vacaciones del personal clave-Residente de Obra, por motivos de la reunión extraordinaria solicitado por Provias Nacional.

Recomendaciones:

- Se recomienda al "Consortio Vial Ambo" y al "Consortio Geoclass", incrementar frentes de trabajo, asimismo realizar coordinaciones en conjunto con la supervisión, para evitar demoras en la ejecución de la obra.

- Se recomienda que las partes involucradas en la ejecución de obra, presenten y generen respuesta a los documentos técnicos en un tiempo considerable y prudente a fin de evitar demoras en los procesos y/o tramites documentarios y por ende en ejecución de la obra.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-01-2020

Actividades:
MOVIMIENTO DE TIERRA: DESBROCE Y LIMPIEZA DEL KM 180+700 - KM 180+930

CDescripcion _____:
PERSONAL: 1 CAPATAZ, 3 PERSONAL DE PISO, 6 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 1 EXCAVADORA SOBREORUGA, 1 TRACTOR SOBRE ORUGA, 4 VOLQUETES.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-01-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-01-2020

Actividades:

RELLENO Y COMPACTADO CABEZAL DE ENTRADA ALCANTARILLA MCA KM
135+035

CDescripcion_____:

PERSONAL: 2 OFICIALES, 2 TÉCNICOS DE CONTROL DE CALIDAD (SUPERVISIÓN
Y CONTRATISTA), 2 TOPOGRAFOS (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA), 2
AUXILIARES DE TOPOGRAFÍA DEL CONSORCIO.
MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 2 VIBROAPISONADORES, 01 ESTACIÓN TOTAL.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

30-01-2020

2



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-01-2020

Actividades:

RELLENO Y COMPACTADO DE CABEZAL DE ENTRADA DE ALCANTARILLA TMC
36 KM 180+998

CDescripcion_____:

PERSONAL: 1 OPERADOR, 2 OFICIAL, 2 PEONES.
MAQUINARIAS Y EQUIPOS, 2 COMPACTADORAS, 1 MINICARGADOR

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:

30-01-2020

3



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-01-2020

Actividades:

TRABAJOS DE VOLADURA: UBICACIÓN DE EXPLOSIVOS EN EL KM 178+099; LA HORA DE LA VOLADURA SE REALIZO A 2:30 PM.

CDescripcion_____:

PERSONAL: 2 OPERARIOS, 2 OFICIALES.
HERRAMIENTAS MANUALES.

4

Foto1:


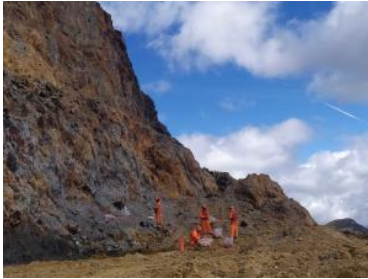


Foto2:



Foto3:

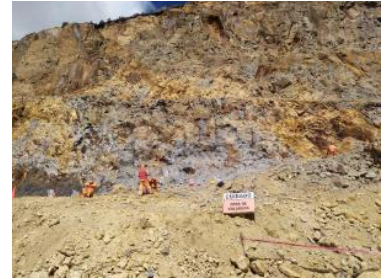

Fecha Toma De Datos:

30-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-01-2020

Actividades:
 ENCOFRADO Y VACIADO DE MURO CICLOPEO PAÑO 1 UBICADO EN EL KM 175+193.5

CDescripcion_____:
 PERSONAL: 1 CAPATAZ, 3 OPERARIOS, 2 OFICIALES, 3 PEONES, 2 TÉCNICOS DE CONTROL DE CALIDAD (SUPERVISIÓN Y CONSÓRCIO) , 2 AUXILIARES DE CONTROL DE CALIDAD (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA), 1 OPERADOR DEL MIXER.
 MAQUINARIAS Y EQUIPO: 1 MIXER, 2 VIBRADORES PARA CONCRETO,

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 30-01-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-01-2020

Actividades:

MANTENIMIENTO CORTE Y LIMPIEZA A NIVEL SUBRASANTE Y MOVIMIENTO DE TIERRA KM 167+500-KM 167+600

CDescripcion_____:

PERSONAL: 4 OPERADORES, 3 PISOS , 2 VIGÍAS, 2 OPERARIOS.
MAQUINARIAS; 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 3 VOLQUETES.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

30-01-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-01-2020

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRA KM 166+900 - KM 167+130

CDescripcion_____:

PERSONAL: 1 CAPATAZ, 5 PERSONAL DE PISO, 9 OPERADORES. 2 VIGÍAS
MAQUINARIAS: 2 EXCAVADORAS SOBRE ORUGA, 1 TRACTOR SOBRE ORUGA, 6
VOLQUETES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

30-01-2020

7



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-01-2020

Actividades:

PRUEBA DE TEXTURIZADO DEL PAVIMENTO PARA CORREGIR UNIFORMIDAD SUPERFICIAL KM 157+735-KM158+325

CDescripcion_____:

LOS ESPECIALISTAS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA SUPERVISIÓN Y DEL CONSORCIO ESTUVIERON SUPERVISANDO LA PRUEBA DE TEXTURIZADO.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

30-01-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-01-2020

Actividades:

ENSAYO DE CIRCULO DE ARENA Y PÉNDULO RUGOSIDAD (A CADA 20M DEL PAVIMENTO RÍGIDO) DEL KM 157+439- KM 157+ 493.

CDescripcion_____:

PERSONAL: 1 TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONSORCIO, 3 AUXILIARES DE CONTROL DE CALIDAD.

EQUIPOS: CIRCULO DE ARENA Y PÉNDULO RUGOSIDAD.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

30-01-2020

9



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

10

Personal Encargado:
NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
30-01-2020

Actividades:
ENSANCHANDO Y MOVIMIENTOS DE TIERRA KM 150+330 - KM 150+400

CDescripcion_____:
PERSONAL : 2 VIGÍAS,1 PERSONAL DE PISO, 1CAPATAZ, 2 OPERADOR.
MAQUINARIAS: 1 EXCAVADORA SOBREORUGA, 1 VOLQUETE.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-01-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado:
NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
30-01-2020

Actividades:
DISPOSICIÓN DE ACERO DEL CABEZAL DE ENTRADA ALCANTARILLA MCA KM 135+075

CDescripcion_____:
PERSONAL: 3 OFICIALES, 1 PEÓN.
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado:
NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
30-01-2020

Actividades:
TRABAJOS EN LA RAMAL: COMPACTADO DE ZANJA PARA LA RE-UBICACIÓN DE LA TUBERÍAS DE AGUA KM 138+800 (TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONSORCIO GEOCLASS)

CDescripcion _____:
PERSONAL: 2 PEONES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-01-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado:
NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
30-01-2020

Actividades:
TRABAJOS EN LA RAMAL: TOPOGRAFÍA KM 138+970-KM 139+000 (TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONSORCIO GEOCLASS)

CDescripcion _____:
PERSONAL: 1 TOPOGRAFO, 1 ASISTENTE DE TOPOGRAFÍA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-01-2020

Actividades:
 MOVIMIENTO DE TIERRA KM 144+ 600.

CDescripcion_____:
 PERSONAL: 1 CAPATAZ, 2 PERSONAL DE PISO, 2 VIGÍAS, 6 OPERADORES.
 MAQUINARIAS: 1 EXCAVADORA, 5 VOLQUETES

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 30-01-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

15

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-01-2020

Actividades:
 PERFORACIÓN KM 143+600

CDescripcion_____:
 PERSONAL: 1 OPERADOR, 3 PERSONAL DE PISO.
 MAQUINARIA: 1 MARILLO HIDRÁULICO.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 30-01-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-01-2020

Actividades:

TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN PTAP PARA CAMARA DE REUNIÓN (GEOCLASS)
KM 142+200

CDescripcion_____:

PERSONAL: 3 PEONES, 1 OPERADOR.
MAQUINARIAS: 1 EXCAVADORA.

16

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

30-01-2020
