



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si
Nro Informe: N° 021-PVN - MJQY - 2020
Fecha Informe: 26-08-2020
Nombre De La Obra: HUANUCO - HUALLANCA (T2)
Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



Asunto:

ENTIDAD: PROVÍAS NACIONAL / SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS
 FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y PRESTAMO INTERNACIONAL (BID)

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20-(CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO,CONSERVACIÓN, POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS FLORES-LLATA-ANTAMINA”, TRAMO II: INICIA (PUNTO UNIÓN) KM 52+920 Y CULMINA (TINGO CHICO) KM 102+819.

EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION
 SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB

PRESUPUESTO OFERTADO TOTAL : S/ 1 241 495 685.46 (INC. IGV)

PRESUPUESTO OBRAS INICIALES OI-2 : S/ 358 709 252.68 (INC. IGV)

Foto Bitacora 6:



**Conclusiones:**

II). (HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA) TRAMO II DEL KM 52+920 AL KM 102+819:

0. DEL CUADERNO DE OBRA:

DEL CONTRATISTA CR20, MEDIANTE CARTA CITE: CR20-GC-SP-2020/065, EL CONTRATISTA HACE LLEGAR A LA SUPERVISIÓN EL EXPEDIENTE TÉCNICO QUE INCLUIAN SUSTENTO TÉCNICO Y DOCUMENTADO DEL "EVENTO COMPENSABLE N° 01- "POR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN LA REANUDACIÓN DE LA OBRA", PARA CONFORMIDAD Y TRÁMITE CORRESPONDIENTE A EFECTO DE SU APROBACIÓN.

DEL CONTRATISTA CR20, DEJAMOS CONSTANCIA QUE A LA FECHA DE HOY LUNES 22.06.2020, CONTINÚA EL PROCESO DE APROBACIÓN DE NUESTRO "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN LA REANUDACIÓN DE LA OBRA" POR PARTE DE LA ENTIDAD, EL CUAL CONSTITUYE UNA CONDICIÓN INEXORABLE PARA QUE DICHO PLAN POR PARTE DE LAS PRESTACIONES DEL CONTRATO DE OBRA Y PROCEDA SU IMPLEMENTACIÓN CORRESPONDIENTE.

DEL CONTRATISTA CR20, APROBACIÓN DE PRORROGA DE PLAZO N° 01 POR 82 DIAS MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 832-2020-MTC/20 DEL 08 DE JULIO DE 2020, LA ENTIDAD DECLARO PROCEDENTE LA SOLICITUD DE PRORROGA DE PLAZO N° 01 DEL CONTRATISTA CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS INICIALES TRAMO II (OI-T2), POR LOS OCHENTA Y DOS (82) DÍAS CALENDARIO SOLICITADOS, DEBIDO A LOS EFECTOS DEL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL, TRASLADÁNDOSE LA FECHA DE TERMINO DE LAS OBRAS INICIALES – TRAMO II (OI-T2) DEL 09.SET.20 AL 30.NOV.20.

1. AMPLIACIONES DE PLAZO

CON RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°832-2020-MTC/20 (08.07.2020), SE RESUELVE DECLARAR PROCEDENTE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PLAZO N°01 AL CONTRATO DE OBRA N°127-2018-MTC/20-CONTRATO PRÉSTAMO BID 3881/OC-PE, PRESENTADA POR LA CONTRATISTA; CONSECUENTEMENTE SE TRASLADA LA FECHA DE TÉRMINO DE LAS OBRAS INICIALES TRAMO II (OI-T2) DEL 09.09.2020 AL 30.11.2021, CONFORME A LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS EN LA PARTE CONSIDERATIVA DE LA RESOLUCIÓN.

LA CONTRATISTA ENVÍA A LA SUPERVISIÓN SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PLAZO N°02, LA CUAL ACTUALMENTE VIENE SIENDO EVALUADA POR LA SUPERVISIÓN.

LA CONTRATISTA ENVÍA A LA SUPERVISIÓN SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PLAZO N°03, LA CUAL ACTUALMENTE VIENE SIENDO EVALUADA POR LA SUPERVISIÓN.

1. ADICIONALES DE OBRA

CON RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°1152-2020-MTC/20 (07.08.2020), APROBAR EL EVENTO COMPENSABLE N°01, OBRA INICIAL - TRAMO II (OI-2) AL CONTRATO DE OBRA N°127-2018-MTC/20 - CONTRATO PRÉSTAMO BID 3881/OC-PE, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA-ANTAMINA", PRESENTADA POR LA EMPRESA CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION, ASCENDENTE A LA SUMA DE S/ 1,767,664.85 INCLUIDO IGV, CONFORME AL ANEXO NO. 1 DEL INFORME N°065-2020-MTC/20.22.2-JVG DE FECHA 06.08.2020 DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS QUE FORMA PARTE DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

3. MAYORES METRADOS

A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS

4. DEDUCTIVOS

A LA FECHA NO HAY DEDUCTIVOS

5. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

SE CONTINUO CON EL MONITOREO AMBIENTAL PARA CALIDAD DE AIRE EN EL SECTOR KM 76+500.

LA SUPERVISIÓN DE OBRA ELABORA INFORME 2510020-OI.2-36-INF-046 EN RESPUESTA A LA CARTA N°CR20G/OI2/RO/20/105(18.08.20) DE LA CONTRATISTA PARA EL TRÁMITE DE PROVÍAS NACIONAL ANTE INGEMMET.

6. MANTENIMIENTO VIAL

MANTENIMIENTO CON RIEGO EN LA VIA EN LOS SECTORES: KM.52+000 AL KM 60+000

MANTENIMIENTO DE LA VÍA EN LOS SECTORES KM56+140, KM 56+240, KM70+860, KM70+880, KM73+000, KM73+100 RELLENO DE BACHES EN LA VÍA.

A). – DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

PERSONAL DE OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

AL PRESENTE LA CONTRATISTA CUENTA CON 07 ESPECIALISTAS EN OBRA Y 05 EN TRABAJO REMOTO DE LOS 14 ESPECIALISTAS CONTEMPLADOS.

- 01.RESIDENTE DE OBRAS INICIALES T-2 (TRABAJO REMOTO)
- 02.ESPECIALISTA AMBIENTAL (TRABAJO REMOTO)
- 03.ESPECIALISTA DE SEÑALIZACIÓN (TRABAJO REMOTO)
- 04.ESPECIALISTA FORESTAL (CAMPO)
- 05.JEFE DE OFICINA TÉCNICA (TRABAJO REMOTO)
- 06.ESPECIALISTA DE PRODUCCIÓN (CAMPO)
- 07.ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO (CAMPO)
- 08.ESPECIALISTA EN PUENTES, OBRAS DE ARTE Y DRENAJE (CAMPO)
- 09.ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA (CAMPO)
- 10.MEDICO OCUPACIONAL (CAMPO)
- 11.ESPECIALISTA EN TOPOGRAFÍA (CAMPO)
- 12.JEFE DE EQUIPOS (CAMPO)
- 13.ESPECIALISTA DE SUELOS (CAMPO)
- 14.ESPECIALISTA EN RELACIONES COMUNITARIAS (CAMPO)

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

LOS EQUIPOS SE ESTACIONAN ACTUALMENTE EN EL KM 57+800, SE CONTABILIZARON 43 UNIDADES DE LAS 218 UNIDADES DE EQUIPO MÍNIMO.

B). - DEL SUPERVISOR DE OBRA

PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

ACTUALMENTE SE CUENTA CON LA PRESENCIA EN OBRA 01 GERENTE VÍAL, 01 JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y 11 INGENIEROS ESPECIALISTAS. (SUELOS Y PAVIMENTOS, SEGURIDAD, INGENIERO LIBERACIÓN DE PREDIOS, ABOGADO LIBERACIÓN DE PREDIOS, TRAZO Y TOPOGRAFÍA, ARQUEOLOGÍA, ADMINISTRADOR DE CONTRATO, PUENTES Y OBRAS DE ARTE, GEOLOGÍA, HIDROLOGÍA), LA SUPERVISIÓN DE OBRA VIENE GESTIONANDO EL CAMBIO DEL INGENIERO ESPECIALISTA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS.

VEHÍCULOS DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

ACTUALMENTE SE CUENTA CON 13 CAMIONETAS, DE LAS 13 CAMIONETAS CONTEMPLADAS PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN, PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS CONTEMPLADOS, CONFORME A LA DEMANDA EN OBRA.

8. PACRI

SE REALIZA COORDINACIONES SOBRE VISITA REALIZADA EL DÍA DE AYER EN CONJUNTO EL ABOGADO E INGENIERO ESPECIALISTAS DE LIBERACIÓN DE PREDIOS. RESPECTO A LA LIBERACIÓN DE LA VIVIENDA AFECTADA DEL 52+900 AL 55+000, EN LA CUAL SE CONVERSÓ CON ALGUNOS POSESIONARIOS RESPECTO AL ALQUILER



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

TEMPORAL HASTA QUE PROVIAS NACIONAL REALICE EL PAGO DE SUS COMPENSACIONES ECONÓMICAS.

SE TUVO REUNIÓN CON EL ALCALDE PROVINCIAL DE YAROWILCA WILFREDO CECILIO, CON LA SIGUIENTE AGENDA: PROGRAMAR REUNIÓN CON LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE GESTIÓN, FUNCIONES DEL COMITÉ DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL ALCALDE EN EL PROYECTO.

LOS PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN: LIC. OSCAR LOCONI, ESPECIALISTA EN RELACIONES COMUNITARIAS Y SUS ASISTENTES, LIC. KARILIN MIMÍ ESPINO ESPINOZA RESPONSABLE SOCIAL DE PACRI – LA ABOGADA Y ARQUITECTA DEL EQUIPO TÉCNICO DE PACRI.

ACUERDOS: SE PROGRAMÓ LA REUNIÓN CON LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE GESTIÓN PARA EL DÍA SÁBADO 05 DE SETIEMBRE DE 2020, A HORAS 9:00 A.M., PREVIA VERIFICACIÓN DEL LOCAL, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD.

9. ARQUEOLOGÍA

SE REALIZÓ LA SUPERVISIÓN DE CAMPO DE LOS TRABAJOS DE DESCARGA Y CONFORMACIÓN DE MATERIAL DE ELIMINACIÓN PROVENIENTE DEL CORTE DE TALUD EN EL DME 52 + 730 - T02 D DEL PROCESO CONSTRUCTIVO.

SE REALIZÓ LA SUPERVISIÓN DE CAMPO EN LOS FRENTES DE TRABAJO DE CORTE DE TALUD (CORTE CERRADO) A NIVEL DE PLATAFORMA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 57 + 840 AL KM 57 + 920 LD, EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO.

LAS LABORES REALIZADAS CORRESPONDEN TAMBIÉN A LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO-PMA DE PROVIAS.

NO SE ENCONTRÓ EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS E HISTÓRICAS DURANTE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS CORTES DE TALUD, DME.

10. INCIDENTES

SEÑORA FLORINDA VIGILIO ROBLES MANIFIESTA QUE EL DÍA 26.08.2020 TUVO UN INCIDENTE CON UN VOLQUETE DE LA EMPRESA CR20, CUYO VEHÍCULO IBA EN EXCESO DE VELOCIDAD, LA SEÑORA TUVO UNA CAÍDA AL MOMENTO DE ESQUIVAR EL VEHÍCULO, LASTIMÁNDOSE LA MANO IZQUIERDA, SE PUSO EN CONOCIMIENTO A ÁREA DE SEGURIDAD DEL CONTRATISTA CR20 Y DE LA SUPERVISIÓN PARA SU INMEDIATA INTERVENCIÓN Y INVESTIGACIÓN.

11. OTROS

LA SUPERVISIÓN DE OBRA VIENE REALIZANDO EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES EN LABORATORIO, REALIZANDO ENSAYO DE LÍMITE PLÁSTICO, ENSAYO DE LÍMITE LÍQUIDO Y ENSAYO DE ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO.

IMPORTANTE EN LA OBRA NO SE CUENTA CON EL EQUIPO TÉCNICO DE LA EMPRESA SUB CONTRATISTA, QUIEN SE ENCARGARÁ DE REALIZAR LOS TRABAJOS DE RE UBICACIÓN DE LOS POSTES DE LUZ SE REQUIERE SU PRESENCIA CON URGENCIA.

Recomendaciones:

12. RECOMENDACIONES:

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL CONTRATISTA CR20, RESPECTO AL INCIDENTE REGISTRADO CON VOLQUETE A EXCESO DE VELOCIDAD, SE RECOMIENDA LA INVESTIGACIÓN DEL CASO A FIN DE TOMAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS.

Auditoría Fecha De Creación:
26-08-2020

Auditoría Fecha De Edición:
27-08-2020



PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-08-2020

Actividades:

KM 67+200

REUNIÓN CON EL ALCALDE PROVINCIAL DE YAROWILCA WILFREDO CECILIO

CDescripcion _____:

SE TUVO REUNIÓN CON EL ALCALDE PROVINCIAL DE YAROWILCA WILFREDO CECILIO, CON LA SIGUIENTE AGENDA: PROGRAMAR REUNIÓN CON LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE GESTIÓN, FUNCIONES DEL COMITÉ DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL ALCALDE EN EL PROYECTO.

LOS PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN: LIC. OSCAR LOCONI, ESPECIALISTA EN RELACIONES COMUNITARIAS Y SUS ASISTENTES, LIC. KARILIN MIMÍ ESPINO ESPINOZA RESPONSABLE SOCIAL DE PACRI – LA ABOGADA Y ARQUITECTA DEL EQUIPO TÉCNICO DE PACRI.

ACUERDOS: SE PROGRAMÓ LA REUNIÓN CON LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE GESTIÓN PARA EL DÍA SÁBADO 05 DE SETIEMBRE DE 2020, A HORAS 9:00 A.M. PREVIA VERIFICACIÓN DEL LOCAL, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

26-08-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-08-2020

Actividades:
PROGRESIVA: KM 52+730 - LADO "D"
900 PROTECCIÓN AMBIENTAL
901.A DISPOSICIÓN Y CONFORMACIÓN DE DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE (DME)
901.B1 RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE TOP SOIL DE DME

2

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 01 JEFE DE PRODUCCIÓN, 30 OPERADORES, 02 CONTROLADORES Y 02 VIGÍAS
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 CARGADOR FRONTAL, 01 TRACTOR ORUGA, 28 VOLQUETES

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
26-08-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-08-2020

Actividades:

PROGRESIVA: KM 53+000, KM 54+000, KM 55+000, KM 70+000, KM 71+000, KM 72+000

100 OBRAS PRELIMINARES

103.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 05 OPERADORES, 06 PEONES, 04 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 MOTONIVELADORA, 01 RODILLO VIBRADOR, 01 CISTERNA DE AGUA NO POTABLE, 02 VOLQUETES

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

26-08-2020

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-08-2020

Actividades:
PROGRESIVA: KM 57+900, KM 58+250
200. MOVIMIENTO DE TIERRAS
202.B3 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO
201.B2 EXCAVACIÓN EN MATERIAL ROCA SUELTA

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 01 JEFE DE PRODUCCIÓN, 02 CAPATAZ, 32 OPERADORES, 06 PEONES Y 04 VIGÍAS
4 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 28 VOLQUETES, 03 EXCAVADORAS, 01 RETROEXCAVADORA

Foto1:



Foto2:

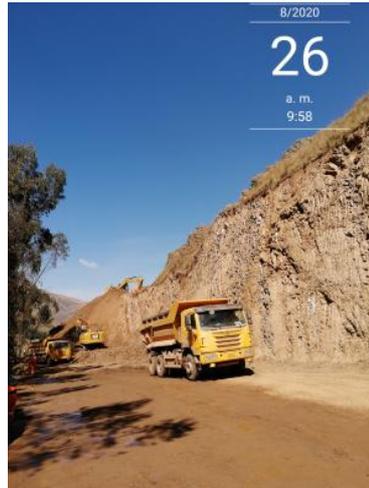


Foto3:



Fecha Toma De Datos:
26-08-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-08-2020

Actividades:

PROGRESIVA: KM 57+900, KM 58+250

700. TRANSPORTE

700.C TRANSPORTE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA ENTRE 120M Y 1000M

700.D TRANSPORTE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA MAYORES DE 1000M

CDescripcion_____:

5

PERSONAL UTILIZADO: 01 JEFE DE PRODUCCIÓN, 02 CAPATAZ, 31 OPERADORES, 06 CONTROLADORES, 04 VIGÍAS, 01 TÉCNICO ENFERMERO, 01 PREVENCIÓNISTA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 28 VOLQUETES, 03 EXCAVADORAS

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

26-08-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-08-2020

Actividades:
PROGRESIVA: KM 52+000, KM 58+000, KM 80+000, KM 81+000, KM 82+020
100 OBRAS PRELIMINARES
102.A1 TRAZO Y REPLANTEO

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 04 TOPOGRAFOS, 12 AUXILIARES DE TOPOGRAFÍA, 04 VIGÍAS
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 04 ESTACION TOTAL CON TRIPODE, 08 PRISMAS CON JALONES, 1 GPS, 02 COLECTOR DE DATOS Y 02 RECEPTOR GNSS

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
26-08-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-08-2020

Actividades:

PROGRESIVA: KM 52+730, KM 53+000, KM 54+000, KM 55+000, KM 56+000 AL KM 57+000, KM 58+000, KM 59+000, KM 60+000

100 OBRAS PRELIMINARES

103.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 OPERADORES

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 02 CAMIÓN CISTERNA DE AGUA NO POTABLE

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

26-08-2020

7



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
Nivel: Crítico
Fecha De Fotografia: 26-08-2020

Actividades:
KM 52+920, KM 53+000, KM 54+000, KM 55+000, KM 56+000, KM 57+800

INTERFERENCIAS QUE IMPIDEN LA CONTINUIDAD DE LOS TRABAJOS EN LA OBRA

CDescripcion _____:
INTERFERENCIAS CASA SRA. JULIA BERRIOS, INTERFERENCIA POSTES ALUMBRADO ELÉCTRICO, PLANTACIONES DE CEBADA, SR. SEBASTIAN APOLINARIO PLANTACIONES PAPA SRA. PETRONILA, BAÑO SRA. LINA BASILIO, POZOS DE TOCOSH, CONSTRUCCIÓN DE CASAS Y CULTIVOS, POSTE DE ALUMBRADO ELÉCTRICO, SEMBRÍOS DE CEBADA, LAVADEROS, QUENUALES, PLANTACIONES, CULTIVO DE HABAS.

SE REQUIERE LA PRESENCIA DE LA EMPRESA SUB CONTRATISTA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE RE UBICACIÓN DE POSTES DE LUZ

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
26-08-2020



Fotos:
