



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 78	Fecha Informe: 11-11-2020	Nombre De La Obra: Corredor vial Lima-Canta-Huayllay-Dv. Cochamarca-Emp. PE 3N Obras de Rehabilitación y Mejoramiento	Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:



Asunto:

SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMPALME PE 3N"

Foto Bitacora 6:





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA:

Hasta aproximadamente las 5.20 pm, no se registraron anotaciones en el cuaderno de obra, por lo que, se adjunta el folio n. 58 (último folio registrado en la Bitácora Electrónica de obra N. 77 de 10.10.2020) y el folio siguiente n. 59 el cual, se encuentra sin registro alguno.

2. AMPLIACIONES DE PLAZO

Ninguna.

3. PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO)

Ninguno.

4. MAYORES METRADOS (MAYORES CANTIDADES)

Ninguno.

5. DEDUCTIVOS

Ninguno.

6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

Ninguno.

7. MANTENIMIENTO VIAL

Ninguno.

8. RECURSOS OFERTADOS

8.1 DEL CONTRATISTA

8.1.1. PERSONAL CLAVE, cumple parcialmente, no estando en obra el Ingeniero Responsable de Topografía (OI).

8.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO, cumple parcialmente.

8.2 DEL SUPERVISOR:

8.2.1 PERSONAL CLAVE: cumple parcialmente, no estando en obra el profesional de dedicación exclusiva: Especialista en Manejo Técnico Administrativo del Contrato de Obra; y de dedicación parcial: Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial, Especialista en Suelos y Pavimentos II (Conservación), Especialista en Geología y Geotecnia (Conservación), Especialista de Estructuras y Obras de Arte (Conservación), Especialista en Hidrología y Drenaje Vial, Especialista en Tráfico, Especialista en Evaluación Económica I y II, Especialista en Seguridad de Obra y Salud Ocupacional (Conservación).

8.2.2. MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. - Cumple parcialmente con lo ofertado, estando pendiente el equipamiento con una estación total.

EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple con lo ofertado

EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado

VEHÍCULOS OPERADOS. - Cumple con lo ofertado, sin embargo, no se cuenta con el equipamiento con radios en ninguna de las unidades vehiculares.

9. INCIDENTES

Ninguno

10. PACRI

Ninguno

11. ARQUEOLOGÍA

Ninguno

12. OTROS

Desde el 8.11.2020, no se cuenta con el servicio de movilidad para el traslado de personal en obra, debido al cumplimiento de la orden de servicio N° 1107 de 10.08.2020; al respecto, se ha tomado conocimiento que, se encuentra en proceso la contratación del servicio de movilidad para el traslado de personal en obra.

El día de hoy y en coordinación con el ingeniero Carlos Vásquez, no se realiza inspección visual en campo, por dos razones i) no contar con movilidad, y ii) culminación de la elaboración y remisión del informe de verificación de recursos de la Consultora de Obra durante el mes de Setiembre de 2020.

Los ingenieros Javier Elorrieta, Luis Oscategui, Carlos Vásquez y Víctor Leandro de la Dirección



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

de Supervisión de Obra, realizan inspecciones en campo con sus pares de la Empresa Contratista y Supervisión de obra referentes a sus especialidades.

Recomendaciones:

Se sugiere la participación directa, permanente y en su integridad en obra del personal clave propuesto tanto de la Supervisión de obra, así como del Contratista a fin de garantizar la calidad, oportunidad y el cumplimiento en sus extremos de cada uno de sus Contratos 77-2014-MTC/20 y 103-2019-MTC/20, respectivamente. Caso contrario los Administradores de Contrato pudieran evaluar el cumplimiento de los contratos citados, y de corresponder las acciones correctivas.

Auditoria Fecha De Creación:

11-11-2020

Auditoria Fecha De Edición:

12-11-2020

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-11-2020

Actividades:

OBRAS INICIALES Y CONSERVACION PROGRESIVA: km 0+000 – OFICINA SUPERVISION EXTERNA DE OBRA. COORDINACIONES DIVERSAS CON ESPECIALISTAS DE LA SUPERVISION DE OBRA – CONSORCIO CESEL – CAL Y MAYOR Y DE LA EMPRESA CONTRATISTA

CDescripcion _____:

JULIO ANICAMA MORAN – ADMINISTRADOR DE LA CONSULTORA DE OBRA, Refiere que en los próximos días se incrementara personal para actividades en el marco del área de intervención del proyecto. Se comprometió a remitir las papeletas de salida del personal que labora en el ámbito de la obra, ya que la programación de salidas o bajadas presentadas serian referenciales.

Ingeniero FREDDY OPORTO SOTO - ADMINISTRADOR DE CONTRATO, Refiere que vienen desarrollando la programación acelerada de obra, de acuerdo a los requerimientos solicitados por PVN y la Supervisión de Obra.

Estarían programando instalar antenas para comunicación en el tramo 2 de tal forma de mejorar la comunicación con los diferentes frentes de trabajo con los profesionales responsables y agilizar los aspectos de construcción de obra.

Las mejoras propuestas a la construcción de terraplenes y mejoramientos de suelos, las presentarían como Advertencia Anticipada, dado las dilaciones y negativas por parte de la Supervisión de obra en reevaluar dichas mejoras.

Como se puede apreciar en la fotografía N° 3 (siendo aproximadamente las 5.30 pm), la mayoría de los profesionales no se encuentran en la oficina, tomándose conocimiento que estarían en obra.

1

Foto1:



Foto2:

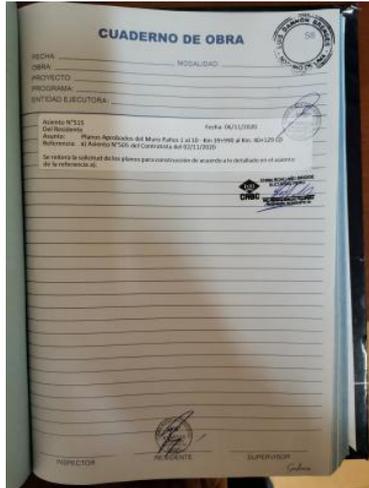


Foto3:



Fecha Toma De Datos:

11-11-2020



Fotos:
