

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	137	09-12-2020	Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: Il km. 35 al km. 153.50	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:



Asunto:


Nro INFORME 137

REPORTE DEL MIERCOLES 09 DE DICIEMBRE DEL 2020

FRENTES DE TRABAJO:

- UBICACION KM 88+070 AL KM 88+120 MOVIMIENTO DE TIERRAS - BANQUETA DE RELLENO Y MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE
- UBICACION: PROGRESIVA KM 113+254 AL KM 113+270 , L=16.00 M 1000 PUNTES CONSTRUCCIÓN 1007 PUENTE AMARILLO 1007.E LOSA DE CONCRETO ARMADO 1007.I VEREDAS DE CONCRETO ARMADO 515.D ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DESENCOFRADO CARAVISTA DE COSTADO DE VIGAS PRINCIPALES
- UBICACION: KM 88+075 Bz 29 Y KM 88+052 Bz 28 PAO N° 09 SANEAMIENTO RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS DE BUZON N° 29 Y BUZON N° 28 CON MATERIAL ESTRUCTURAL, ADEMAS DE SOLAQUEADO DE MEDIA CAÑA DE FONDO DE BUZON
- OBRAS PRELIMINARES 103.A MANTENIMINETO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL ELIMINACION DE MATERIAL ACUMULADO EN PLATAFORMA. (KM 78+400 AL KM 78+430)

Foto Bitacora 6:





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

- 1) AMPLIACIÓN DE PLAZO: SE TIENE NUEVA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 23 R.D 1772-2020MTC/20 POR 04 DÍAS (FECHA R.D 30-09-2020) NUEVO PLAZO AL 16/12/2021
- 2) ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE APROBO EL ADICIONAL (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01(KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)
- 3) MAYORES METRADOS: R.D N° 0747 – 2020 – MTC / 20 SE APROBÓ LOS MAYORES METRADOS N° 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027 Y 028 (AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN)
- 4) DEDUCTIVOS: CON LA APROBACIÓN DE LA PAO N° 10 SE TIENE EL DEDUCTIVO N° 10.
- 5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: SE TIENE BAÑO QUÍMICO EN EL PUENTE AMARILLO SE TIENE EN ESTE FRENTE DE TRABAJO LAVADERO DE MANO CON CONTROL DE PEDAL PARA EL AGUA Y JABÓN LIQUIDO, ASÍ MISMO SE TIENE ALCOHOL Y EL USO DE BARBIJOS DE TODO EL PERSONAL EN ESTE FRENTE.
- 6) MANTENIMIENTO VIAL: CON MAQUINARIA DESDE EL KM 90 AL KM 91
CONTRATISTA
A.- PERSONAL: 01 ING. RESIDENTE 10 ING. ESPECIALISTAS CONTRACTUAL, 03 VIGÍA, 02 JEFE GRUPO (CAPATAZ), 09 PEONES, 05 OPERARIOS, 01 ENFERMERA, 01 PARAMEDICO
B.- MAQUINARIA (INC. OPERADOR) Y EQUIPO: 01 CARGADOR FRONTAL, 02 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 03 VOLQUETES, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMA BAJA, 01 MINI RODILLO COMPACTADOR (BERMERO), 01 CAMION GRUA, 01 BUS, 03 CAMIONETA Y 01 AMBULANCIA
SUPERVISIÓN
A.- PERSONAL: 01 JEFE DE SUPERVISIÓN 11 ING. ESPECIALISTAS 14 TÉCNICOS 11 AUXILIARES, ADMINISTRATIVOS Y CONDUCTORES (CHOFER)
B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: 02 CAMIONETA PICK UP 4X4, 02 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI – MINI BAN
- 8) INCIDENTES: NINGUNO
- 9) PACRI: NINGUNO.
- 10) ARQUEOLOGÍA: NINGUNO
- 11) OTROS: NINGUNO

Recomendaciones:

PARA DAR TRANSITABILIDAD AL PUENTE AMARILLO QUE HOY CUMPLE 14 DIAS DEL VACIADO, DESDE YA SE RECOMIENDA QUE DEBE REALZAR LOS PREPARATIVOS PARA LA PRUEBA DE CARGA.

Auditoria Fecha De Creación:

09-12-2020

Auditoria Fecha De Edición:

10-12-2020

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-12-2020

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 113+254 AL KM 113+270 , L=16.00 M

1000 PUNTES CONSTRUCCIÓN

1007 PUENTE AMARILLO

1007.E LOSA DE CONCRETO ARMADO

1007.I VEREDAS DE CONCRETO ARMADO

515.D ENCOFRADO Y DEENCOFRADO CARAVISTA

DEENCOFRADO CARAVISTA DE COSTADO DE VIGAS PRINCIPALES

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO : 01 JEFE DE GRUPO, 07 PEÓN. 01 OPERARIO, 01 ENFERMERA

MAQUINARIA (INCLUYE OPERADOR) Y EQUIPO : 01 BUS DE TRASLADO DE PERSONAL, 01CAMION CARGA 2 TN, 01 CAMIONETA. 01 RETROEXCAVADORA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

09-12-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-12-2020

Actividades:
UBICACION: PROGRESIVA KM 113+254 AL KM 113+270 , L=16.00 M
1000 PUNTES CONSTRUCCIÓN
1007 PUENTE AMARILLO
1007.E LOSA DE CONCRETO ARMADO
1007.I VEREDAS DE CONCRETO ARMADO
515.D ENCOFRADO Y DEENCOFRADO CARAVISTA

2

CDescripcion _____ :
RETIRO DE ENCOFRADO Y PUNTALES (TIPO PERI) DEL LUGAR DE TRABAJO

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
09-12-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-12-2020

Actividades:

UBICACION: PLANTA DE CONCRETO KM 115+200

CDescripcion_____:

SOLO SE TIENE PLANTA DOSIFICADORA (EN PROCESO DE DESAMBLADO), 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS, 01 VOQUETE Y CAMION MIXER DE CONCRETO

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

09-12-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-12-2020

Actividades:
UBICACION: CANTERA PACHAS KM 118+600 L.I

CDescripcion_____:
SOLO SE TIENE DOS ZARANDAS ESTACIONARIAS PEQUEÑAS.
LA CHANCADORA PRIMARIA Y SECUNDARIA FUERON TRASLADADAS AL TALLER
KM 103 (CONGRI)

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
09-12-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-12-2020

Actividades:

UBICACION: KM 88+075 Bz 29 Y KM 88+052 Bz 28
PAO N° 09 SANEAMIENTO RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS DE BUZON N° 29 Y BUZON N° 28 CON MATERIAL ESTRUCTURAL, ADEMAS DE SOLAQUEADO DE MEDIA CAÑA DE FONDO DE BUZON

CDescripcion _____:

PERSONAL UTILIZADO : 04 PEONES, 01 TECNICO DE CALIDAD
MAQUINARIA Y EQUIPO : 02 VIBROAPISONADORES, 01 RETROEXCAVADORA, 01 DENSIMETRO NUCLEAR, 01 GRUA COLOCADO DE LOSA SUPERIOR Y TAPA DE BUZON

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

09-12-2020

5



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-12-2020

Actividades:

UBICACION: KM 78+400

100 OBRAS PRELIMINARES

103.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL
ELIMINACION DE MATERIAL ACUMULADO EN PLATAFORMA. (KM 78+400 AL KM KM 78+430)

CDescripcion _____ :

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON, 01 JEFE DE GRUPO
MAQUINARIA (INC. OPERADOR) : 03 VOLQUETES, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 CAMION CISTERNA

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

09-12-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-12-2020

Actividades:
UBICACION KM 88+070 AL KM 88+120
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
211.A BANQUETA DE RELLENO Y MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE

CDescripcion _____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 02 PEONES, 01 JEFE DE GRUPO
MAQUINARIA (INC. OPERADOR) Y EQUIPO: 01 CARGADOR FRONTAL, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMION CISTERNA, 01 CAMABAJA, 01 BUS TRASLADO DE PERSONAL

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
09-12-2020

7



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-12-2020

Actividades:
 UBICACION OFICINA DE SUPERVISION - OMATE

CDescripcion_____:
 JEFE SUPERVISION: ING. ORLANDO GARAYAR Y MONITOR PVN

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 09-12-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-12-2020

Actividades:
 UBICACION OFICINA DE SUPERVISION - OMATE

CDescripcion_____:
 ING's ESPECIALISTAS, CADISTAS, TECNICOS Y SECRETARIA - MESA DE PARTES

9

Foto1:



Foto2:


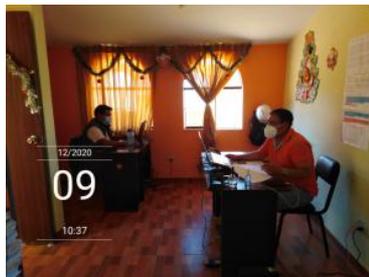


Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 09-12-2020



Fotos:
