

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 150	Fecha Informe: 29-12-2021	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
-------------------------------------	----------------------------	------------------------------	--	--

Foto Bitacora:      Foto Bitacora 2:      Foto Bitacora 3:      Foto Bitacora 4:      Foto Bitacora 5:

**Asunto:**

Nro INFORME 150

REPORTE DEL MARTES 29 DE DICIEMBRE DEL 2020

**Foto Bitacora 6:****Conclusiones:**

- 1)AMPLIACIÓN DE PLAZO: SE TIENE NUEVA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 23 R.D 1772-2020MTC/20 POR 04 DÍAS (FECHA R.D 30-09-2020) NUEVO PLAZO AL 16/12/2021
  - 2)ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE APROBO EL ADICIONAL (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01(KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)
  - 3)MAYORES METRADOS: R.D N° 0747 – 2020 – MTC / 20 SE APROBÓ LOS MAYORES METRADOS N° 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027 Y 028 (AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN)
  - 4)DEDUCTIVOS: CON LA APROBACIÓN DE LA PAO N° 10 SE TIENE EL DEDUCTIVO N° 10.
  - 5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: NO SE EVIDENCIA EN ZONA DE TRABAJO.
  - 6)MANTENIMIENTO VIAL: DEL KM 115+100 AL KM 114+110 Y 89+000 AL 73+000
- CONTRATISTA  
A.- PERSONAL: 02 VIGÍA, 01 PEON. 01 JEFE DE GRUPO  
B.- MAQUINARIA (INC. OPERADOR) Y EQUIPO: 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO BUS  
TRASLADO PERSONAL
- 8)INCIDENTES: NINGUNO
  - 9)PACRI: NINGUNO.
  - 10)ARQUEOLOGÍA: NINGUNO
  - 11)OTROS: NINGUNO

**Recomendaciones:**

LA SRA. OFELIA PORRAS TIENE CHACRAS ASI COMO OTROS AGRICULTORES EN EL FUNDO SANTA CATALINA, QUIEN MANIFIESTA QUE EN LA PROGRESIVA KM 88+650 TENIAN UN ENCAUZAMIENTO DE ROCA Y QUE CON LA OBRA YA NO SE DISPONE DE ESTE ENCAUZAMIENTO, POR LO QUE SE TIENE UNA ZONA DE RIESGO SI SE ACTIVA CON LAS LLUVIAS.

**Auditoria Fecha De Creación:**

29-12-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**

30-12-2021

### PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

29-12-2021

**Actividades:**

UBICACION: KM 115+100 AL 114+110

OBRAS PRELIMINARES

MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL  
LIMPIEZA DE PLATAFORMA Y CUNETAS (TIERRA) DESPRENDIMIENTO DE  
PIEDRAS Y LODO EN TALUDES DE CORTE POR ACCION DE LAS LLUVIAS

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO  
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO BUS  
TRASLADO DE PERSONAL.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

29-12-2021

1



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 29-12-2021

**Actividades:**  
 UBICACION: KM 89+000 AL KM 88+760

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 LIMPIEZA DE PLATAFORMA DESPRENDIMIENTO DE LODO Y PIEDRA DE TALUDES DE CORTE POR ACCION DE PRECIPITACIONES PLUVIALES.

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 29-12-2021

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 29-12-2021

**Actividades:**  
 UBICACION: KM 76+050

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 LIMPIEZA DE PLATAFORMA

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 29-12-2021



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 29-12-2021

**Actividades:**  
UBICACION : KM 75+120

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
LIMPIEZA DE PLATAFORMA PARA DARLE TRANSITABILIDAD Y EVITAR ACCIDENTES

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
29-12-2021

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 29-12-2021

**Actividades:**  
UBICACION: KM 73+040

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
LIMPIEZA DE PLATAFORMA

5


**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

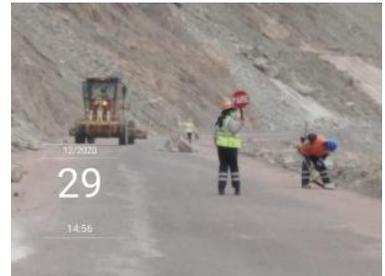

**Fecha Toma De Datos:**  
29-12-2021
