



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 151	<b>Fecha Informe:</b> 30-12-2021	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	<b>Personal Encargado:</b> CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**



**Asunto:**

Nro INFORME 151

REPORTE DEL MIERCOLES 30 DE DICIEMBRE DEL 2020

SE REALIZO LIMPIEZA DE PLATAFORMA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 61+300 AL KM 75+300, DE LA CAIDA DE ROCAS DE TAMAÑO CONSIDERABLE QUE PODRIAN CAUSAR DAÑOS QUE LAMENTAR.

**Foto Bitacora 6:**



**Conclusiones:**

- 1)AMPLIACIÓN DE PLAZO: SE TIENE NUEVA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 23 R.D 1772-2020MTC/20 POR 04 DÍAS (FECHA R.D 30-09-2020) NUEVO PLAZO AL 16/12/2021
  - 2)ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE APROBO EL ADICIONAL (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01(KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)
  - 3)MAYORES METRADOS: R.D N° 0747 – 2020 – MTC / 20 SE APROBÓ LOS MAYORES METRADOS N° 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027 Y 028 (AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN)
  - 4)DEDUCTIVOS: CON LA APROBACIÓN DE LA PAO N° 10 SE TIENE EL DEDUCTIVO N° 10.
  - 5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: NO SE EVIDENCIA EN ZONA DE TRABAJO.
  - 6)MANTENIMIENTO VIAL: DEL KM 115+100 AL KM 114+110 Y 89+000 AL 73+000
- CONTRATISTA
- A.- PERSONAL: 02 VIGÍA, 01 PEON. 01 JEFE DE GRUPO
- B.- MAQUINARIA (INC. OPERADOR) Y EQUIPO: 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO BUS
- TRASLADO PERSONAL
- 8)INCIDENTES: NINGUNO
  - 9)PACRI: NINGUNO.
  - 10)ARQUEOLOGÍA: NINGUNO
  - 11)OTROS: NINGUNO

**Recomendaciones:**


COMO SE APRECIA EN EL INFORME SE TIENE CAIDA DE ROCAS EN TALUDES DE CORTE QUE PODRIAN SER CON PERDIDAS MORTALES, POR LO QUE SE RECOMIENDA EN ESTE SECTOR Y OTROS SIMILARES DEBE REALIZARSE UNA INSPECCION VISUAL Y UN DESQUINCHE MANUAL PARA EVITAR ACCIDENTES QUE LAMENTAR.

**Auditoria Fecha De Creación:**

30-12-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**

31-12-2021



### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 30-12-2021

**Actividades:**  
UBICACION: PROGRESIVA KM 75+080  
MURO DE CONTENCIÓN FUE DAÑADO

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
1 SE VERIFICO DERRUMBE DE ROCAS QUE IMPIDEN EL NORMAL TRANSITO DE VEHICULOS.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
30-12-2021



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

30-12-2021

**Actividades:**

UBICACION: KM 65+800

LIMPIEZA DE PLATAFORMA DESPRENDIMIENTO DE PIEDRAS EN TALUDES DE CORTE POR ACCION DE LAS LLUVIAS

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

2

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO  
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO BUS  
TRASLADO DE PERSONAL.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

30-12-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 30-12-2021

**Actividades:**  
**UBICACION:** PROGRESIVA KM 64+080

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
**LIMPIEZA DE PLATAFORMA DESPRENDIMIENTO DE PIEDRA DE TALUDES DE CORTE POR ACCION DE PRECIPITACIONES PLUVIALES.**

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 30-12-2021

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 30-12-2021

**Actividades:**  
**UBICACION :** PROGRESIVA KM 63+640 (BADEN)

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
**LIMPIEZA DE PLATAFORMA**

4


**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

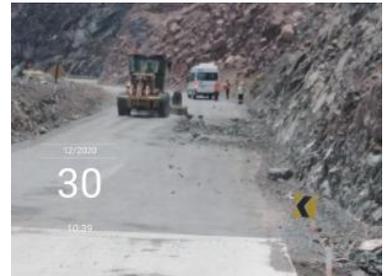

**Fecha Toma De Datos:**  
 30-12-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 30-12-2021

**Actividades:**  
**UBICACION:** KM 62+800

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
**LIMPIEZA DE PLATAFORMA PARA DARLE TRANSITABILIDAD Y EVITAR ACCIDENTES**

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 30-12-2021

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 30-12-2021

**Actividades:**  
**UBICACION:** PROGRESIVA KM 61+400

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
**LIMPIEZA DE PLATAFORMA DEL DESPRENDIMIENTO DE PIEDRA DE TALUDES DE CORTE POR ACCION DE PRECIPITACIONES PLUVIALES.**

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 30-12-2021
