

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 002	Fecha Informe: 05-01-2021	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: Il km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
-----------------------	------------------	---------------------------	---	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

Nro INFORME 002

REPORTE DEL MARTES 05 DE ENERO DEL 2021

Foto Bitacora 6:**Conclusiones:**

- 1)AMPLIACIÓN DE PLAZO: SE TIENE NUEVA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 23 R.D 1772-2020MTC/20 POR 04 DÍAS (FECHA R.D 30-09-2020) NUEVO PLAZO AL 16/12/2021
 - 2)ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE APROBO EL ADICIONAL (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01(KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)
 - 3)MAYORES METRADOS: R.D N° 0747 – 2020 – MTC / 20 SE APROBÓ LOS MAYORES METRADOS N° 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027 Y 028 (AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN)
 - 4)DEDUCTIVOS: CON LA APROBACIÓN DE LA PAO N° 10 SE TIENE EL DEDUCTIVO N° 10.
 - 5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: NO SE EVIDENCIA EN ZONA DE TRABAJO.
 - 6)MANTENIMIENTO VIAL: LIMPIEZA DE PLATAFORMA DEL KM 126+900 AL KM 151+900
- CONTRATISTA
A.- PERSONAL: 02 VIGÍA, 01 PEON. 01 JEFE DE GRUPO
B.- MAQUINARIA (INC. OPERADOR) Y EQUIPO: 01 MOTONIVELADORA, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 MICRO BUS TRASLADO PERSONAL
- 8)INCIDENTES: NINGUNO
 - 9)PACRI: NINGUNO.
 - 10)ARQUEOLOGÍA: NINGUNO
 - 11)OTROS: NINGUNO

Recomendaciones:

PARA EL CASO DE LA PROGRESIVA KM 151+900, SE DEBE REALIZAR RELLENO CON MATERIAL ADECUADO PARA EVITAR LA ACUMULACION DE AGUA Y LODO EN LA PLATAFORMA.

Auditoria Fecha De Creación:

05-01-2021

Auditoria Fecha De Edición:

06-01-2021

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-01-2021

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 132+600

ZONA CRITICA - LIMPIEZA DE PLATAFORMA

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO

MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01 CARGADOR FRONTAL , 01
MOTONIVELADORA, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

05-01-2021

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-01-2021

Actividades:
UBICACION: PROGRESIVA KM 128+400

CDescripcion_____:
LIMPIEZA DE PLATAFORMA, DESPRENDIMIENTO DE PIEDRAS POR ACCION DE LAS LLUVIAS

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-01-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-01-2021

Actividades:
UBICACION: KM 126+940

CDescripcion_____:
HABILITADO DE PLATAFORMA PARA EL TRANSITO NORMAL Y SEGURO DE VEHICULOS

3


Foto1:



Foto2:



Foto3:

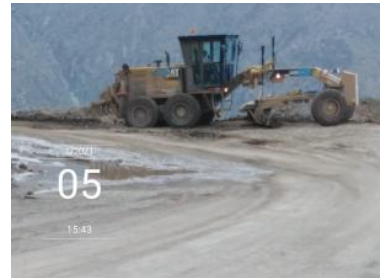

Fecha Toma De Datos:
05-01-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-01-2021

Actividades:
UBICACION: PROGRESIVA KM 152+600

CDescripcion_____:
LIMPIEZA DE PLATAFORMA

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-01-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-01-2021

Actividades:
UBICACION: PROGRESIVA KM 151+900

CDescripcion_____:
HABILITADO DE PLATAFORMA PARA EL TRANSITO VEHICULAR

5


Foto1:



Foto2:



Foto3:

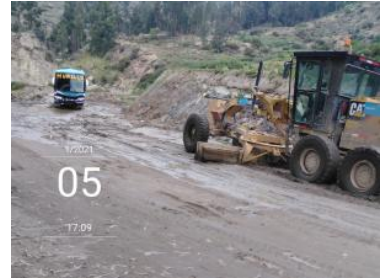

Fecha Toma De Datos:
 05-01-2021
