



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 26	Fecha Informe: 07-01-2021	Nombre De La Obra: Corredor vial Lima-Canta-Huayllay-Dv. Cochamarca-Emp. PE 3N Obras de Rehabilitación y Mejoramiento	Personal Encargado: M A N U E L J A V I E R FLORENCIO RADO
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:


Foto Bitacora 5:



Asunto:

SALDO DE OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA – HUAYLLAY DEL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMP. PE 3N
CONTRATISTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU (CONTRATO N° 103-2019-MTC/20)
SUPERVISOR: CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR (CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 077-2014-MTC/20)

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA:

Se pudo conseguir el registro del cuaderno de obra que se muestran en el registro fotográfico de la presente bitácora electrónica.

1) AMPLIACIONES DE PLAZO:

A la fecha se han otorgado las Prórrogas N° 01 y N° 02 por 82 y 16 días calendario, respectivamente.

2) ADICIONALES DE OBRAS:

No se presenta.

3) MAYORES METRADOS:

Se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha presentado informes por Mayores Metrados a la Entidad

4) DEDUCTIVOS:

No se presenta.

5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL:

Se visualizó que se dispone de baños portátiles tipo DISAL y se están colocando los materiales excedentes en los DME autorizados.

6) MANTENIMIENTO VIAL:

Se están realizando actividades de mantenimiento vial

7) RECURSOS OFERTADOS:

Se está revisando la información contractual para su evaluación.

8) INCIDENTES:

Sin Comentario.

9) PACRI:

Sin Comentario.

10) ARQUEOLOGÍA:

Sin Comentario.

11) OTROS



Recomendaciones:

Se recomienda hacer seguimiento a la respuesta del Contratista ante la solicitud de la Supervisión de Obra de la mejora en las medidas de seguridad en las zonas de trabajo.

Auditoria Fecha De Creación:
07-01-2021

Auditoria Fecha De Edición:
08-01-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MANUEL JAVIER FLORENCIO RADO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-01-2021

Actividades:
 OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
 SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 0+000 AL KM 21+000
 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

CDescripcion _____ :
 SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 13+980 AL KM 14+020 CON UN PEON, UN RESPONSABLE Y UNA MOTONIVELADORA CON SU OPERARIO, CON SU VIGIA.

1


Foto1:



Foto2:



Foto3:

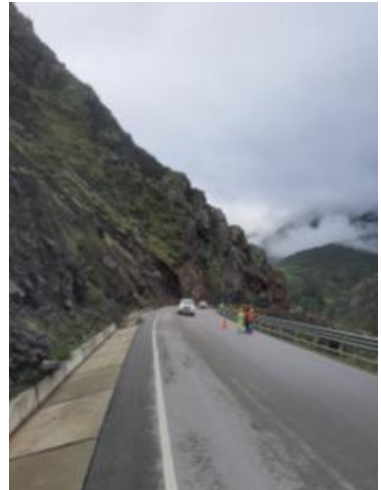

Fecha Toma De Datos:
07-01-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: M A N U E L J A V I E R F L O R E N C I O R A D O
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-01-2021

Actividades:
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 39+400 AL KM 39+490
MURO DE CONCRETO CICLOPEO

CDescripcion _____:
SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO CONSISTENTES EN SU ETAPA DE EXCAVACIÓN Y PERFILADO CON CINCO PEONES, UN CAPATAZ, DOS VIGIAS, UNA EXCAVADORA CON SU OPERARIO.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
07-01-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MANUEL JAVIER FLORENCIO RADO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-01-2021

Actividades:
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 49+100 AL KM 49+320
MEJORAMIENTO DE SUELOS A NIVEL DE SUBRASANTE

CDescripcion _____:
SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE SUELOS A NIVEL DE SUBRASANTE CONSISTENTES EN SU ETAPA DE EXCAVACIÓN CON TRES PEONES, UN RESPONSABLE, DOS VIGIAS, UNA EXCAVADORA CON SU OPERARIO Y CINCO CAMIONES VOLQUETES OPERADOS.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
07-01-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MANUEL JAVIER
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-01-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 53+491 AL KM 54+000
SUBDREN PROFUNDO

CDescripcion_____:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE SUBDREN PROFUNDO CONSISTENTES EN SU ETAPA DE EXCAVACION Y COLOCACIÓN DE MATERIAL CON OCHO TRABAJADORES, UN CAPATAZ, UNA RETROEXCAVADORA, CARGADOR FRONTAL, UNA CISTERNA Y UNA EXCAVADORA CON SUS OPERARIOS

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

07-01-2021
