


**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES


## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 35	<b>Fecha Informe:</b> 18-01-2021	<b>Nombre De La Obra:</b> Corredor vial Lima-Canta-Huayllay-Dv. Cochamarca-Emp. PE 3N Obras de Rehabilitación y Mejoramiento	<b>Personal Encargado:</b> M A N U E L J A V I E R FLORENCIO RADO
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	--

**Foto Bitacora:****Foto Bitacora 2:****Foto Bitacora 3:****Foto Bitacora 4:****Foto Bitacora 5:****Asunto:**

SALDO DE OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA – HUAYLLAY DEL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMP.PE 3N  
CONTRATISTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU (CONTRATO N° 103-2019-MTC/20)  
SUPERVISOR: CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR (CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 077-2014-MTC/20)

**Foto Bitacora 6:**

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones**MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Conclusiones:****0) CUADERNO DE OBRA:**

Se pudo conseguir el registro del cuaderno de obra que se muestran en el registro fotográfico de la presente bitácora electrónica.

**1) AMPLIACIONES DE PLAZO:**

A la fecha se han otorgado las Prórrogas N° 01 y N° 02 por 82 y 16 días calendario, respectivamente.

**2) ADICIONALES DE OBRAS:**

Se tiene conocimiento que la Supervisión de obra ha presentado a la Entidad una opinión respecto a la necesidad de un adicional de obra.

**3) MAYORES METRADOS:**

Se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha presentado informes por Mayores Metrados a la Entidad

**4) DEDUCTIVOS:**

No se presenta.

**5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL:**

Se trasladan los excedentes de materiales provenientes de los cortes y/o excavaciones a los DMEs

**6) MANTENIMIENTO VIAL:**

Se están realizando actividades de mantenimiento vial

**7) RECURSOS OFERTADOS:**

Se está revisando la información contractual para su evaluación. Se ha tramitado la Aprobación del Cambio del cargo de Jefe de Supervisión y está por tramitarse el reemplazo del cargo del Ingeniero Residente de Obras Iniciales.

**8) INCIDENTES:**

Sin Comentario.

**9) PACRI:**

Sin Comentario.

**10) ARQUEOLOGÍA:**

Sin Comentario.

**11) OTROS:**

Se realizó el recorrido al Tramo I: Lima – Canta, se visualizó la ejecución de trabajos de Conservación que se muestran en los paneles fotográficos de la presente Bitacora, Se tomó conocimiento de la Carta N° 054-2021-CRBC-PE-DBG.GV por el asunto: Suspensión de Servicios de Conservación por Niveles de Servicio Tramo 3 y 4 por incumplimiento de Pago de las Valorizaciones Mensuales, comunicación del Contratista CRBC a la Supervisión Consorcio CESEL – Cal y Mayor

**Recomendaciones:**

Se recomienda a la Entidad estar atentos al Pronunciamiento de la Supervisión Consorcio CESEL – Cal y Mayor respecto a la Carta N° 054-2021-CRBC-PE-DBG.GV por el asunto: Suspensión de Servicios de Conservación por Niveles de Servicio Tramo 3 y 4 por incumplimiento de Pago de las Valorizaciones Mensuales.

**Auditoria Fecha De Creación:**

18-01-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**

19-01-2021

**PANEL FOTOGRAFICO**



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MANUEL JAVIER  
FLORENCIO RADO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

18-01-2021

**Actividades:**

CONSERVACIÓN INICIAL (CI2): TRAMO 1: LIMA - CANTA  
INSPECCIÓN DE CAMPO A LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN DE LA CI2


**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

SE VISUALIZÓ LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN EN EL SECTOR DEL KM 49+800 CON LA PARTICIPACIÓN DE 04 TRABAJADORES, 01 RESPONSABLE, HERRAMIENTAS Y CAMION BARANDA.


**Foto1:**



**Foto2:**

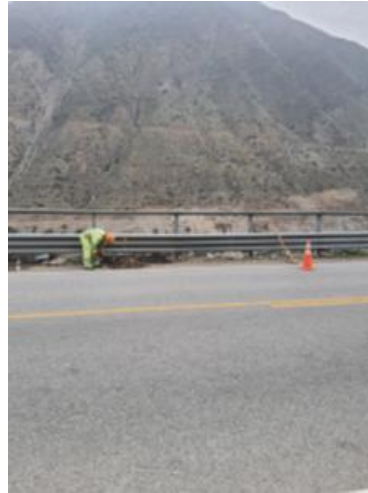

**Foto3:**

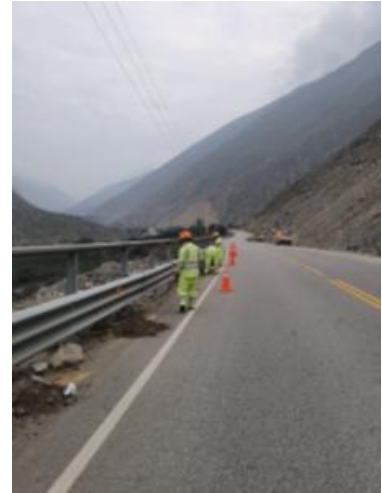

**Fecha Toma De Datos:**

18-01-2021

1



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MANUEL JAVIER  
FLORENCIO RADO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

18-01-2021

**Actividades:**

CONSERVACIÓN INICIAL (CI2): TRAMO 1: LIMA - CANTA  
INSPECCIÓN DE CAMPO A LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN DE LA CI2

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

SE VISITÓ LA OFICINA DE CAMPO DE LA CONTRATISTA CRBC LOCALIZADA EN EL CENTRO POBLADO DE YANGAS, CONSTATANDO LA PRESENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA EN LOS CARGOS DE INGENIERO RESIDENTE DE CONSERVACIÓN VIAL Y ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL.

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

18-01-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** M A N U E L J A V I E R FLORENCIO RADO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 18-01-2021

**Actividades:**  
CONSERVACIÓN INICIAL (CI2): TRAMO 1: LIMA - CANTA  
INSPECCIÓN DE CAMPO A LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN DE LA CI2

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
SE VISUALIZÓ LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN EN EL SECTOR DEL KM 76+290 CON LA PARTICIPACIÓN DE 02 TRABAJADORES, 01 RESPONSABLE, HERRAMIENTAS, EXCAVADORA SOBRE LLANTAS, CAMIÓN VOLQUETE Y VIGIAS.

3


**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

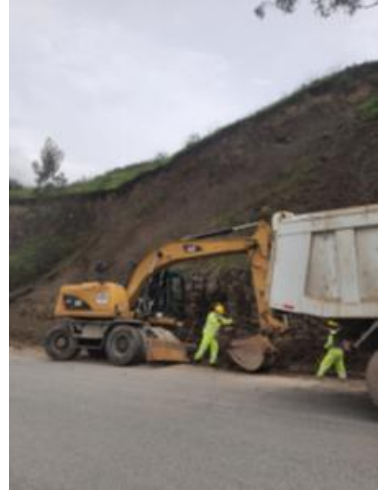

**Fecha Toma De Datos:**  
18-01-2021
