



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| | | | | |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Confir ma Bitaco ra: Si | Nro Inform e: 37 | Fecha Informe: 20-01-2021 | Nombre De La Obra: Corredor vial Lima-Canta- Huayllay-Dv. Cochamarca- Emp. PE 3N Obras de Rehabilitación y Mejoramiento | Personal Encargado: M A N U E L J A V I E R FLORENCIO RADO |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:


Foto Bitacora 5:



Asunto:

SALDO DE OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA – HUAYLLAY DEL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMP.PE 3N
CONTRATISTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU (CONTRATO N° 103-2019-MTC/20)
SUPERVISOR: CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR (CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 077-2014-MTC/20)

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA:

Se pudo conseguir el registro del cuaderno de obra que se muestran en el registro fotográfico de la presente bitácora electrónica.

1) AMPLIACIONES DE PLAZO:

A la fecha se han otorgado las Prórrogas N° 01 y N° 02 por 82 y 16 días calendario, respectivamente.

2) ADICIONALES DE OBRAS:

Se tiene conocimiento que la Supervisión de obra ha presentado a la Entidad una opinión respecto a la solicitud de un adicional de obra presentado por la contratista

3) MAYORES METRADOS:

Se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha presentado informes por Mayores Metrados a la Entidad

4) DEDUCTIVOS:

No se presenta.

5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL:

Se trasladan los excedentes de materiales provenientes de los cortes y/o excavaciones a los DMEs y se están realizando los monitoreos ambientales.

6) MANTENIMIENTO VIAL:

Se están realizando actividades de mantenimiento vial

7) RECURSOS OFERTADOS:

Se ha tramitado la Aprobación del Cambio del cargo de Jefe de Supervisión a favor del Ing. Octaviano Ubillus Jimenez y está por tramitarse el reemplazo del cargo del Ingeniero Residente de Obras Iniciales. La empresa Supervisora Consorcio Cesel – Cal y Mayor Cumple con los recursos ofertados y la empresa Contratista China Road and Bridge Corporation Sucursal Peru No cumple con todos los recursos ofertados.

8) INCIDENTES:

Sin Comentario.

9) PACRI:

Sin Comentario.

10) ARQUEOLOGÍA:

Sin Comentario.

11) OTROS:

La empresa contratista China Road and Bridge Corporation Sucursal Peru ha presentado a la Supervisión Consorcio Cesel – Cal y Mayor la solicitud de prórroga N° 03, Por lo que dicha Supervisión deberá informar a la Entidad.

Recomendaciones:

Se recomienda a la Entidad exigir a la Contratista CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU la implementación de las medidas correspondientes para el cumplimiento de sus obligaciones del plazo del programa de obra vigentes a la fecha.

Auditoria Fecha De Creación:

20-01-2021

Auditoria Fecha De Edición:

21-01-2021

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: M A N U E L J A V I E R F L O R E N C I O R A D O
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-01-2021

Actividades:
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 92+500 AL KM 93+000
MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

CDescripcion _____:
SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 92+500 AL KM 93+000 CON UN PEON, UN RESPONSABLE, UN VIGIA, UNA MOTONIVELADORA Y UN RODILLO CON SU OPERADOR.

1

Foto1:



Foto2:


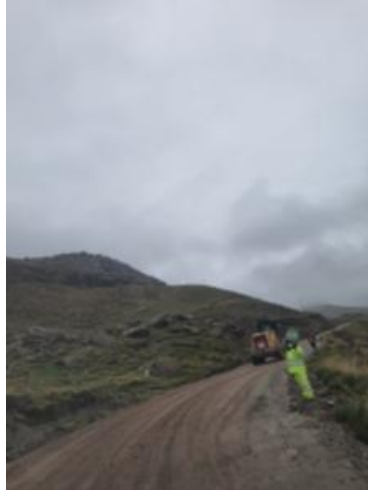


Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-01-2021

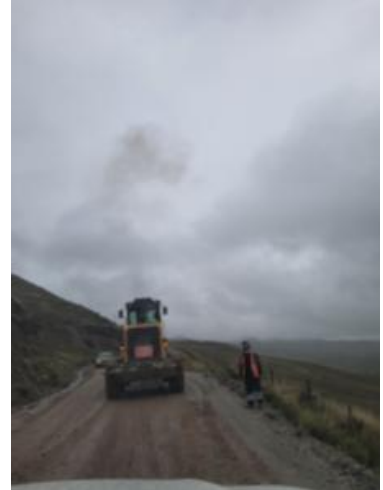

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MANUEL JAVIER FLORENCIO RADO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-01-2021

Actividades:
acopio 87

CDescripcion_____:
acopio

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-01-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: M A N U E L J A V I E R F L O R E N C I O R A D O
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-01-2021

Actividades:
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 86+200
SUBPROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL

CDescripcion_____:
SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES PARA LA PARTIDA DE SUBPROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 86+200 A CARGO DE LA SUBCONTRATA "SERVICIOS AMBIENTALES GENERALES".

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-01-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: M A N U E L J A V I E R F L O R E N C I O R A D O
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-01-2021

Actividades:
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 74+500
CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES

CDescripcion _____:
SE CONSTATÓ LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES EN SU COMPONENTE DE PERFILADO DE TALUDES DEL TERRAPLÉN LOCALIZADO ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 74+500, CON LA PARTICIPACIÓN DE DOS TRABAJADORES, DOS VIGIAS, UNA EXCAVADORA SOBRE CADENAS CON SU OPERADOR

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-01-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: M A N U E L J A V I E R FLORENCIO RADO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-01-2021

Actividades:
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 70+242 AL KM 70+377
GAVIÓN TIPO CAJA

CDescripcion_____:
SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES PARA LA PARTIDA DE GAVIÓN TIPO CAJA ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 70+242 AL KM 70+377 CON 4 TRABAJADORES CON SUS HERRAMIENTAS Y 2 VIGIAS.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-01-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: M A N U E L J A V I E R FLORENCIO RADO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-01-2021

Actividades:
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 70+145
MURO DE CONCRETO CICLOPEO

CDescripcion _____:
SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE ENCOFRADO PARA EL MURO DE CONCRETO CICLOPEO ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 70+145 CON LA PARTICIPACIÓN DE SEIS TRABAJADORES, MATERIALES Y HERRAMIENTAS, DOS VIGIAS.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-01-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MANUEL JAVIER FLORENCIO RADO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-01-2021

Actividades:
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 66+850
CONFORMACION DE TERRAPLENES

CDescripcion _____:
SE CONSTATÓ LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES EN SU COMPONENTE DE PERFILADO DE TALUDES DEL TERRAPLEN LOCALIZADO ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 66+850, CON LA PARTICIPACION DE DOS TRABAJADORES, UN VIGIA, UNA EXCAVADORA SOBRE CADENAS CON SU OPERADOR

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-01-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: M A N U E L J A V I E R F L O R E N C I O R A D O
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-01-2021

Actividades:
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 63+534
ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA CORRUGADA

CDescripcion _____:
SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES PARA LA PARTIDA DE ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA CORRUGADA ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 63+534 CON CUATRO TRABAJADORES, INGENIERO RESPONSABLE, EQUIPOS DE VIBROCOMPACTACIÓN Y UN CARGADOR FRONTAL CON SU OPERARIO.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-01-2021
