



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 38	Fecha Informe: 21-01-2021	Nombre De La Obra: Corredor vial Lima-Canta-Huayllay-Dv. Cochamarca-Emp. PE 3N Obras de Rehabilitación y Mejoramiento	Personal Encargado: M A N U E L J A V I E R FLORENCIO RADO
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:



Asunto:

SALDO DE OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA – HUAYLLAY DEL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMP.PE 3N
CONTRATISTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU (CONTRATO N° 103-2019-MTC/20)
SUPERVISOR: CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR (CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 077-2014-MTC/20)

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA:

Se pudo conseguir el registro del cuaderno de obra que se muestran en el registro fotográfico de la presente bitácora electrónica.

1) AMPLIACIONES DE PLAZO:

A la fecha se han otorgado las Prórrogas N° 01 y N° 02 por 82 y 16 días calendario, respectivamente.

2) ADICIONALES DE OBRAS:

Se tiene conocimiento que la Supervisión de obra ha presentado a la Entidad una opinión respecto a la solicitud de un adicional de obra presentado por la contratista

3) MAYORES METRADOS:

Se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha presentado informes por Mayores Metrados a la Entidad

4) DEDUCTIVOS:

No se presenta.

5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL:

Se trasladan los excedentes de materiales provenientes de los cortes y/o excavaciones a los DMEs y se están realizando los monitoreos ambientales.

6) MANTENIMIENTO VIAL:

Se están realizando actividades de mantenimiento vial

7) RECURSOS OFERTADOS:

Se ha tramitado la Aprobación del Cambio del cargo de Jefe de Supervisión a favor del Ing. Octaviano Ubillus Jimenez y está por tramitarse el reemplazo del cargo del Ingeniero Residente de Obras Iniciales. La empresa Supervisora Consorcio Cesel – Cal y Mayor Cumple con los recursos ofertados y la empresa Contratista China Road and Bridge Corporation Sucursal Peru No cumple con todos los recursos ofertados.

8) INCIDENTES:

Sin Comentario.

9) PACRI:

Sin Comentario.

10) ARQUEOLOGÍA:

Sin Comentario.

11) OTROS:

La empresa contratista China Road and Bridge Corporation Sucursal Peru ha presentado a la Supervisión Consorcio Cesel – Cal y Mayor la solicitud de prórroga N° 03, Al respecto la Supervisión ha informado a la Entidad a través de su Carta TP145000.992.21.JS

Recomendaciones:

Se recomienda a la Entidad exigir a la Contratista CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU la implementación de las medidas correspondientes para el cumplimiento de sus obligaciones del plazo del programa de obra vigentes a la fecha.

Auditoria Fecha De Creación:

21-01-2021

Auditoria Fecha De Edición:

22-01-2021

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MANUEL JAVIER FLORENCIO RADO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-01-2021

Actividades:
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 9+500 AL KM 10+000
MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

CDescripcion _____:
SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 9+500 AL KM 10+000 CON TRES PEONES CON SUS HERRAMIENTAS, UN RESPONSABLE, UN VIGIA, UNA CAMIONETA RURAL

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
21-01-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: M A N U E L J A V I E R F L O R E N C I O R A D O
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-01-2021

Actividades:
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 38+200
ALCANTARILLA TMC

CDescripcion _____:
SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES PARA LA PARTIDA DE ALCANTARILLA TMC EN SU COMPONENTE DE EXCAVACION PARA EL ALERO DEL LADO DERECHO ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 38+2000 CON TRES TRABAJADORES, UNA VIGIA Y UNA EXCAVADORA CON SU OPERARIO.

2

Foto1:



Foto2:

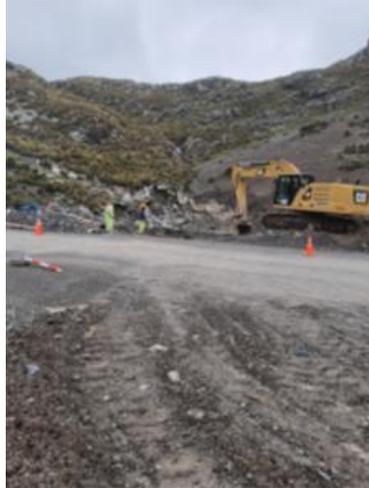


Foto3:



Fecha Toma De Datos:
21-01-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: M A N U E L J A V I E R F L O R E N C I O R A D O
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-01-2021

Actividades:
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 39+405 AL KM 39+490
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

CDescripcion _____:
SE CONSTATÓ LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS DE CONCRETO CICLOPEO LOCALIZADO ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 39+405 AL KM 39+490, CON LA PARTICIPACION DE TRES TRABAJADORES Y DOS VIGIAS, UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE ENCOFRADO.

3


Foto1:



Foto2:



Foto3:

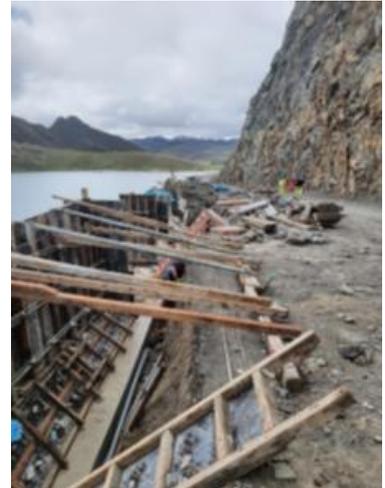

Fecha Toma De Datos:
21-01-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: M A N U E L J A V I E R F L O R E N C I O R A D O
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-01-2021

Actividades:
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 39+785 AL KM 39+835
GAVIÓN TIPO CAJA

CDescripcion_____:
SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES PARA LA PARTIDA DE GAVIÓN TIPO CAJA ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 39+785 AL KM 39+835 CON 12 TRABAJADORES CON SUS HERRAMIENTAS Y UN EQUIPO DE CARGADOR FRONTAL CON SU OPERADOR.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
21-01-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: M A N U E L J A V I E R F L O R E N C I O R A D O
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-01-2021

Actividades:
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 53+800 AL KM 54+000
SUBDREN PROFUNDO

CDescripcion_____:
SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE SUBDREN PROFUNDO CONSISTENTES EN SU ETAPA DE EXCAVACIÓN CON DOS TRABAJADORES, DOS VIGIAS Y UN EQUIPO RETROEXCAVADORA

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
21-01-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MANUEL JAVIER FLORENCIO RADO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-01-2021

Actividades:
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 56+120
ENCOFRADO Y DEENCOFRADO

CDescripcion _____:
SE CONSTATÓ LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE ENCOFRADO EN EL REFORZAMIENTO DEL CANAL DE SEDAPAL LOCALIZADO ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 56+120, CON LA PARTICIPACIÓN DE CUATRO TRABAJADORES, UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS Y HABILITACIÓN DE PANELES Y BARROTAS PARA EL ENCOFRADO Y UN CAMIÓN GRUA.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
21-01-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MANUEL JAVIER FLORENCIO RADO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-01-2021

Actividades:
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 60+585
ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA CORRUGADA

CDescripcion _____:
SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES PARA LA PARTIDA DE ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA CORRUGADA ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 60+585 CON TRES TRABAJADORES, INGENIERO RESPONSABLE, EQUIPOS DE VIBROCOMPACTACIÓN Y UN CARGADOR FRONTAL CON SU OPERARIO.

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
21-01-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: M A N U E L J A V I E R F L O R E N C I O R A D O
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-01-2021

Actividades:
OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 62+182
ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA CORRUGADA

CDescripcion _____:
SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES PARA LA PARTIDA DE ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA CORRUGADA ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 62+182 CON SEIS TRABAJADORES, INGENIERO RESPONSABLE, EQUIPOS APISONADORES, UN EQUIPO RODILLO Y UN CARGADOR FRONTAL CON SU OPERARIO.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
21-01-2021
