




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 020	Fecha Informe: 27-01-2021	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: Il km. 35 al km. 153,50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**




Asunto:

Nro DE INFORME 020

REPORTE DEL MIERCOLES 27 DE ENERO DEL 2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:


- 1)AMPLIACIÓN DE PLAZO: SE TIENE NUEVA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 23 R.D 1772-2020MTC/20 POR 04 DÍAS (FECHA R.D 30-09-2020) NUEVO PLAZO AL 16/12/2021
 - 2)ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE APROBO EL ADICIONAL (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01(KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)
 - 3)MAYORES METRADOS: R.D N° 0747 – 2020 – MTC / 20 SE APROBÓ LOS MAYORES METRADOS N° 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027 Y 028 (AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN)
 - 4)DEDUCTIVOS: CON LA APROBACIÓN DE LA PAO N° 10 SE TIENE EL DEDUCTIVO N° 10.
 - 5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: NO SE EVIDENCIA EN ZONA DE TRABAJO.
 - 6)MANTENIMIENTO DE VIA: EL QUE SE INDICA
- CONTRATISTA
- A.- PERSONAL: 02 VIGÍA, 03 PEON. 01 JEFE DE GRUPO
- B.- MAQUINARIA (INC. OPERADOR) Y EQUIPO: 01 MOTONIVELADORA, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MICRO BUS TRASLADO PERSONAL, 01 CAMIONETA
- 8)INCIDENTES: NINGUNO
 - 9)PACRI: NINGUNO.
 - 10)ARQUEOLOGÍA: NINGUNO
 - 11)OTROS: NINGUNO

Recomendaciones:

NINGUNA.

Auditoria Fecha De Creación:
27-01-2021

Auditoria Fecha De Edición:
30-01-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 27-01-2021

Actividades:
 UBICACION: PROGRESIVAS KM 98+400 AL KM 98+700

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 03 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO
 MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01 RODILLO VIBRADOR, 01 CAMION CISTERNA DE AGUA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL Y 01 CAMIONETA.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 27-01-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 27-01-2021

Actividades:
 UBICACION: PROGRESIVA KM 98+593

CDescripcion_____:

LIMPIEZA DE ALCANTARILLA

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 27-01-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-01-2021

Actividades:

UBICACION: KM 98+700 AL KM 99+000

CDescripcion_____:

Mantenimiento de Vía


Foto1:



Foto2:



Foto3:

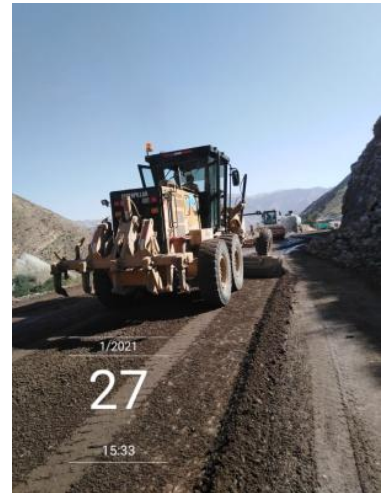

Fecha Toma De Datos:

27-01-2021

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 27-01-2021

Actividades:
UBICACION: KM 99+000 AL KM 99+200

CDescripcion_____:
Mantenimiento de Vía

4


Foto1:



Foto2:



Foto3:

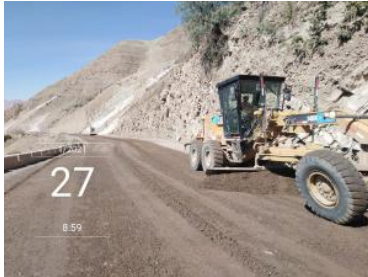

Fecha Toma De Datos:
27-01-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-01-2021

Actividades:

UBICACION: KM 99+200 AL KM 99+400

CDescripcion_____:

Mantenimiento de Vía


Foto1:



Foto2:



Foto3:

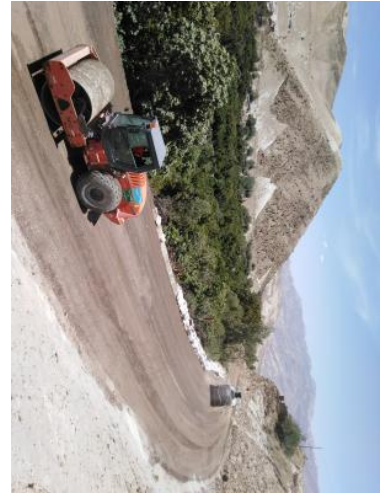

Fecha Toma De Datos:

27-01-2021

5



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 27-01-2021

Actividades:
 UBICACION: KM 99+400 ALKM 99+600

CDescripcion_____:
 Mantenimiento de Vía

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 27-01-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 27-01-2021

Actividades:
 UBICACION: PROGRESIVA KM 99+600 AL KM 99+800

CDescripcion_____:
 Mantenimiento de Vía

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 27-01-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-01-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM 99+800 AL KM 100+000

CDescripcion_____:

Mantenimiento de Vía

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

27-01-2021

8
