



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Nro
Inform
e:
3

Fecha Informe:
01-02-2021

Nombre De La Obra:
Carretera Chuquicara-Puente
Quiroz – Tauca-Cabana-
Huandoval-Pallasca, Tramo:
Tauca- Pallasca

Personal Encargado:
NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:





Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:


Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DIARIO N°03

Foto Bitacora 6:





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

1) Cuaderno de obra:

- El contratista se encuentra relleno.

Es necesario mencionar que, el relleno del cuaderno de obra se está realizando a destiempo a la fecha de la ejecución de las actividades.

2) Ampliaciones de Plazo: con CARTA N° N°2510019-CG-21-0081 de fecha 28/01/2021 la supervisión presentó el Cronograma Actualizado de Obra por la Ampliación de Plazo N°11.

3) Mayores Metrados: Con CARTA N° 052-CONSORCIO ICC-2021/RO el consorcio presentó a la supervisión Mayor Metrado de Banquetas KM 0+000 – 24+000, la supervisión responderá en el lapso de esta semana.

4) Deductivos: A la fecha no existe deductivos.

5) Plan de Manejo Socio ambiental: Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de para DMEs.

6) Mantenimiento Vial: Se está ejecutando.

7) Adicionales de Obras: con CARTA N°2510019-CG-21-0079 de fecha 27/01/2021 la supervisión presentó el Levantamiento de Observaciones N°03 del Adicional N°01.

8) Recursos Ofertados:

Del Contratista

a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; pero es necesario que, en campo se observa pocos frentes de trabajo, trabajos que solo se están realizando en obras de arte (alcantarillas y muro) esto debido a escaso material del agregado y presencia de precipitaciones pluviales constantes. El contratista debe otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal.

b. Maquinaria y Equipo: la mayor cantidad de maquinarias y equipos esta parada.

Del Supervisor

a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; pero en obra se apreció que, a la fecha los especialistas en mención no se encuentran en Obra, el especialista de Costos y Presupuesto Ing. Henry Porta Godoy (Permiso por problemas familiares), el especialista en Trazos, Topografía, Diseño Vial Señalización y Seguridad Vial Ing. Julio Ramírez Ramírez (Descanso-Covid-19), especialista en Hidrología y Drenaje Vial Ing. Jaime Quiroz Ramos (Bajada – Tiempo Parcial), especialista en Manejo Técnico Administrativo de los Contratos en obra Luis Olivera Miranda (Trabaja en la oficina-Lima), el Técnico de Viga Benkelman Tec. Yordy Yeslltsyn Guzmán Bermúdez está apoyando como asistente al área de impacto ambiental; se recomienda que, al haber pocos frentes de trabajo en campo realizar una programación y/o participación adecuada del personal técnico y auxiliar en campo en relación al Calendario Actualizado de Obra, además que, el personal técnico y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así mismo coordinar, con sus homólogos del contratista para evitar demoras en los procesos constructivos de las actividades programadas.

b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados.

9) Incidentes: Ninguno.

10) PACRI:

? Los especialistas estuvieron haciendo coordinaciones para liberar las interferencias sobre la libre disponibilidad de los terrenos afectado por derecho de vía del tramo KM 0+000 al KM 08+000.

? La cantidad de predios en proceso de adquisición y/o expropiación se han incrementado a 984.

? Se ve 118 interferencia de postes eléctricos.

? Hoy 01/02/2021 se realizó una reunión y puntos tratados: Regularización de la junta directiva de la comunidad San Nicolás de Huacachuco. Incumplimiento del plazo de la comunidad para retirar plantaciones (árboles). Inconveniente del km 37+269 para realizar los trabajos de excavación para muro; el propietario al no renovar su DNI oportunamente no se le otorgo el cheque de pago por su predio (PACRI en dos oportunidades no alcanzó otorgar cheque por falta de desinterés en actualizar DNI por parte del propietario).

11) Arqueología: en toda la obra se encuentran 117 evidencias arqueológicas, 8 de ellos son sitios arqueológicos y 9 son segmentos arqueológicos con caminos prehispánicos.

12) Otros:

Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:

- Obras de arte (véase las fotos de los frentes ejecutándose):

? Vaciado de concreto en los aleros de la alcantarilla TMC ø 48 KM 2+702.

? Limpieza para vaciar solado y disposición de acero de muro KM 36+275 - KM 36+315.

? Verificación de los niveles y dimensiones del encofrado de cabezales de entrada y salida de la alcantarilla TMC ø36 ubicada en el KM 29+000.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

?Verificación de los niveles del encofrado de cabezales (entrada y salida) de alcantarilla TMC ø KM 28+748.10.

?Vaciado del cabezal de entrada de la alcantarilla TMC ø36 ubicado en el km 28+386.

•Se aprecia excavación para muro de contención ubicado en el km 37+269 (suspendida por problemas sociales) las actividades fueron suspendidos por problema social; el propietario (Sra. Claudina Tesada Manrique) refiere que no se pagó por su predio, sin embargo al realizar la consulta a PACRI indica que, el propietario al no renovar su DNI oportunamente no se le otorgo el cheque de pago por su predio (PACRI en dos oportunidades no alcanzó otorgar cheque por falta de desinterés en actualizar DNI por parte del propietario).

Recomendaciones:

- Se recomienda al "Consortio ICC" mejorar la logística en toda la obra.
- Se recomienda a la Supervisión "HOB CONSULTORES SAC" que, se recomienda que, al haber pocos frentes de trabajo en campo realizar una programación y/o participación adecuada del personal técnico y auxiliar en campo en relación al Calendario Actualizado de Obra, además que, el personal técnico y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así mismo, coordinar con sus homólogos del contratista para evitar demoras en los procesos constructivos de las actividades programadas.
- Se recomienda que las partes involucradas en la ejecución de obra, presenten y generen respuesta a los documentos técnicos y cuaderno de obra en un tiempo considerable y prudente a fin de evitar demoras en los procesos y/o tramites documentarios y por ende en ejecución de la obra.
- Se recomienda a las partes involucradas en la ejecución de la obra prever eventualidades ante las precipitaciones pluviales.

Auditoria Fecha De Creación:

01-02-2021

Auditoria Fecha De Edición:

02-02-2021

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-02-2021

Actividades:
CONTROL DE TEMPERATURA, RELLENADO DE FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID Y DESINFECCIÓN DE MANOS DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN ANTES REALIZAR SUS ACTIVIDADES.

CDescripcion _____:
- LA LICENCIADA EN ENFERMERIA MARITA VERGARAY VIVAR REALIZA TEMPERATURA, RELLENADO DE FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID Y DESINFECCIÓN DE MANOS DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN ANTES REALIZAR SUS ACTIVIDADES EN CONCORDANCIA A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR MINSA.
- TERMOMETRO

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
01-02-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-02-2021

Actividades:
 VACIADO DE CONCRETO EN LOS ALEROS DE LA ALCANTARILLA TMC Ø 48 KM 2+702.

CDescripcion:
 PERSONAL: AUXILIAR DE LABORATORIO DE SUPERVISIÓN, 2 OFICIAL, 3 PEONES.
 MAQUINARIAS Y EQUIPOS : 1TROMPO, HERRAMIENTAS MANUALES.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 01-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-02-2021

Actividades:
 INICIO DE LA CARRETERA TAUCA - PALLASCA KM 0+000.

CDescripcion:
 INICIO DE TRAMO KM 0+000; SE APRECIA EL CARTEL DE OBRA.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 01-02-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-02-2021

Actividades: MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARADOS UBICADAS EN EL KM 2+000.

CDescripcion_____: MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARADAS: 01 TRACTOR TROPADOR SOBRE ORUGA, 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 1 VOLQUETE.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos: 01-02-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-02-2021

Actividades: ENTREGA DE MASCARILLA KN95 AL PERSONAL DE SUPERVISIÓN.

CDescripcion_____: LA ADMINISTRADORA ENTREGA DE MASCARILLA KN95 AL PERSONAL DE SUPERVISIÓN.

5

Foto1:



Foto2:

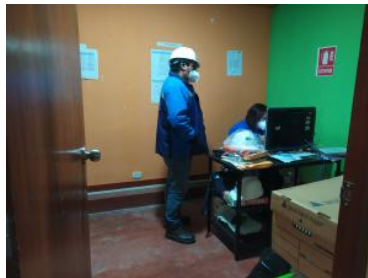


Foto3:



Fecha Toma De Datos: 01-02-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-02-2021

Actividades:
MANTENIMIENTO VIAL DEL KM 25+080 AL KM 25+100.

CDescripcion_____:
PERSONAL: 1 OFICIAL, 2 VIGIAS, 1 OPERADOR, 1 PEON.
MAQUINARIAS UY EQUIPOS: 1 MOTONIVELADORA.
HERRAMIENTAS MANUALES.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
01-02-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-02-2021

Actividades:
 CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA

CDescripcion_____:
 CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE MONITOREO.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 01-02-2021

7



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: Crítico
Fecha De Fotografia: 01-02-2021

Actividades:

EXCAVACION PARA MURO DE CONTENCIÓN UBICADO EN EL KM 37+269 (SUSPENDIDA POR PROBLEMAS SOCIALES)

CDescripcion _____:

LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACION PARA MURO DE CONTENCIÓN UBICADO EN EL KM 37+269 FUERON SUSPENDIDOS POR PROBLEMA SOCIAL; EL PROPIETARIO (SRA CLAUDINA TESADA MANRRIQUE) REFIERE QUE NO SE PAGO POR SU PREDIO, SIN EMBARGO AL REALIZAR LA CONSULTA A PACRI INDICA QUE, EL PROPIETARIO AL NO RENOVAR SU DNI OPORTUNAMENTE NO SE LE OTORGO EL CHEQUE DE PAGO POR SU PREDIO (PACRI EN DOS OPORTUNIDADES NO ALCANZÓ OTORGAR CHEQUE POR FALTA DE DESINTERÉS EN ACTUALIZAR DNI POR PARTE DEL PROPIETARIO).

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
01-02-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-02-2021

Actividades:
LIMPIEZA PARA VACIAR SOLADO Y DISPOSICIÓN DE ACERO DE MURO KM 36+275 - KM 36+315

CDescripcion_____:
PERSONAL: 1OFICIAL, 2OPERARIOS,4 PEONES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
01-02-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-02-2021

Actividades:
VERIFICACIÓN DE LOS NIVELES Y DIMENSIONES DEL ENCOFRADO DE CABEZALES DE ENTRADA Y SALIDA DE LA ALCANTARILLA TMC Ø 36 UBICADA EN EL KM 29+000.

CDescripcion _____:
PERSONAL:
- SUPERVISIÓN HOB:1 TOPOGRAFO, 1OPERARIO DE NIVEL, 2 ASISTENTE DE TOPOGRAFIA.
-CONTRATISTA ICC: 1 TOPOGRAFO, 2 ASISTENTES DE TOPOGRAFIA, 1CAPATAZ, 2 OPERARIOS.
EQUIPOS Y MAQUINARIAS: 2 NIVELES (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA), 1 REGLA PARA NIVEL.

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
01-02-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-02-2021

Actividades:

VERIFICACIÓN DE LOS NIVELES DEL ENCOFRADO DE CABEZALES (ENTRADA Y SALIDA) DE ALCANTARILLA TMC Ø KM 28+748.10.

CDescripcion _____:

PERSONAL:

- SUPERVISIÓN HOB:1 TOPOGRAFO, 1 OPERARIO DE NIVEL, 2 ASISTENTE DE TOPOGRAFIA.
- CONTRATISTA ICC: 1 TOPOGRAFO, 2 ASISTENTES DE TOPOGRAFIA, 1 CAPATAZ, 2 OPERARIOS.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS: 2 NIVELES (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA), 1 REGLA PARA NIVEL.

11

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

01-02-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-02-2021

Actividades:

VACIADO DEL CABEZAL DE ENTRADA DE LA ALCANTARILLA TMC Ø36 UBICADO EN EL KM 28+386.

CDescripcion_____:

PERSONAL: 1 OFICIAL, 1 OPERARIO, 3 PEONES, 2 VIGIAS, 1 OPERADOR, 1 AYUDANTE DE PISO.
EQUIPOS Y MAQUINARIAS: 1 MEZCLADORA DE CONCRETO, 1 VOLQUETE, HERRAMIENTAS MANUALES.

12

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

01-02-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-02-2021

Actividades:

INSTALACIÓN DE PACRI

CDescripcion_____:

LA ABOGADA Y LA ADMINISTRADORA, REFIEREN QUE AÚN NO SE REACTIVA SUS SERVICIOS PARA QUE PUEDAN REALIZAR SUS TRABAJOS FORMALMENTE, PERO AÚN ASI ESTAN REALIZANDO COORDINACIONES CON LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA.

13

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

01-02-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-02-2021

Actividades:

REUNION DE PACRI DE PROVIAS NACIONAL Y LA SUPERVISION HOB.

CDescripcion _____:

PUNTOS TRATADOS:

-REGULARIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMUNIDAD SAN NICOLAS DE HUACASCHUCO.

-INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE LA COMUNIDAD PARA RETIRAR PLANTACIONES (ARBOLES).

-INCONVENIENTE DEL KM 37+269 PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN PARA MURO; EL PROPIETARIO AL NO RENOVAR SU DNI OPORTUNAMENTE NO SE LE OTORGO EL CHEQUE DE PAGO POR SU PREDIO (PACRI EN DOS OPORTUNIDADES NO ALCANZÓ OTORGAR CHEQUE POR FALTA DE DESINTERÉS EN ACTUALIZAR DNI POR PARTE DEL PROPIETARIO).

14

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

01-02-2021
