



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 77	<b>Fecha Informe:</b> 13 - 08 - 2022	<b>Nombre De La Obra:</b> MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM B CONSTRUCCION DE TUNEL Y ACCESOS	<b>Personal Encargado:</b> MANUEL JAVIER FLORENCIO RADO		
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>	
<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	

#### Asunto:

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU, ITEM B: "CONSTRUCCIÓN DE TUNEL Y ACCESOS"

CONTRATISTA: CONSORCIO CARRETERA CUSCO integrado por las empresas CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO. LTD. SUCURSAL DEL PERÚ y GRUPO CONSTRUCTOR & CONSULTOR ASOCIADOS S.A.C. (CONTRATO N° 057-2021-MTC/20.2)

SUPERVISOR: CONSORCIO SUPERVISOR SANTA TERESA integrado por las empresas OBRAS CIVILES CON CALIDAD TOTAL S.A.C. y R & Q INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU (CONTRATO DE SUPERVISION N° 035-2021-MTC/20.2)

Monto del Contrato de Ejecución de Obra: S/ 166 167 111.89

Plazo de la Ejecución de Obra: 900 Días calendario

Inicio del Plazo de Ejecución de Obra: 23 de junio del 2021

Termino de plazo vigente: 10 de abril del 2024

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA AL 31-07-2022:

AVANCE PROGRAMADO:

PERIODO: 2.81 %

TOTAL: 9.68 %

AVANCE EJECUTADO

PERIODO: 4.29 %

TOTAL: 8.53 %

Se precisa que el avance de ejecución de obra se encuentra ligeramente atrasada en 11.88% al 31-07-2022

**Conclusiones:****0) CUADERNO DE OBRA:**

Se informa que a la fecha el último registro obtenido del cuaderno de obra corresponde a la anotación del Asiento N° 463 Del Supervisor, el cual se adjuntó en el reporte del SIGVIAL de fecha 01-08-22.

Se precisa que se viene solicitando el acceso al cuaderno de obra que esta en custodia del contratista en el Sitio de las Obras, recibiendo respuesta que en la presente semana transcurrida, el residente de obra ha efectuado diligencias con reuniones en la Sede Central de Provias Nacional.

Se deja constancia que el suscrito ha mantenido reiteradas solicitudes para el acceso al cuaderno de obra ante el administrador de contratos de la empresa contratista Consorcio Carretera Cusco.

**1) AMPLIACIONES DE PLAZO:**

A la fecha No se han autorizado Ampliaciones de Plazo de la Ejecución de Obra.

Es pertinente informar que La Entidad autorizó la Suspensión de la Ejecución de Obra en el periodo desde el 10 de julio de 2021 hasta el 09 de noviembre de 2021, por lo que el plazo de ejecución de obra se reinició el 10 de noviembre de 2021.

**2) ADICIONALES DE OBRAS:**

Se han tramitado alrededor de cinco solicitudes de expedientes adicionales y se han autorizado dos expedientes adicionales.

Los dos expedientes adicionales autorizados por la Entidad son:

-Mediante la Resolución Directoral N° 2230-2021-MTC/20 del 03/11/2021, la Entidad aprobó el Presupuesto Adicional de Obra N° 01 por el monto de S/ 933,067.74 ”.

-Mediante la Resolución Directoral N° 473-2022-MTC/20 del 22/04/2022, la Entidad aprobó el Presupuesto Adicional de Obra N° 03 por el monto de S/ 62,385.07”.

Con fecha 14-07-2022 la Entidad Provias Nacional se pronunció con la no procedencia del Expediente Técnico de la Prestación Adicional N° 04 Por Obras Civiles Complementarias en la Alcantarilla MCA del Km 6+200 mediante Resolución Directoral N°999-2022-MTC/20

El Consorcio Supervisor Santa Teresa ha informado a la Entidad Provias Nacional el Presupuesto Adicional de Obra N° 05 por la Ampliación de la Cantera 04+980 como Área Auxiliar Cantera Santa Rosa Km 04+980.

**3) MAYORES METRADOS:**

Se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha informado a la Entidad cinco solicitudes del contratista por valorizaciones mensuales de mayores metrados.

También se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha solicitado al contratista que presente la documentación sustentatoria de sus nuevas solicitudes de mayores metrados.

**4) DEDUCTIVOS:**

La Entidad solo ha aprobado un presupuesto deductivo N° 01 vinculante al Adicional de Obra N° 01

**5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL:**

Se constata en campo la habilitación de baños químicos portátiles tipo DISAL y el traslado y deposito del material excedente hacia los DMEs autorizados.

**6) MANTENIMIENTO VIAL:**

Se constata en campo el riego de las vías de tránsito y en los accesos a las áreas auxiliares con camión cisterna de agua

**7) RECURSOS OFERTADOS:**

Se está verificando los recursos de personal profesional de la empresa contratista y los recursos de personal y equipos de la empresa supervisora.

**8) INCIDENTES:**

- sin comentarios

**10) ARQUEOLOGÍA:**

La Supervisión de Obra menciona que está a la espera del Pago para el CIRA a cargo de Provias Nacional para el trámite de Incorporar una nueva área auxiliar para usarlo como DME en el sector denominado “VALDIVIA”.

**11) OTROS:**

La Supervisión de Obra ha presentado con CARTA CE N°0411- 2022/S.SST (P) a Provias Nacional para su tramite correspondiente ante la DGAAM por el asunto de ITS AMPLIACION DME KM 04+980 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

La Contratista viene efectuando sus actividades en su planta chancadora localizada en el Km 4+980 para el procesamiento de los materiales extraídos de la cantera Santa Rosa.

Se informa que existe un control de restricción del tránsito por parte de la contratista de la obra de la Carretera limitando solo el pase vehicular a la zona de la obra en horarios de 9:00 am a 9:30 am y 12 pm a 1:00 pm y 3:00 pm a 3:30 pm en el horario diurno y de 6:00 pm a 7:00 pm y 12 am a 1:00 am en el horario nocturno.

La Contratista y Supervisión vienen evaluando proponer las alternativas de solución debido a las diferencias del Expediente Técnico con lo encontrado en campo como son los casos de:

1.- Diferencias de la Información del Expediente Técnico de Obra con los resultados en campo informados por el Contratista respecto a suelo de Fundación de la Alcantarilla Marco de Concreto Armado del Km 6+200.

2.- Diferencias de la Información del Expediente Técnico de Obra con los resultados en campo informados por el Contratista respecto a suelo de Fundación del Muro de Concreto del Km 8+050.

3.- Sector inadecuado propuesto por el Expediente Técnico de Obra para la ubicación de la Central de Control del Túnel.

4.- Diferencias de la Información del Expediente Técnico de Obra con los resultados en campo informados por el Contratista respecto al diseño Adecuado para vías de acceso en el talud superior de la Salida del Túnel Subterráneo del Km 8+020.

Por el presente Registro del SIGVIAL N° 77 de fecha 13-08-2022, el suscrito deja constancia que en la presente jornada está finalizando el plazo de ejecución de la ORDEN DE SERVICIO N° 0001103 – 2022: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: CARRETERA SANTA MARÍA SANTA TERESA PUENTE HIDROELÉCTRICA DE MACHUPICCHU, ÍTEM B.- CONSTRUCCIÓN DE TÚNEL Y ACCESOS.

**Recomendaciones:**

- Se recomienda a la administración de contratos de Provias Nacional programar reuniones virtuales ZOOM con la participación del Contratista y la Supervisión para evaluar los asuntos pendientes por regularizar de aspectos ambientales, arqueológicos y/o interferencias PACRI para minimizar sus riesgos de afectación al plazo de ejecución de obra.

- Se recomienda a la administración de contratos de Provias Nacional programar reuniones virtuales ZOOM con la participación del Contratista y la Supervisión para evaluar los asuntos de las diferencias de información en campo con las mencionadas en el Expediente Técnico de Obra para optimizar la búsqueda de las soluciones técnicas necesarias para alcanzar las metas del proyecto.

- Se recomienda informar al contratista Consorcio Carretera Cusco el estado de sus solicitudes de suscripción de Adenda por la Suspensión del Plazo de Obra.

- Se recomienda informar al contratista Consorcio Carretera Cusco y al Consorcio Supervisor el estado situacional para el inicio del ejercicio de la Junta de Resolución de Disputas (JRD).

-Se recomienda al Administrador de Contratos de Provias Nacional Exhortar al Contratista CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERÚ para que Justifique su priorización de ejecución de trabajos dentro del tramo de la Progresiva del Km 5+000 al Km 6+000 dentro de su planificación de la obra: "Mejoramiento de la Carretera Santa María – Santa Teresa – Puente Hidroeléctrica Machu Picchu" - "Ítem A: Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Carpeta Asfáltica" (Contrato N° 059-2021-MTC/20.2), Debido a que dicho tramo se superpone como vía de tránsito de las unidades de equipos pesados como camiones mixer y camiones volquetes de la Obra del Túnel que circulan operativamente entre las Áreas auxiliares del Km 4+980 hacia los frentes de la Obra del ÍTEM B: "CONSTRUCCIÓN DE TÚNEL Y ACCESOS", y si el contratista de la carretera prioriza ejecutar trabajos en ese tramo relegando los otros sectores que también dispone para ejecutar trabajos dentro del tramo del Km 8+120 al Km 30+566, se incrementaría el riesgo de demoras en los viajes de las unidades de producción de la obra del Túnel.



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

**Auditoria Fecha De Creación:**

13-08-2022

**Auditoria Fecha De Edición:**

14-08-2022

## PANEL FOTOGRAFICO

### Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

13-08-2022

**Actividades:**

PLANTA DE CONCRETO EN EL KM 4+980

**CDescripcion :**

SE CONSTATÓ QUE SE VIENEN REALIZANDO LAS ACTIVIDADES EN EL HORARIO NOCTURNO PARA LA ELABORACIÓN DE MEZCLA DE CONCRETO PARA SHOTCRETE EN EL FRENTE DE LA PLANTA DE CONCRETO EN EL KM 4+980

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

13-08-2022

**Actividades:**

FRENTE DE ENTRADA DEL TUNEL SUBTERRANEO DEL SECTOR DEL KM 6+432.25

**CDescripcion :**

SE CONSTATÓ QUE SE VIENEN REALIZANDO LOS TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO PARA EL CARGIO DE LOS TALADROS PARA VOLADURA EN ROCA EN EL FRENTE DE ENTRADA DEL TUNEL SUBTERRANEO DEL SECTOR DEL KM 6+432.25 CON PERSONAL TECNICO, MATERIALES Y EQUIPO TELEHANDLER.

2

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

13-08-2022

**Actividades:**

FRENTE DEL TUNEL SUBTERRANEO EN DIRECCION DESDE LA BAHIA HACIA LA SALIDA DEL TUNEL - SECTOR DEL KM 7+223.9

**CDescripcion** :

SE CONSTATÓ QUE SE VIENEN REALIZANDO LOS TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO PARA LA PERFORACIÓN EN ROCA PARA TALADROS EN EL FRENTE DEL TUNEL SUBTERRANEO EN DIRECCION DESDE LA BAHIA HACIA LA SALIDA DEL TUNEL - SECTOR DEL KM 7+223.9 CON PERSONAL TECNICO, MATERIALES Y EQUIPO JUMBO ELECTROHIDRAULICO.

**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

3



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

13-08-2022

**Actividades:**

FRENTE DEL TUNEL SUBTERRANEO EN DIRECCION DESDE LA BAHIA HACIA LA ENTRADA DEL TUNEL - SECTOR DEL KM 6+961

**CDescripcion :**

SE CONSTATÓ QUE SE VIENEN REALIZANDO LOS TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO PARA LA COLOCACIÓN DE PERNOS DE ANCLAJE EN EL FRENTE DEL TUNEL SUBTERRANEO EN DIRECCION DESDE LA BAHIA HACIA LA ENTRADA DEL TUNEL - SECTOR DEL KM 6+961 CON PERSONAL TECNICO, MATERIALES Y EQUIPO TELEHANDLER.

4

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

13-08-2022


**Actividades:**

CONTROL DEL PERSONAL ESPECIALISTA DEL CONTRATISTA

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

SE REALIZÓ EL CONTROL DE ASISTENCIA EN EL SITIO DE LAS OBRAS DEL PERSONAL ESPECIALISTA DEL CONTRATISTA CONSORCIO CARRETERA CUSCO, EN SUS OFICINAS Y EN CAMPO, LOCALIZADAS EN EL SITIO DE LAS OBRAS.

**Foto1:**

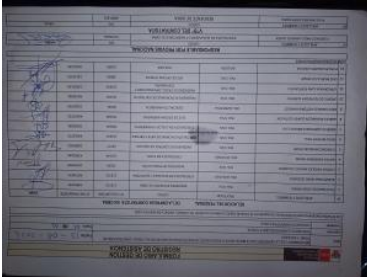

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

5





### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

13-08-2022

**Actividades:**

VERIFICACION DE LOS RECURSOS DEL SUPERVISOR DE OBRA

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

SE REALIZÓ LA VERIFICACION DE LOS RECURSOS DE LA EMPRESA DE SUPERVISION DE OBRA CONSORCIO SUPERVISOR SANTA TERESA EN EL SITIO DE LAS OBRAS.

6

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)
