



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	004	14 - 01 - 2023	Rehabilitación y Mejoramiento de Obra Carretera Lima - Canta - La Viuda- Unish, tramo Canta- Huayllay	BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

Foto Bitacora:



[Ver imagen completa](#)

Foto Bitacora 2:



[Ver imagen completa](#)

Foto Bitacora 3:



[Ver imagen completa](#)

Foto Bitacora 4:



[Ver imagen completa](#)

Foto Bitacora 5:



[Ver imagen completa](#)

Foto Bitacora 6:



[Ver imagen completa](#)

Asunto:

NUMERO DE INFORME No. 004-2023
 CONTRATO DE OBRA: No. 103-2019-MTC/ 20 de fecha 24/09/2019
 EMPRESA CONTRATISTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU
 OBRA: SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY –DV. COCHAMARCA – EMP.PE 3N" (SALDO DE OBRAS INICIALES (OI) TRAMO 2 CANTA - HUALLAY LONGITUD: 95.2 KMS.
 MONTO DE OBRAS INICIALES : 338,725,656.80
 SUPERVISOR: CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR
 CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 077-2014-MTC/20) ADENDA No. 4 DE FECHA,24-09-2019
 LA OBRA ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN SUSPENSIÓN , SOLO SE REALIZA LABORES EMERGENCIA Y SUBSANACION DE OBSERVACIONES EN EL TRAMO 2 Y SE REALIZA LABORES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN LOS TRAMOS 1,3 Y 4
 VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION Y CONTRATISTA
 HOY SE REALIZO VISITA A CAMPO, DONDE SE REALIZO LA VERIFICACION DE ACTIVIDADES DE SUBSANACION DE OBSERVACIONES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE FISCALIZACION DE PROVIAS NACIONAL HASTA LA PROGRESIVA KM. 37+600
 ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN SUSPENSIÓN HASTA EL 31-03-2023

**Conclusiones:**

0) CUADERNO DE OBRA: El cuaderno de obra esta en manos de la Contratista. Hoy se ha logrado el acceso al cuaderno de obra. Donde la anotación mas importante del día 12-12- 2022 al día 15-12-2022 es la siguiente:

ASIENTO No.1775 del CONTRATISTA ASUNTO : INICIO Y FIN DE CAUSAL DE PRORROGA DE FIN DE O. INICIALES REFERENCIA: a) ASIENTO No. 1774 DEL CONTRATISTA b) R.D. No. 1803-2022-MTC

Habiendo en la fecha sido notificados mediante resolución de la referencia b) la aprobación de la prestación adicional de obra No. 09 y deductivo vinculante No, 09 y acorde con la condición especial del contrato CGC 28.2, dejamos constancia del inicio y el fin del causal de prórroga de fecha de término de obras iniciales por lo cual cuantificaremos y sustentaremos esta solicitud de prórroga el cual es necesaria en el plazo establecido en el CGC antes mencionada.

2) ADICIONALES DE OBRAS: Mediante la Resolución Directoral N° 0278-2021-MTC/20.2.101.1 denominado: "Cambio de ubicación de plantas industriales del km 89+500 y km 83+700 al km

80+150". se ha aprobado Adicionales N° 02, N° 03 y N° 4 y se ha aprobado un Adicional No.5, Se ha tramitado Adicional No. 6 (mejoramientos a nivel de subrasante) y Aprobado el adicional 7 (diseño de MAC desde Km. 20+900 al Km. 34+000), se ha aprobado el adicional No. 08 (bases y subbases). Se esta tramitando adicional No 9 y 10, el Adicional 10 fue devuelto a la Contratista.

3) MAYORES METRADOS: Se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha presentado informes a la Entidad por el asunto de Mayores Metrados por la Entidad y ha comunicado al contratista las observaciones a los informes elaborados por el mencionado contratista. En resumen la Contratista va ha realizar la subsanación de observaciones y los informes de los expedientes de mayores cantidades. Se ha tramitado ante la Supervisión, informe técnico de mayores cantidades correspondiente a geomembrana tipo2 para los pedraplenes y correspondientes a transporte de derrumbes en las progresivas Km. 59 al Km, 73. la Contratista ha tramitado la subsanación de observaciones del trámite de mayores cantidades de derrumbes en el Km. 25 al Km. 35. se ha tramitado la subsanación de mayores cantidades de partidas de banquetas para relleno sector km. 66+000 al Km. 95+000.

4) DEDUCTIVOS: Mediante la Resolución Directoral N° 0278-2021-MTC/20.2.101.1 de fecha 15 de junio del 2021, la Entidad aprobó el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01. se tramitara un deductivo vinculante No. 6 Y 7

5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL: Se visualiza la disposición de baños portátiles tipo DISAL, Se observa el uso de un camión cisterna para el mojado de la vía como acción antipolvo, en diferentes zonas.

6) MANTENIMIENTO VIAL: se realiza solo actividades DE MANTENIMIENTO VIAL MINIMAS (regado de accesos) y emergencias.

7) RECURSOS OFERTADOS:
DEL CONTRATISTA

a) PERSONAL: En el sitio hoy se verifica la presencia del residente de la obra , especialista en suelos, ambiental, Ing. de trazo y topografía, Ing. de producción, jefe de oficina técnica personal técnico y obrero de las actividades de conservación en el sitio de la obra, puesto que actualmente solo se realizan actividades de conservación y mantenimiento vial., Tambien realizan actividades de subsanación de observaciones de HALLASGOS detectados por la Dirección de Fiscalización de PROVIAS NACIONAL

b) MAQUINARIA Y EQUIPO: : Hoy se realizo visita de verificación de maquinarias en el sitio de la obra hasta el km 95+600 encontrando los siguientes equipos y maquinarias : 2 motoniveladora 3 vibrocompactadores de rodillo, 6 cargador frontal , 2 excavadora de oruga, 2 excavadora neumática, 3 rock drill, 2 retroexcavadora, 20 camiones de volteo, 1 camión cisterna
DE LA SUPERVISIÓN:

a) PERSONAL : Se verifica hoy solo la presencia del jefe de supervisión , donde para las obras iniciales solo labora el especialista de seguridad, un técnico, se verifico la presencia de los especialistas de conservación, personal técnico y administrativo, realizando labores en el tramo 1,3 y 4

b) MAQUINARIA Y EQUIPO: hoy se verifico 4 camionetas 4x4 y 4 conductores , 1 DEL TRAMO 2 Y 3 DEL TRAMO 1,3 Y 4

8) INCIDENTES: Hoy no se tiene información de INCIDENTES

10) ARQUEOLOGÍA: Existe un tramo de 4 km, (km. 21 al km. 25) Existen 6sectores de la zona Arqueológica, que tiene que se tiene que realizar rescate. hasta el momento no estan liberados.

11) OTROS: Las condiciones del clima en la zona, hoy es soleado en toda la mañana y lluvias en horas de la tarde y noche hay lluvias, granizo y friaje, en todo el tramo 2 (OBRAS INICIALES) en la Via canta Huallay .Hasta ahora con la valorización del mes de diciembre 2022 de acuerdo a lo ejecutado, aprobado y corregido por la supervisión se encuentra ATRASADA. Actualmente la obra se encuentra en SUSPENSIÓN hasta el 31-03-2023. La Contratista solo realiza labores de



subsanción de observaciones realizados por la Dirección de Fiscalización, mantenimiento vial y acciones de emergencias

Recomendaciones:

Se recomienda a la Contratista realizar la subsanción de observaciones de las Mayores Cantidades y de los Adicionales tramitados ante Supervisión. puesto que las mismas fueron devueltas por la Supervisión desde el mes de SETIEMBRE 2022 y hasta la fecha no se subsana todas observaciones. se le ha reiterado la subsanción de observaciones y hasta la fecha no lo hacen.

Se recomienda a la Contratista la INMEDIATA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION A LOS USUARIOS DE LA VIA, por los constantes incidentes y accidentes de tránsito ocurridos hasta la fecha,

Se recomienda a la Contratista a presentar la subsanción de observaciones de los informes técnicos de obras adicionales pendientes por tramitar, se le ha participado en varias ocasiones la entrega de los trámites correspondiente para su trámite una vez de reinicie las actividades.

Se recomienda a la Contratista, la urgente incremento de colocación de señal informativa, preventiva y reglamentaria (provisional o definitiva) en la vía y el regado de la misma para disminuir la

generación de polvo (Que disminuye la visibilidad) en las zonas sin asfalto, puesto que la vía está en mejores condiciones de transitabilidad, motivando a los Usuarios a ir a mayor velocidad, incrementando el riesgo a accidentes e incidentes en el tramo 2 (obras iniciales). La Contratista deberá merecer la correspondiente penalidad de acuerdo a lo exigido en su contrato. Se participa a la Supervisión, que si se demuestra evidencias que no se adoptaron oportunamente las acciones necesarias para un correcto trabajo que permita la señalización (diurna y nocturna) durante la ejecución de la obra y por no haber adoptado las acciones necesarias para que el Contratista ejecute la señalización que la Obra requiere y brindar seguridad al usuario con el fin de evitar accidentes, se la aplicara la penalidad que corresponda, de acuerdo a los TDR.

Se recomienda a PROVIAS NACIONAL la pronta aprobación del Adicional No. 10,11 y No.12 (ampliaciones de plazo) de la Supervisión donde se incluye los recursos de la Supervisión.

Es necesario que PROVIAS NACIONAL suministre una movilidad permanente (camioneta alquilada) para al monitor para realizar las constataciones, seguimiento y monitoreo en el sitio de la obra. Hasta la fecha NO hay Camioneta ocasionando muchos inconvenientes para realizar el seguimiento y monitoreo en campo

Auditoría Fecha De Creación:

14-01-2023

Auditoría Fecha De Edición:

16-01-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

14-01-2023

Actividades:

PROGRESIVA KM. 4+360 A KM. 4+600
VISITA DE CONSTATAION DE ACTIVIDADES DE SUBSANACION DE OBSERVACIONES DE HALLAZGOS DETECTADOS POR DIRECCION DE FISCALIZACION: HALLAZGO No. 1 (VEGETACION EN ZONA DE CUNETAS) SE REALIZA LIMPIEZA DE VEGETACION EN CUNETAS

CDescripcion :

En las progresivas Km. 4+360 al Km. 4+600 se realiza visita de constatación a los HALLAZGOS detectados por la Dirección de Fiscalización de PROVIAS NACIONAL, Donde se verifica que la contratista , continua realizando labores de limpieza de vegetación en cunetas en el sector, Se utiliza un cargador frontal y herramientas menores, trabajan : 1 capataz, 1 operador, 2 obreros, 2 vigías.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-01-2023

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

14-01-2023

Actividades:

PROGRESIVA KM. 4+200 A KM. 4+600
VISITA DE CONSTATAION DE ACTIVIDADES DE SUBSANACION DE OBSERVACIONES DE HALLAZGOS DETECTADOS POR DIRECCION DE FISCALIZACION: HALLAZGO No. 1 (VEGETACION EN ZONA DE CUNETAS) : LIMPIEZA DE VEGETACION EN CUNETAS

CDescripcion :

En las progresivas Km. 4+200 al Km. 4+600 se realiza visita de constatación a los HALLAZGOS detectados por la Dirección de Fiscalización de PROVIAS NACIONAL, Donde se verifica que la contratista , ha culminado de realizar labores de limpieza de vegetación en cunetas en el sector, Se constata insitu la limpieza de las cunetas.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-01-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

14-01-2023

Actividades:

PROGRESIVA KM. 5+540

VISITA DE CONSTATACION DE ACTIVIDADES DE SUBSANACION DE OBSERVACIONES DE HALLAZGOS DETECTADOS POR DIRECCION DE FISCALIZACION: HALLAZGO No. 1 (DERRUMBES EN ZONA DE CUNETAS): CONTINUA LA PRESENCIA DE DERRUMBES EN ZONA DE CUNETAS

CDescripcion :

En la progresiva Km. 5+540 se realiza visita de constatación a los HALLAZGOS detectados por la Dirección de Fiscalización de PROVIAS NACIONAL, Donde se verifica nuevamente que la contratista ,en este sector todavía no ha realizado actividades de limpieza en el sector, porque en la zona señalada hasta la fecha se observa escombros de derrumbes que invaden las cunetas.

Foto1:




[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

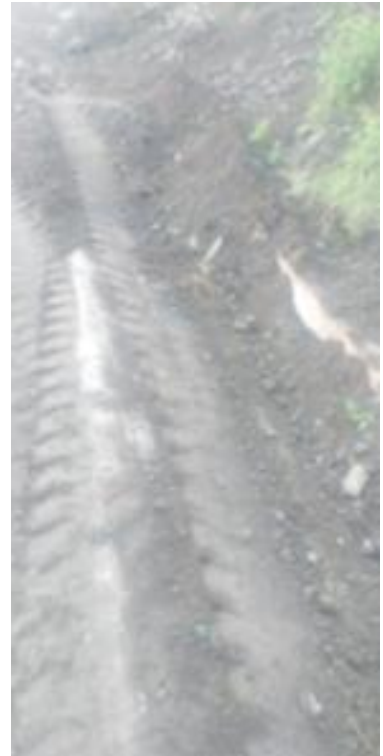

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-01-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

14-01-2023

Actividades:

PROGRESIVA KM. 5+640

VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL TRAMO 2 (OBRAS INICIALES) :
CAIDAS DE ROCA

CDescripcion :

En la progresiva Km. 5+640 se verifica que ha ocurrido caídas de roca, por las lluvias ocurridas en horas de la noche, se recomienda labores de remoción de derrumbes, en zona de cunetas para el libre escurrimiento de las aguas superficiales en este punto.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-01-2023

4



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

14-01-2023

Actividades:

PROGRESIVA KM. 6+060 AL KM. 6+200

VISITA DE CONSTATAACION DE ACTIVIDADES DE SUBSANACION DE OBSERVACIONES DE HALLAZGOS DETECTADOS POR DIRECCION DE FISCALIZACION: HALLAZGO No. 1 (VEGETACION EN ZONA DE CUNETAS): LIMPIEZA DE CUNETAS CON VEGETACION

CDescripcion :

En las progresivas Km. 6+060 al Km. 6+200 se realiza visita de constatación a los HALLAZGOS detectados por la Dirección de Fiscalización de PROVIAS NACIONAL, Donde se verifica que la contratista , realizo labores de limpieza de cunetas en el sector,

Foto1:




[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

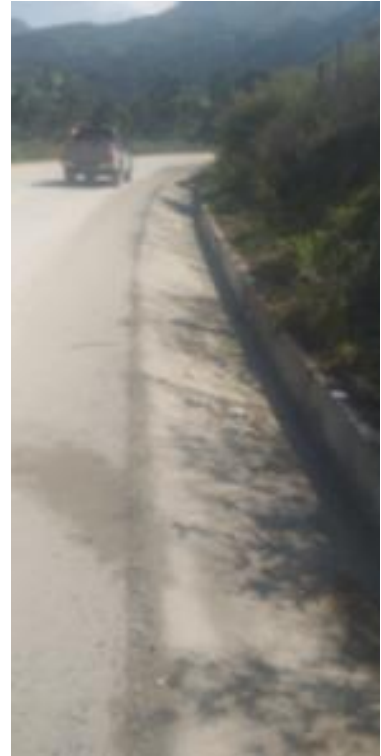

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-01-2023

5



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

14-01-2023

Actividades:

PROGRESIVAS KM. 10+800 AL KM. 10+840

VISITA DE CONSTATAION DE ACTIVIDADES DE SUBSANACION DE OBSERVACIONES DE HALLAZGOS DETECTADOS POR DIRECCION DE FISCALIZACION: HALLAZGO No. 1 (DERRUMBES EN ZONA DE CUNETAS)

CDescripcion :

En las progresivas Km. 10+800 a Km. 10+840 se realiza visita de constatación a los HALLAZGOS detectados por la Dirección de Fiscalización de PROVIAS NACIONAL, Donde se verifica nuevamente que la contratista ,en este sector ya ha realizado actividades de limpieza en el sector, A la fecha no se observa derrumbes que invaden las cunetas

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-01-2023

6



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

14-01-2023

Actividades:

PROGRESIVAS KM. 10+300 A KM.10+800
VISITA DE CONSTATAION DE ACTIVIDADES DE SUBSANACION DE OBSERVACIONES DE HALLAZGOS DETECTADOS POR DIRECCION DE FISCALIZACION: HALLAZGO No. 1 (DERRUMBES EN ZONA DE CUNETAS)
LIMPIEZA DE CUNETAS REALIZADA

CDescripcion :

En las progresivas Km. 10+300 al Km. 10+800 se realiza visita de constatación a los HALLAZGOS detectados por la Dirección de Fiscalización de PROVIAS NACIONAL, Donde se verifica que la contratista ,en este sector ha realizado actividades de limpieza en el sector, se verifica la realización de remoción de escombros de derrumbes y de vegetación en las cunetas Se utiliza una retroexcavadora y herramientas menores, trabajan 1 capataz, 3 obreros y 2 vigias.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-01-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

14-01-2023

Actividades:

PROGRESIVAS KM. 13+050 hasta KM. 13+380
VISITA DE CONSTATAION DE ACTIVIDADES DE SUBSANACION DE OBSERVACIONES DE HALLAZGOS DETECTADOS POR DIRECCION DE FISCALIZACION: HALLAZGO No. 2 (OBSTRUCCION DE ESCOMBROS POR DESPRENDIMIENTO DE TALUD),

CDescripcion :

En las progresivas km. 13+050 a Km. 13+380 se realiza visita de constatación a los HALLAZGOS detectados por la Dirección de Fiscalización de PROVIAS NACIONAL, Donde se verifica nuevamente que la contratista ,en este sector ha realizado parcialmente actividades de demolición de rocas que obstruyen la vía, donde la roca es muy dura, es necesario realizar actividades de detonación de las mismas, para poder retirarlos En la zona señalada se verifica que han disminuido el volumen de roca que obstruye la vía, actualmente se solo se realiza la remoción de escombros existentes dentro de las cunetas

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-01-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

14-01-2023

Actividades:

PROGRESIVA KM. 22+400 a km. 22+600
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN EL TRAMO 2 (OBRAS INICIALES):
LABORES DE MANTENIMIENTO VIAL

CDescripcion :

En las Progresivas Km. 22+400 al Km. 22+600 se realiza visita de seguimiento y monitoreo al tramo 2 (Obras Iniciales) donde se realiza la conformación de la superficie en diferentes sectores, Se utiliza una Motoniveladora, y una compactadora de rodillo. trabajan: 1 capataz, 2 operadores, 2 obreros y 2 vigias

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-01-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

14-01-2023

Actividades:

PROGRESIVAS KM. 37+600 A KM. 36+925

VISITA DE CONSTATAACION DE ACTIVIDADES DE SUBSANACION DE OBSERVACIONES DE HALLAZGOS DETECTADOS POR DIRECCION DE FISCALIZACION: HALLAZGO No. 3 (FALTA DE SEÑALIZACION PREVENTIVA): SE HA COLOCADO SEÑALIZACION VERTICAL EN EL SECTOR

CDescripcion :

En las progresivas Km. 37+600 al 36+925 se realiza visita de constatación a los HALLAZGOS detectados por la Dirección de Fiscalización de PROVIAS NACIONAL Donde se verifica que la contratista , en el sector ha realizado la colocación de señalización preventiva en el sector, se verifica la colocación de avisos preventivos en el sitio (de ida y vuelta)

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-01-2023

10



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

14-01-2023

Actividades:

PROGRESIVA KM. 0+150
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS OFICINAS DEL CONTRATISTA : EN
BUSCA DEL CUADERNO DE OBRA

CDescripcion :

En la progresiva Km. 0+150 se realiza visita de seguimiento y monitoreo a las oficinas de la contratista en busca del cuaderno de obra, se logro acceso al mismo.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-01-2023

11
