



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	085-2023-OMATE-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	26-05-2023	Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME N° 085-2023-OMATE-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL VIERNES 26 DE MAYO DEL 2023

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL DEL SUR (COSAPI - OHLA PERU)

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR VIAL AREQUIPA

Conclusiones:

SE REALIZO LA CONSTACION DE LA CARRETERA CON LOS JUECES DE PAZ:

DISTRITO TORATA SRA. CLARIBEL SOSA	JURISDICCION KM 35+000 AL KM 76+000
DISTRITO QUINISTAQUILLAS SR.	JURISDICCION KM 76+000 AL KM 84+000
DISTRITO COALAQUE SRA. NINFA CAMPANO	JURISDICCION KM 106+000 AL KM 140+960
DISTRITO PUQUINA SR. EDGARDON FUENTES	JURISDICCION KM 140+960 AL KM 153+500

JEFE DE SUPERVISION: ING. JAVIER BALANDRA ARIAS

JEFE ZONAL TACNA PVN : INGENIERA LILIANA PRIETO

MONITOR DE OBRA PVN : ING. NESTOR A. CUTIPA MONZON

CONCLUSIONES:

EN EL RECORRIDO CON LOS CUATRO JUEZ EN FORMA INDIVIDUAL CADA CUAL EN SU JURISDICCION, SE VERIFICO QUE EN LA PROGRESIVA KM 134+700 SE CONTINUA REALIZANDO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA VIA (01 CISTERNA, 01 RODILLO Y 01 MOTONIVELADORA), EN EL RESTO DE LA CARRETERA JURISDICCION DE LOS CUATRO JUEZ DE PAZ NO SE EVIDENCIA TRABAJOS DEL CONTRATISTA.

ADEMAS SE INFORMA QUE CON EL JUEZ DE PAZ DE OMATE SR. MANUEL GAMERO NO SE LE PUDO UBICAR, PESE A QUE SE LE HABIA SOLICITADO VERBALMENTE REALIZAR UNA CONSTATACION EN SU TRAMO DE JURISDICCION QUE ES DEL KM 84+000 AL KM 106+000 (CERRO BLANCO)

FINALMENTE, EN EL TRAMO DEL SR. MANUEL GAMERO JUEZ DE PAZ DE OMATE, SE APRECIA AL CONTRATISTA REALIZANDO TRABAJOS DE CORTE EN LA PROGRESIVA KM 103+300 CON LA SIGUIENTE MAQUINARIA: 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 01 VOLQUETE 15 M3 Y 01 GARGADOR SOBRE LLANTAS (DME 106); ESTAS DOS ULTIMAS MAQUINAS VENIAN REALIZANDO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, FINALMENTE SE VIO UN TRACTOR D-8 ESTACIONADO Y SIN OPERADOR EN EL ACCESO DEL DME 106.



Recomendaciones:

EN ESTE PLAZO DE REINICIO DE EJECUCION DE OBRA SOLO HAN LLEGADO DOS MAQUINARIAS A LA FECHA: 01 TRACTOR D-8 Y 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, EL RESTO DE MAQUINARIA QUE SE ENUMERA EN EL INFORME, YA VENIAN REALIZANDO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO A LA CARRETERA.

Auditoria Fecha De Creación:

29-05-2023

Auditoria Fecha De Edición:

29-05-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

26-05-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 103+300 SECTOR TAMAÑA

SE TIENE TRABAJOS DE CORTE POR PARTE DEL CONTRATISTA EN LA VARIANTE DEL KM 102 AL KM 108

CDescripcion _____ :

SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA:

01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS


01 VOLQUETE DE 15 M3 (MAQUINARIA DEL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA)

01 CARGADOR FRONTAL EN ELDME 106 (TAMBIEN MAQUINARIA QUE ESTUVO PARA EL MANTENIMIENTO)

01 TRACTOR ORUGA ESTACIONADO Y SIN OPERADOR EN EL ACCESO DEL DME 106 (CERRO BLANCO)

1

Foto1:

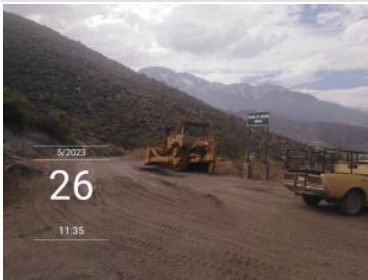

[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

29-05-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-05-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 108+200

CAMPAMENTO DEL CONTRATISTA - DISTRITO COALAQUE

CDescripcion _____ :

SE VERIFICO EL PERSONAL CLAVE (ONCE ESPECIALISTAS) DEL CONTRATISTA POR PARTE DE LA JUEZ DE PAZ DE COALAQUE : SRA NINFA CAMPANO CHIRE

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

29-05-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-05-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 134+700

CDescripcion _____ :

SE VERIFICO POR PARTE DE LA JUEZ DE PAZ DE COALAUQUE : SRA NINFA CAMPANO CHIRE
QUE SE VIENE REALIZANDO EL MANTENIMIENTO DE LA VIA

MAQUINARIA(INCL. OPERADOR)

: 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA.

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-05-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

26-05-2023

Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 106+000 AL KM 140+960

CDescripcion _____ :

LA JUEZ DE PAZ DE COALAQE SRA. NINFA CAMPANO CHIRE, REALIZO LA CONSTATAcion DE LA CARRETRA EN EL AMBITO DE SU JURISDICCION.


4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

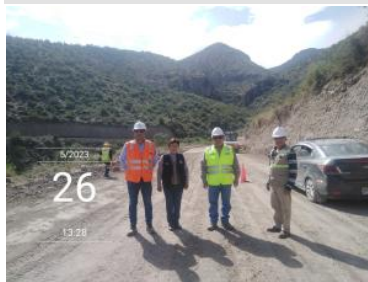

[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

29-05-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

26-05-2023

Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 140+960 AL KM 153+500

CDescripcion _____ :

CON EL SR. EDGARDO FUENTES JUEZ DE PAZ DEL DISTRITO DE PUQUINA
SE REALIZO LA CONSTATAACION DE LA CARRETRA EN SU JURISDICCION

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

29-05-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

26-05-2023

Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 76+000 AL KM 87+000

DEL PUENTE EL CHORRO MARGEN DERECHA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
SERVIDAS

CDescripcion_____:

SE REALIZO LA CONSTATAION DELA CARRETRA CON EL JUEZ DE QUINISTAQUILLAS EN EL
AMBITO DE SU JURISDICCION

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

29-05-2023
