



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	12	22 - 07 - 2023	Culminacion de Obra del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Rodriguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)	MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Foto Bitacora:




[Ver imagen completa](#)

Foto Bitacora 2:



[Ver imagen completa](#)

Foto Bitacora 3:




[Ver imagen completa](#)

Foto Bitacora 4:



[Ver imagen completa](#)

Foto Bitacora 5:



[Ver imagen completa](#)

Foto Bitacora 6:



[Ver imagen completa](#)

#### Asunto:

cuaderno de obra en oficina de la supervisión

#### Conclusiones:

la información técnica del cuaderno de obra se encuentra atrasada, por motivo de tenencia de la supervisión. en el presente día se lleva laborando de la progresiva 18+520 a 17+920 ambos lados en un avance del 70%, se encuentra en proceso de llegar a la cota de sub rasante con la compactación del hormigón al 95% de su máxima densidad, inicia el proceso de control de calidad de la capa en los puntos exigidos de control.

#### Recomendaciones:

el personal que presenta en la nomina de asistentes para el control de calidad en suelos no se presenta en campo ni en oficina.

#### Auditoria Fecha De Creación:

22-07-2023

#### Auditoria Fecha De Edición:

23-07-2023

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

22-07-2023

**Actividades:**

Actividades de seguridad ocupacional

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

conformidad a la reunión de seguridad por la contratista en las instalaciones de su oficina principal Soritor

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

22-07-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Moderado

### Fecha De Fotografía:

22-07-2023

### Actividades:

- 1.- colocación de capa de mejoramiento de sub rasante en lado izquierdo y derecho 18+580 a18+460
- 2.- control de calidad - suelos

### CDescripcion\_\_\_\_\_:

se tiene 02 rodillos, 02 motos, 02 excavadora, 01 cisterna, 06 volquetes

en la foto se observa el proceso de batido y unión del lado derecho e izquierdo ante una saturación del material

luego de esta se procede al compactado de las mismas con el bombeo para evitar retención de humedad

para el control de calidad se observa deficiencias en la toma de datos de la supervisión, consultando constantemente con la contratista. queda observado

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

22-07-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

22-07-2023

**Actividades:**

en 18+530 mejoramiento de la sub rasante lado derecho y la aplicación de piedras 6" en zonas inestables para el lado izquierdo

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

vista atrás, delante y costado dela progresiva 18+530 izquierda, se observa el reforzamiento con una capa de piedras de rio 8" aplicada debajo del nivel del mejoramiento se considera un mejor comportamiento con la instalación del dren la cual mantendrá seco las capas que se encuentran saturadas y que al ser arcillas tienen un proceso lento de estabilización se debe apuntar que se encontró tuberías plásticas de agua ya fuera de uso las cuales se han roto o retirado al costado de la zona intervenida. el corte de talud cercano al poste considera una una deformación en defensa de la estabilización de su cimentación.

3

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

22-07-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografía:**

22-07-2023

**Actividades:**

en 19+200 tenemos eliminación de corte lado izq

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

la contrata avanza con el corte de talud, previamente en el lado de la supervisión informa su consentimiento al monitor. posterior se revisa el botadero constatándose que labora 01 botcat y 01 rodillo conservando la plataforma de relleno.

4

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

22-07-2023



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

22-07-2023

**Actividades:**

revisión de labores de Seguridad ocupacional en Supervisión

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

visita el los ambientes de la supervisión: se observa el equipo técnico incompleto no acorde a la asistencia que presenta su personal de control. el cuaderno de obra se encuentra en la oficina de supervisión al termino del día

5

**Foto1:**




[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

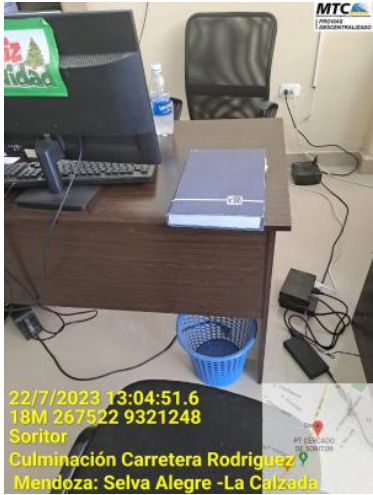

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

23-07-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografía:**

22-07-2023

**Actividades:**

control de calidad de la supervisión y la contratista en la progresiva 18+620 a la altura del paso aéreo de agua.  
se anota 10:45 conversación con el administrador de Provias con el monitor.  
se anota la visita en obra del residente de la contratista

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

control realizado con los auxiliares de laboratorio de forma consultante con los técnicos de la contratista.

6

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

23-07-2023



**Fotos:**
