




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 29	Fecha Informe: 14 - 08 - 2023	Nombre De La Obra: Culminacion de Obra del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Rodriguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)	Personal Encargado: MOISES EDISON CALDERON BELTRAN
---------------------------------	---------------------------	---	---	--

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 4:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---	---	---	--	--	--

Asunto:

hoy se cuenta con nuevo residente
las labores se paralizan por material saturado por presencia de lluvias
la chancadora se encuentra en plena producción.

Conclusiones:

las labores de campo se suspenden
las labores de gabinete en progreso

Recomendaciones:

se recomienda a residencia el solicitar a irsa norte efectuar los permisos por liberar la zona 0+00 a lo que responde que la entidad debe de entregarlo con la entrega del terreno. se coordinará con el administrador del contrato

Auditoria Fecha De Creación: 12-08-2023	Auditoria Fecha De Edición: 15-08-2023
---	--

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

14-08-2023

Actividades:

dia con lluvia paralización de labores de obra para la contratista, se verifica labores de gabinete en la residencia y la supervisión

CDescripcion_____:

El día de hoy las lluvias intermitentes matinales ha dejado las superficies saturadas foto en a ciudad de soritor en afuera de la contrata, tramo 12+600 y laboratorio de suelos, con los resultados del control granulométrico de la chancadora.

Foto1:




[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

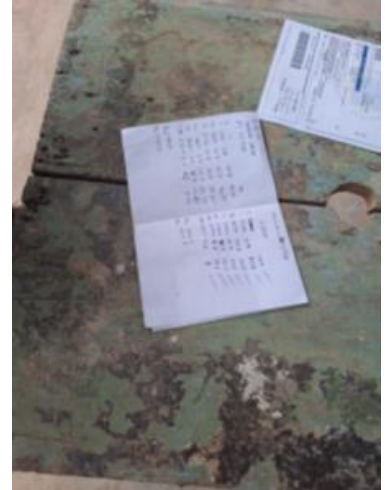

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-08-2023

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

14-08-2023

Actividades:

19+570 a 19+400

CDescripcion _____:

colocacion de over pues poblacion efectuo recojo de tubo no autorizado por la noche

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

12-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

14-08-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

19+560 sustraccion de tuberias

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

12-08-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-08-2023

Actividades:

levantamiento rivernio

CDescripcion _____ :

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

12-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografía:

14-08-2023

Actividades:

verificación de labores paralizadas por día de lluvia

CDescripcion _____ :

verificación de labores paralizadas en la progresiva 19+360 : tendido de material hormigón con proceso de compactación aplicando rodillo pata de cabra, se observa las huellas saturadas.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-08-2023

5



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

14-08-2023

Actividades:

verificación de paralización de labores por clima con lluvias

CDescripcion _____:

en la progresiva 19+500 encontramos 01 bocat, 02 excavadoras, 02 rodillos estacionados

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

14-08-2023

Actividades:

visita a planta chancadora; chancadora en producción
Equipo operando: 01cargador frontal, 01 excavadora

CDescripcion_____:

se encuentra en producción, abastecida por cargador y dosificándose el material de base
dosificación empleada arena/piedra: 1/4
cargador lo dosifica y excavadora lo mezcla: se encuentra en la zona una excavadora sin cucharon en proceso de reparación.

7

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-08-2023



Fotos:
