




## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 29	<b>Fecha Informe:</b> 14 - 08 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Culminacion de Obra del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Rodriguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)	<b>Personal Encargado:</b> MOISES EDISON CALDERON BELTRAN
---------------------------------	---------------------------	---	---	--

<b>Foto Bitacora:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 2:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 3:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>
---	---	---	---	--	--

#### Asunto:

hoy se cuenta con nuevo residente  
las labores se paralizan por material saturado por presencia de lluvias  
la chancadora se encuentra en plena producción.

#### Conclusiones:

las labores de campo se suspenden  
las labores de gabinete en progreso

#### Recomendaciones:

se recomienda a residencia el solicitar a irsa norte efectuar los permisos por liberar la zona 0+00 a lo que responde que la entidad debe de entregarlo con la entrega del terreno. se coordinará con el administrador del contrato

<b>Auditoria Fecha De Creación:</b> 12-08-2023	<b>Auditoria Fecha De Edición:</b> 15-08-2023
---	--

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

14-08-2023

### Actividades:

dia con lluvia paralización de labores de obra para la contratista, se verifica labores de gabinete en la residencia y la supervisión

### CDescripcion\_\_\_\_\_:

El día de hoy las lluvias intermitentes matinales ha dejado las superficies saturadas foto en a ciudad de soritor en afuera de la contrata, tramo 12+600 y laboratorio de suelos, con los resultados del control granulométrico de la chancadora.

### Foto1:




[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:

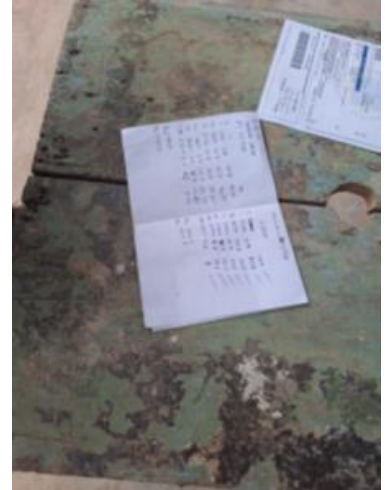

[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

14-08-2023

1



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Moderado

### Fecha De Fotografía:

14-08-2023

### Actividades:

19+570 a 19+400

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

colocacion de over pues poblacion efectuo recojo de tubo no autorizado por la noche

2

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

12-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

14-08-2023

**Actividades:**

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

19+560 sustraccion de tuberias

3

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

12-08-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

14-08-2023

**Actividades:**

levantamiento rivernio

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

4

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

12-08-2023



## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografía:**

14-08-2023

**Actividades:**

verificación de labores paralizadas por día de lluvia

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

verificación de labores paralizadas en la progresiva 19+360 : tendido de material hormigón con proceso de compactación aplicando rodillo pata de cabra, se observa las huellas saturadas.

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

14-08-2023

5



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

14-08-2023

### Actividades:

verificación de paralización de labores por clima con lluvias

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

en la progresiva 19+500 encontramos 01 bocat, 02 excavadoras, 02 rodillos estacionados

6

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

14-08-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

14-08-2023

**Actividades:**

visita a planta chancadora; chancadora en producción  
Equipo operando: 01cargador frontal, 01 excavadora

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

se encuentra en producción, abastecida por cargador y dosificándose el material de base  
dosificación empleada arena/piedra: 1/4  
cargador lo dosifica y excavadora lo mezcla: se encuentra en la zona una excavadora sin cucharon en proceso de reparación.

7

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

15-08-2023



**Fotos:**
