



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|---|---|--|
| Confirma Bitacora: Si | Nro Informe: 37 | Fecha Informe: 23 - 08 - 2023 | Nombre De La Obra: Culminacion de Obra del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Rodriguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada) | Personal Encargado: MOISES EDISON CALDERON BELTRAN |
|---------------------------------|---------------------------|---|---|--|

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|
| Foto Bitacora:  Ver imagen completa | Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa | Foto Bitacora 3:  Ver imagen completa | Foto Bitacora 4: Ver imagen completa | Foto Bitacora 5: Ver imagen completa | Foto Bitacora 6: Ver imagen completa |
|---|---|---|--|--|--|

Asunto:

el presente día se cierra con lluvia moderada de 17:15 a 18:00 en zona rural por lo que la plataforma descubierta resulta saturada se ha ejecutado corte eliminación del material excedente y conformación del DEM obras de drenaje y obras provisionales

Conclusiones:

la verificación de asistencia del personal de contrata va a ser restringida de igual modo al cuaderno de obra el descubrir plataformas sin la previsión de escurrirlas o drenarlas mediante canaletas origina retazos en los procesos de conformación estabilizada puesto que el terreno se activa y suelta su consistencia.

Recomendaciones:

la contratista reúne a su personal y toma medidas internas las cuales están orientadas prevenir estas situaciones climáticas con procedimientos no comentados al monitor.

| | |
|---|--|
| Auditoria Fecha De Creación: 23-08-2023 | Auditoria Fecha De Edición: 26-08-2023 |
|---|--|

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

23-08-2023

Actividades:

visita al DEM

CDescripcion _____ :

conformación de una superficie compactada con maquinaria
es nuestro caso encontramos un tractor d6t

1

Foto1:




[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

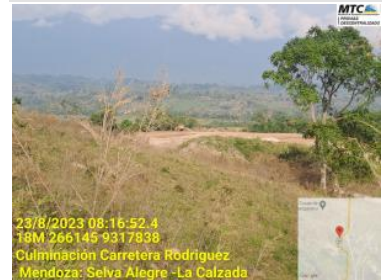

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

23-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

23-08-2023

Actividades:

movimiento de tierras corte de sub rasante lado izquierdo
sucede lluvia moderada por media hora a la salida del periodo de labor 17:00 horas

CDescripcion_____:

no se cuenta con motoniveladora este lunes y martes por renuncia del operador
se efectúa el corte de sub rasante de progresiva 19+000 a 19+240 lado izquierdo mediante excavadora
la eliminación se realiza mediante volquetes

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

23-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

23-08-2023

Actividades:

movimiento de tierras
obras provisionales

CDescripcion_____:

en la 13+750 a 13+380 se procede a escarificar y compactar la rasante
se instala barreas de desvío de tránsito, cuenta con vigía y señales de rutas alternativas de desvío

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

23-08-2023



Fotos:
